



# 国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

謹んで新年のお慶びを申し上げます。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年1月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者 国土交通省 中部地方整備局  
多治見砂防国道事務所  
土岐出張所 0572-54-3722

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にてご意見を承ります。



ご意見箱

<p><b>1</b> 業者名 小池土木(株) 現場代理人 土田 裕紀 現場事務所 0574-27-1161 進捗率 56.0%</p>	<p><b>2</b> 業者名 青協建設(株) 現場代理人 林 伸一 現場事務所 0574-42-8056 進捗率 6.0%</p>	<p><b>3</b> 業者名 三井住友建設(株) 現場代理人 西海 康弘 現場事務所 0574-23-0460 進捗率 25.5%</p>
<p><b>お知らせ</b> 2月は葦洞池の堤体工事を行います。また、中央公民館北側で、盛土および排水BOXの工事を行います。</p> <p><b>1月の作業予定</b> 葦洞池付近で擁壁工事・堤体工事を行います。公民館北側で地盤改良工事を行います。資材運搬のダンプトラックが多く通行しますので、ご協力をお願いします。</p>	<p><b>お知らせ</b> 2月も引き続き黒岩2号線が通行止めとなります。工事は地盤改良を行い、改良後調整池内の擁壁工事を行います。</p> <p><b>1月の作業予定</b> 調整池内及び周辺で地盤改良工事を行います。通行止めによりご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。</p>	<p><b>お知らせ</b> 2月は1号トンネルが貫通する予定です。2月中は1号トンネルの作業、2号トンネル入口部の作業を行います。</p> <p><b>1月の作業予定</b> 1号トンネルの掘削、土砂運搬工事、1号トンネルの出口側の工事、2号トンネル入口の工事を行います。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。</p>
<p><b>4</b> 業者名 北川工務(株) 現場代理人 所 和之 現場事務所 0574-49-7199 進捗率 11.0%</p>	<p><b>5</b> 業者名 北川工務(株) 現場代理人 飯田 正則 現場事務所 0574-49-7282 進捗率 62.5%</p>	<p><b>6</b> 業者名 ㈱市川工務店 現場代理人 山口 豪 現場事務所 0574-27-5380 進捗率 0.2%</p>
<p><b>お知らせ</b> 2月はボックスカルバートの鉄筋及び型枠の組立、コンクリート打設を行います。</p> <p><b>1月の作業予定</b> 1月は仮排水路の掘削、設置及びボックスカルバートの床掘、土砂運搬を行います。土砂運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。</p>	<p><b>お知らせ</b> 2月も本線の掘削・盛土作業を行います。</p> <p><b>1月の作業予定</b> 排水構造物工(水路工、集水樹工)、本線の掘削・盛土作業を行います。</p>	<p><b>お知らせ</b> 2月は町道を迂回路へ移動し、地下横断歩道の東側の工事を予定しています。迂回路には皆様へ看板でお知らせします。</p> <p><b>1月の作業予定</b> 今月は場内の整備・整地を行います。その後、仮設道路(迂回路)設置の準備と水道の切り回しを行います。ご迷惑をおかけします。よろしくお願い致します。</p>




お知らせ  
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>


多治見砂防国道事務所




## 各工事範囲と期間

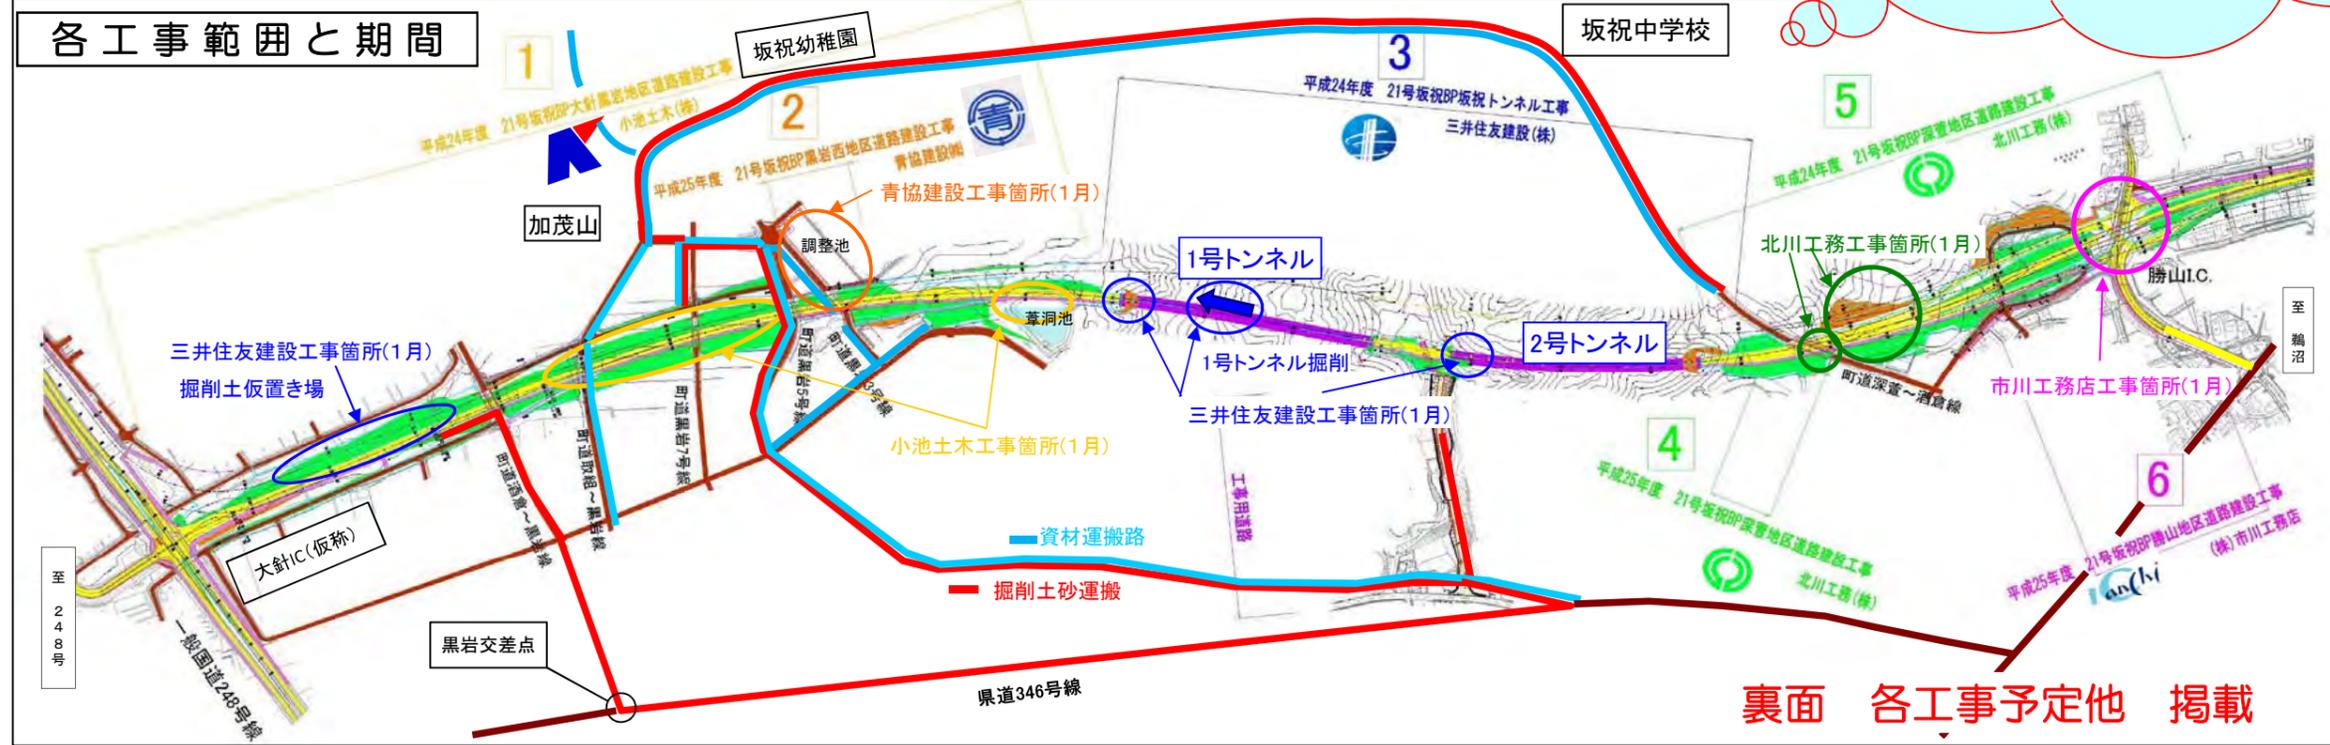

裏面 各工事予定他 掲載



**1** 平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事  
施工業者：小池土木(株)

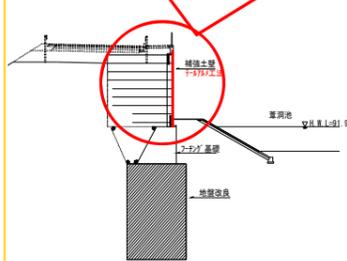

12月末現在の  
葦洞池周辺の  
施工状況です。

工事用車両の表示は黄色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩234-1  
(黒岩7号線沿い)にあります。  
お気づきの点がございましたら  
御連絡お願い申し上げます。



**2** 平成25年度 21号坂祝BP黒岩西地区道路建設工事  
施工業者：青協建設(株)



当社の工事では総合グラウンド北側にて、調整池内の  
擁壁工事をを行います。  
1月は擁壁施工箇所の地盤改良工事を  
工事用車両の表示はオレンジ色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加  
茂山団地駐車場内)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連  
絡お願い申し上げます。



**3** 平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事  
施工業者：三井住友建設(株)



1月は1号トンネルの  
この付近の掘削を行います

工事用車両の表示  
は青色です。

2号トンネル入口部分の擁壁  
をコンクリートで打ち上げます。

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



**4** 平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事  
施工業者：北川工務(株)



1月は排水路・ボックスカルバー工事用車両の表示は緑色です。  
トの床掘を行います。

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住  
宅跡地)に設置いたしました。  
お気づきの点がございましたら御連  
絡お願い申し上げます。



**5** 平成24年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事  
施工業者：北川工務(株)



工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住  
宅跡地)東側にあります。  
お気づきの点がございましたら御連  
絡お願い申し上げます。



**6** 平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事  
施工業者：㈱市川工務店

1月は場内の整備・整地を行います。



工事用車両の表示はピンク色です。

※いよいよ工事を着工しました。  
お気づきの点がございましたら  
御連絡お願い申し上げます。

