



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

早春となりましたが、まだまだ寒い日が続いております。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。
 ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。
 又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。
 尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。平成26年3月度工事予定をお知らせ致します。

<p>1 業者名 小池土木(株) 現場代理人 土田 裕紀 現場事務所 0574-27-1161 進捗率 72.1%</p>	<p>2 業者名 青協建設(株) 現場代理人 林 伸一 現場事務所 0574-42-8056 進捗率 65.0%</p>	<p>3 業者名 三井住友建設(株) 現場代理人 西海 康弘 現場事務所 0574-23-0460 進捗率 38.8%</p>
<p>4 業者名 北川工務(株) 現場代理人 所 和之 現場事務所 0574-49-7199 進捗率 23.0%</p>	<p>5 業者名 北川工務(株) 現場代理人 飯田 正則 現場事務所 0574-49-7282 進捗率 90.5%</p>	<p>6 業者名 ㈱市川工務店 現場代理人 山口 豪 現場事務所 0574-27-5380 進捗率 15.0%</p>
<p>お知らせ 3月末で工事完了を予定しています。</p> <p>3月の作業予定 葦洞池付近で堤体工事を行います。公民館北側で盛土工事を行います。資材運搬のダンプトラックが多く通行しますので、ご協力をお願いします。</p>	<p>お知らせ 3月末で工事完了を予定しています。</p> <p>3月の作業予定 調整池内及び周辺の擁壁工事・グラウンドの復旧工事を行います。通行止めによりご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。</p>	<p>お知らせ 3月から2号トンネルの掘削を昼間施工で開始し、4月の中旬より昼夜施工に入る予定です。また、4月より1号トンネルの覆工コンクリート作業を昼間施工で行います。</p> <p>3月の作業予定 1号トンネルのインバート、土砂運搬工事、1号トンネルの出口側の法面工事、2号トンネルの掘削を行います。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。</p>
<p>お知らせ 4月はボックスカルバートの鉄筋及び型枠の組立、コンクリート打設を行います。</p> <p>3月の作業予定 3月はボックスカルバートの鉄筋、型枠（コンクリートを流し込む木製の枠）、足場の組立、コンクリート打設を行います。資材運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。</p>	<p>お知らせ 3月末で工事完了を予定しています。</p> <p>3月の作業予定 本線の盛土整形・法面植生作業を行います。</p>	<p>お知らせ 4月は町道が迂回路へ移動しましたので、地下横断歩道の西側の工事を予定しています。いよいよ、地下道全体の工事が始まります。</p> <p>3月の作業予定 3月は町道を迂回路へ移動し、地下横断歩道の東側の工事を予定しています。仮橋橋をっての通行になります。迂回前には皆様に看板でお知らせします。</p>

発注者 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所

土岐出張所 0572-54-3722
坂祝町役場 産業建設課 0574-26-7111

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所もしくは坂祝町役場（産業建設課）にてご意見を賜ります。



ご意見箱




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>



多治見砂防国道事務所 検索

※坂祝町ホームページからもリンクできます。

各工事範囲と期間

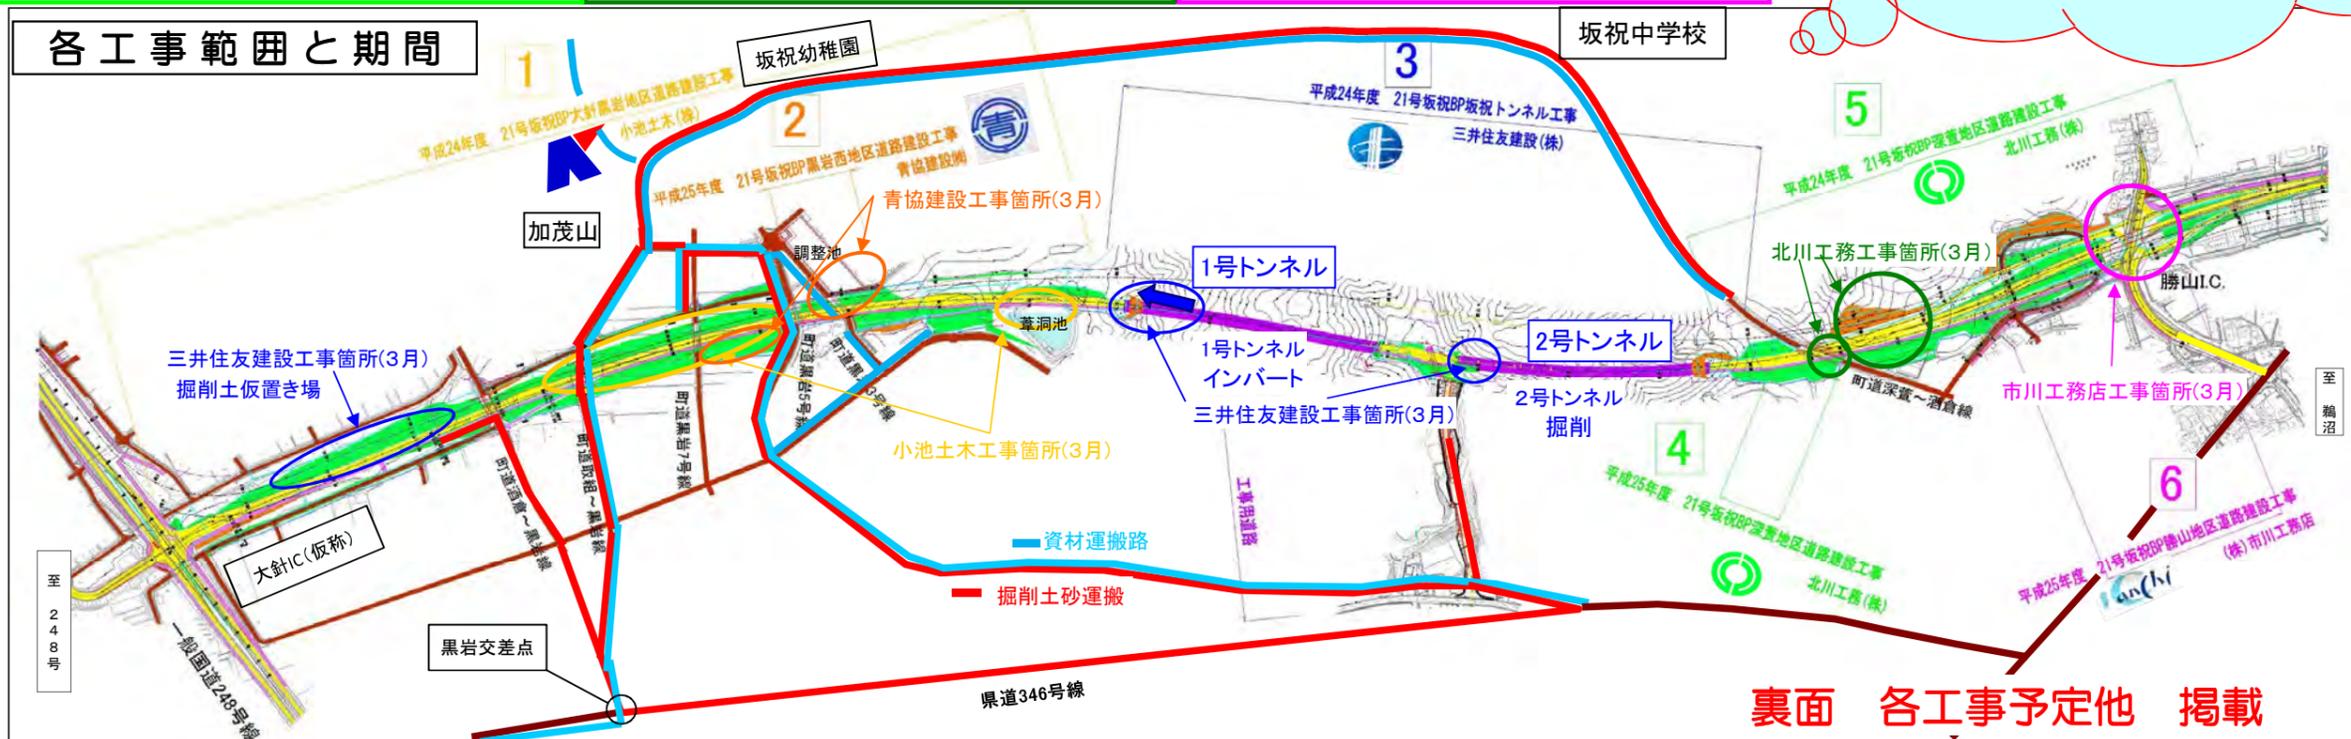


裏面 各工事予定他 掲載

裏面へ

裏面へ

1 平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事
施工業者:小池土木(株)

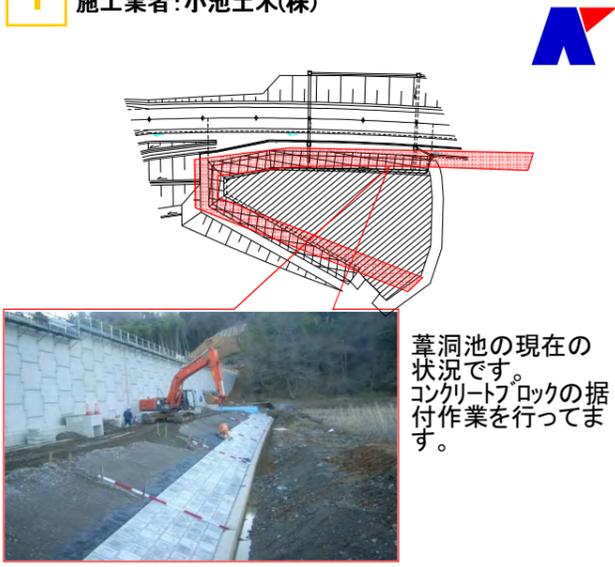

葦洞池の現在の状況です。コンクリートブロックの据付作業を行っています。

工事用車両の表示は黄色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩234-1 (黒岩7号線沿い) にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

坂祝BP ①
国土交通省
小池土木(株)

2 平成25年度 21号坂祝BP黒岩西地区道路建設工事
施工業者:青協建設(株)



当社の工事では総合グラウンド北側にて、調整池内の擁壁工事を行います。
3月は擁壁工事と復旧工事を行います

工事用車両の表示はオレンジ色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内) にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

坂祝BP ①
国土交通省
青協建設(株)

3 平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事
施工業者:三井住友建設(株)



3月は1号トンネルのこの付近のインバートを行います

2号トンネルの掘削を昼間施工で開始します
工事用車両の表示は青色です。

1号トンネル貫通しました。

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地) にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

坂祝BP ①
国土交通省
三井住友建設(株)

4 平成25年度 21号坂祝BP深葦地区道路建設工事
施工業者:北川工務(株)



3月はボックスカルバートを造っていきます。(鉄筋、型枠、足場の組立～コンクリート打設)

工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深葦(教員住宅跡地) にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

坂祝BP ①
国土交通省
北川工務(株)

5 平成24年度 21号坂祝BP深葦地区道路建設工事
施工業者:北川工務(株)



掘削・盛土施工箇
進入路

工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深葦(教員住宅跡地) 東側にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

坂祝BP ①
国土交通省
北川工務(株)

6 平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事
施工業者:櫛市川工務店



3月は町道を迂回させ、地下道東側の製作にとりかかります。

地下道
町道迂回路
仮橋

工事用車両の表示はピンク色です。

※現場事務所は現場の東側(坂祝町深葦79-6) にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

坂祝BP ①
国土交通省
櫛市川工務店

