



## 国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

新春のお喜びを申し上げます。皆様おすこやかに新春をお迎えのことと存じます。

皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成27年1月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。  
各工事についてお気づきの点がございましたら、  
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所  
にてご意見を承ります。




お知らせ  
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを  
是非ご覧ください。


<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



# 各工事範囲

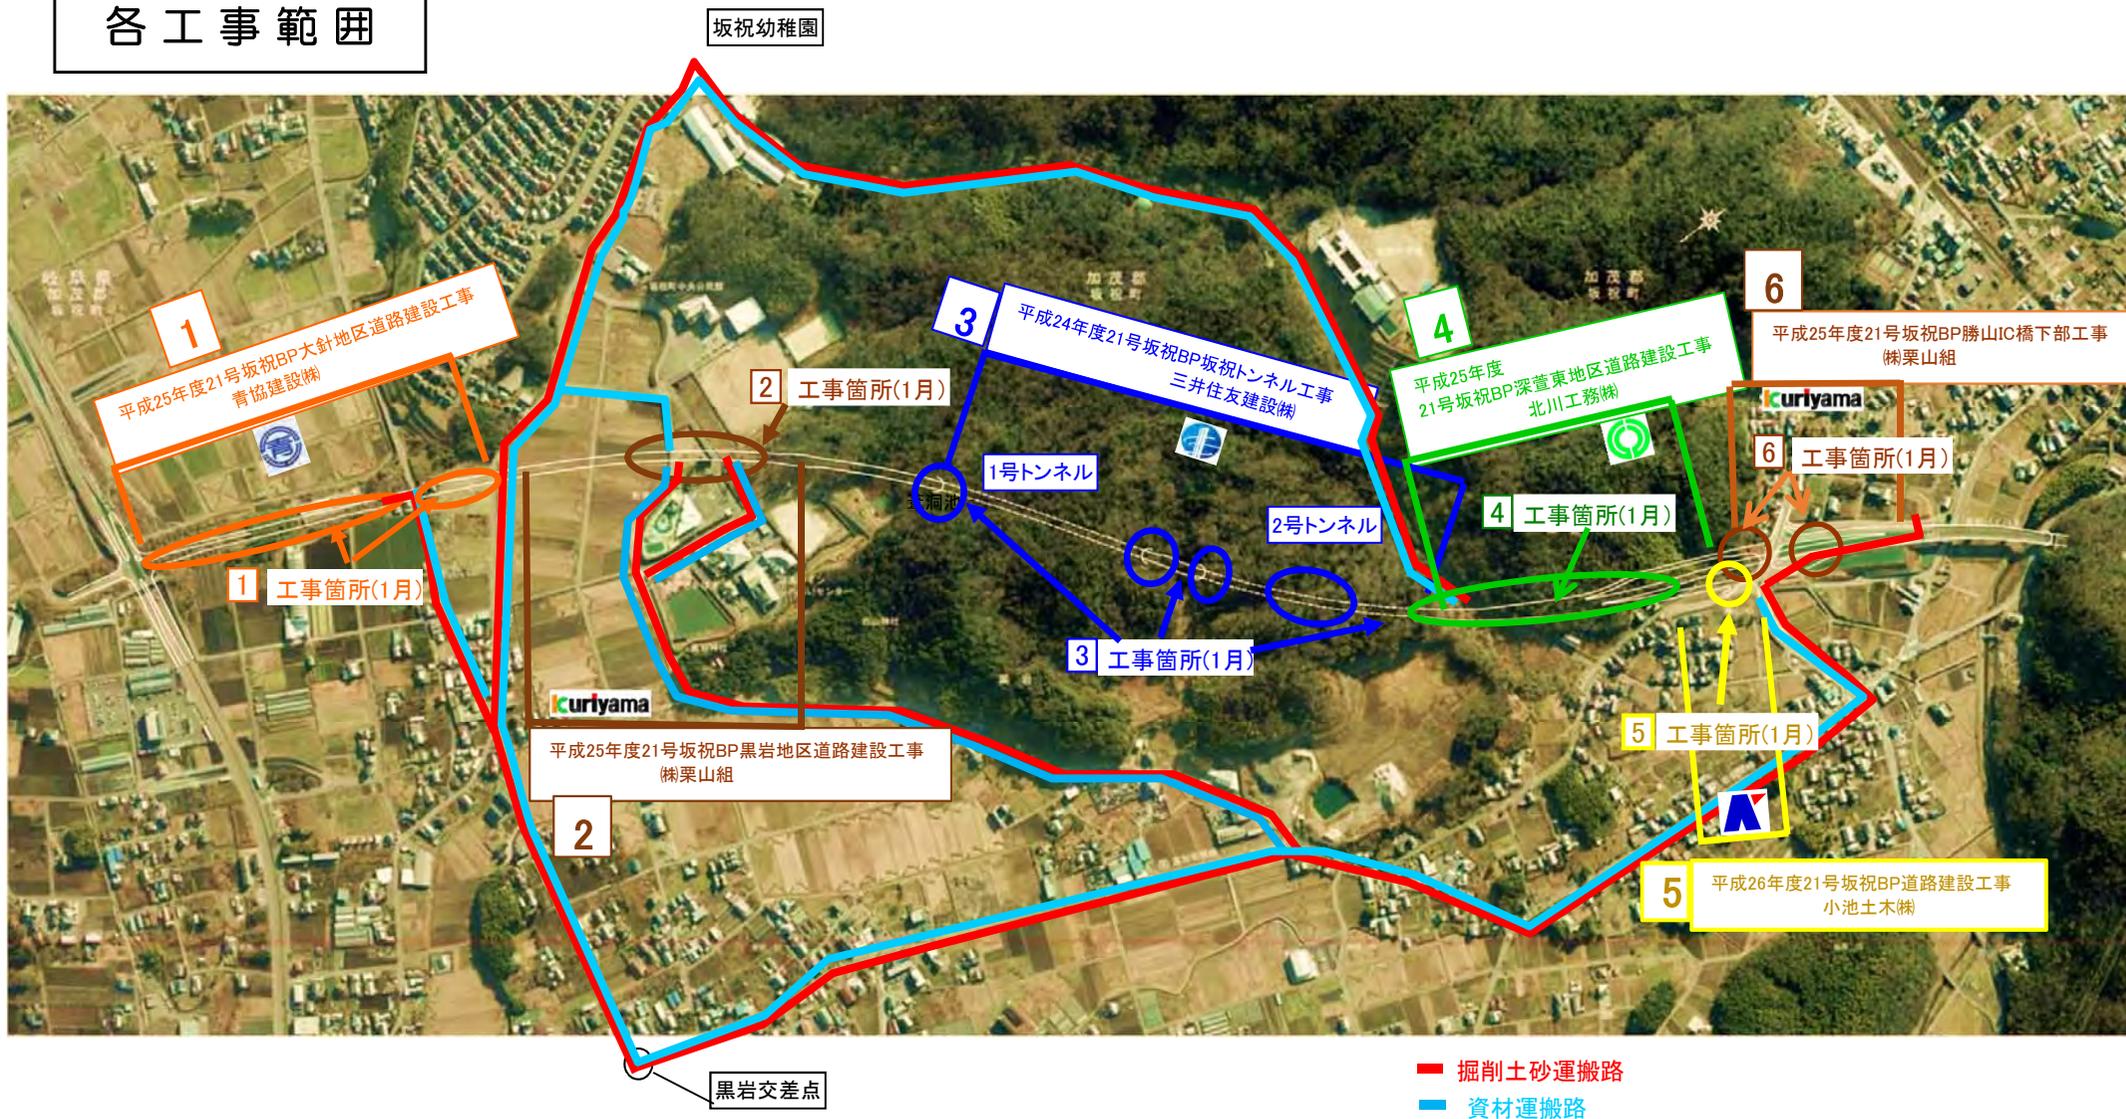

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、  
お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年1月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（12月末）	55.0%
2月からのお知らせ 橋台工（鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）仮設工（土留工）を行う予定です。	
1月の作業予定 橋台工（埋戻し・鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）、仮設工（土留工）、土工を施工します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。	

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（12月末）	87.0%
2月からのお知らせ 1月に続き、路体盛土工・排水構造物工・町道舗装工の施工を行う予定です。	
1月の作業予定 補強土壁工（1号）及び路体盛土、排水構造物工を行って行きます。	



現場写真  
橋台工 場所打杭



工事用車両の表示オレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



現場全景写真

12月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成27年 1月（予定）

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率（12月末）	94.7%
2月からのお知らせ 2月は2号トンネルの坑門工の作業と坑口まわりの法面工、排水工の作業を行います。	
1月の作業予定 1月は2号トンネルの覆工コンクリートの作業と坑口まわりの法面工、排水工の作業を行います。また、工事用道路の撤去作業を行っていきます。	



1号トンネル

1月はトンネルの坑口まわり法面工の作業を行います

2号トンネル

1月は2号トンネルの覆工コンクリートの作業を行います

工事用車両の表示は青色です。



至  
2  
4  
8  
号



1号トンネル  
坑内整備状況

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山（坂祝産業跡地）にあります。  
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉麿
現場事務所	0574-49-7199
進捗率（12月末）	59.2%
2月からのお知らせ 1月は、本線切土作業を行います。 又、町道深萱酒倉線（坂祝中学通学路）箇所の8号函渠の取付けの擁壁、本線盛土工事を行う予定です。	
1月の作業予定 7号函渠工の埋戻し工、8号函渠付近の補強土壁工、路体盛土工、排水構造物工を行います。	



町道深萱酒倉線



工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深萱（教員住宅跡地）にあります。  
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。



平成27年 1月（予定）

5

平成26年度 21号坂祝BP道路建設工事



業者名	小池土木(株)
現場代理人	土田 裕紀
現場事務所	0574-25-6775
進捗率（12月末）	2.7%

2月からのお知らせ

排水構造物工事、擁壁工事、地下道内の歩床工事を行う予定です。

1月の作業予定

地盤改良工事、擁壁工事、構造物取壊工事、排水構造物工事、地下道内の電気工事及び歩床工事を行います。



※現場事務所は坂祝町深菅にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



6

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率（12月末）	86.0%

2月からのお知らせ

引続き橋台工（A2）の、埋戻し・矢板引抜き整形と施工をいいます。  
又、橋台工（A1）も同様に、埋戻し・矢板引抜きと施工を進める予定です。

1月の作業予定

橋台工（A2）の、足場・壁鉄筋・壁型枠・コンクリート打設の施工を行います。  
又、橋台工（A1）も同様に、足場・壁鉄筋・壁型枠・コンクリート打設の施工を行います。  
大変ご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。



※現場事務所は、(坂祝町町営住宅跡地)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。

