



国道21号 坂祝バイパス工事のお知らせ

日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、いかがお過ごしですか。
地域の皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。
又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。
尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。[平成27年11月の工事予定](http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/)をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025


中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所に
てご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

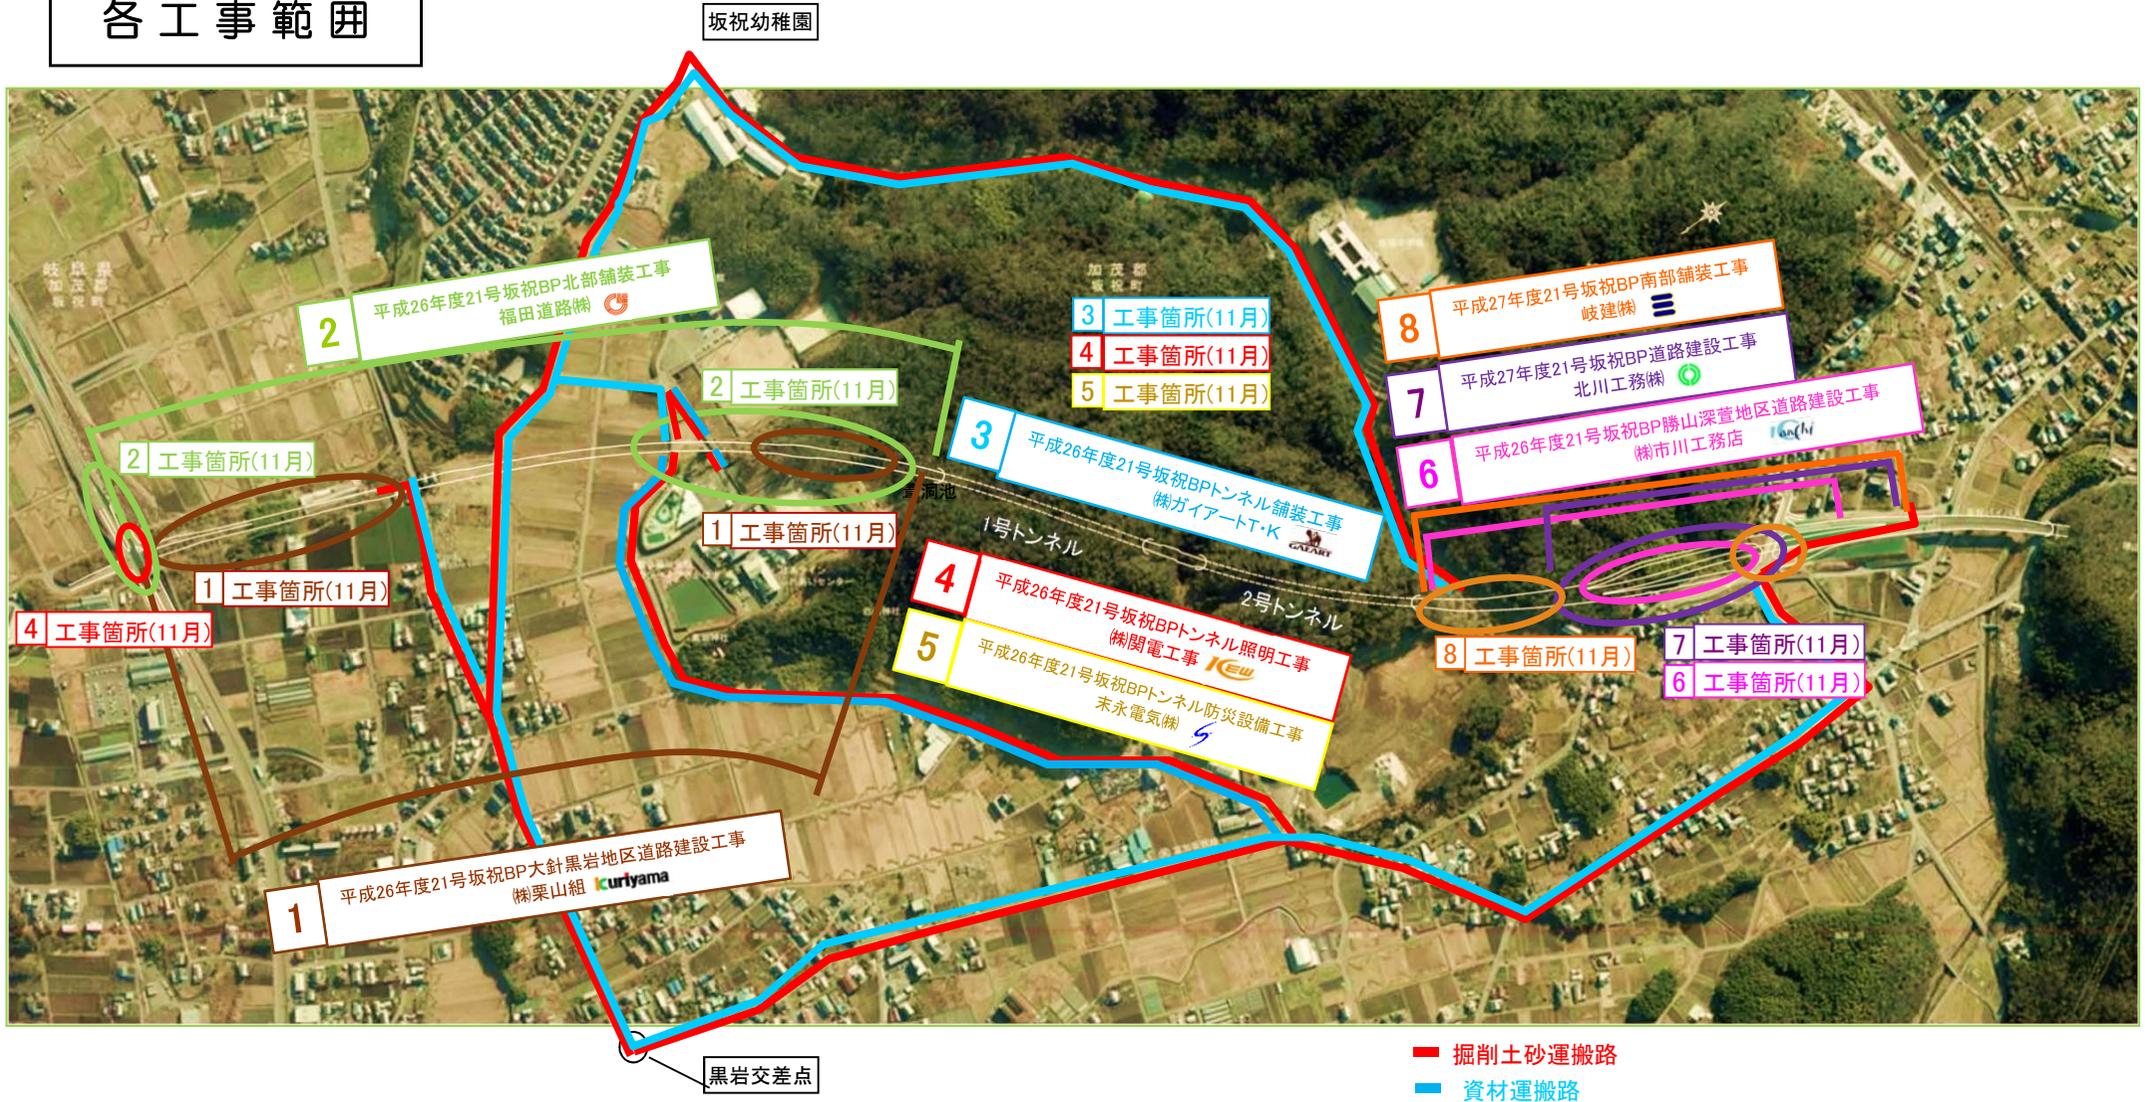

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年11月（予定）

1

平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事



| | |
|--|--------------|
| 業者名 | (株) 栗山組 |
| 現場代理人 | 林 浩 |
| 現場事務所 | 0574-42-8585 |
| 進捗率（10月末） | 80.0% |
| 12月からのお知らせ | |
| 側道部排水工・ブロック積工の工事を行う予定です。 ※酒倉〜黒岩線の排水工を片側交互通行にて、12月上旬より施工予定しています。 | |
| 11月の作業予定 | |
| 道路土工・排水工・ブロック積工の工事を行う予定です。 ※ 町道黒岩72号線の下図の区間での全面通行止めについて10月末にて終了し交通解放しました。規制期間中ご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。 | |



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡をお願い申し上げます。



2

平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事



| | |
|---|--------------|
| 業者名 | 福田道路(株) |
| 現場代理人 | 高木 大輔 |
| 現場事務所 | 0574-49-6351 |
| 進捗率（10月末） | 49.0% |
| 12月からのお知らせ | |
| 12月は引き続き、国道248号での交差点整備と21号坂祝バイパス本線の工事を予定しています。特に国道248号の作業に伴い交通の切り回しを行います。現地での案内看板に従い、注意して通行願います。 | |
| 11月の作業予定 | |
| 21号坂祝バイパスと国道248号が交わる交差点整備と21号坂祝バイパスの本線部分の工事を行います。本線は、いよいよ車道の舗装に着手します。国道248号では工事に伴う交通の切り回しを行います。現地での案内看板に従い、注意して通行願います。 ※11月からの国道248号交通切り回しについては別紙参照願います。 | |



- 【作業内容】
- ①21号坂祝バイパス本線において車道部の舗装と排水構造物の設置
 - ②国道248号交差点整備において排水構造物、信号や照明の配管

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)です。
お気づきの点かございましたら御連絡をお願い申し上げます。

工事用車両の表示は黄緑色です。



平成27年 11月 (予定)

3


平成26年度 21号坂祝BPトンネル舗装工事



| | |
|---|--------------|
| 業者名 | ㈱ガイアートT・K |
| 現場代理人 | 田中 直巳 |
| 現場事務所 | 0574-49-6031 |
| 進捗率(10月末) | 55.0% |
| 12月からのお知らせ | |
| 12月は歩道部・監査通路部のコンクリート舗装を行います。 1号トンネル・2号トンネル坑口付近で土砂流出対策工を行う予定です。 | |
| 11月の作業予定 | |
| 11月上旬に車道部のコンクリート舗装は完了します。 11月中旬から監査通路側の縁石工・歩道側のコンクリート舗装の準備を行います。 | |

至大針

11月上旬まで、中央公民館付近において、材料搬入車両の出入りが多くなります。一般車両最優先にて交通管理を行います。工事車両の通行にご注意いただきますようお願いいたします。

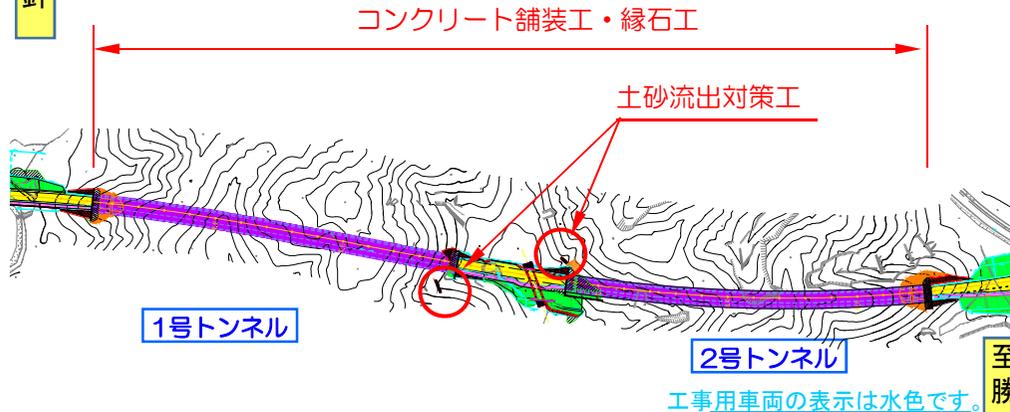

至勝山

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。




4

平成26年度 21号坂祝BPトンネル照明工事



| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 業者名 | ㈱関電工事 |
| 現場代理人 | 永島 祐樹 |
| 現場事務所 | 0574-42-9481 |
| 進捗率(10月末) | 10.6% |
| 12月からのお知らせ | |
| 12月はトンネル内照明取付工事及び道路照明設置工事を行う予定です。 | |
| 11月の作業予定 | |
| 11月はトンネル内照明取付工事を行う予定です。 | |

本工事は道路照明及びトンネル照明を設置する工事です。安全には十分配慮し工事を行います。ご理解ご協力よろしく申し上げます。

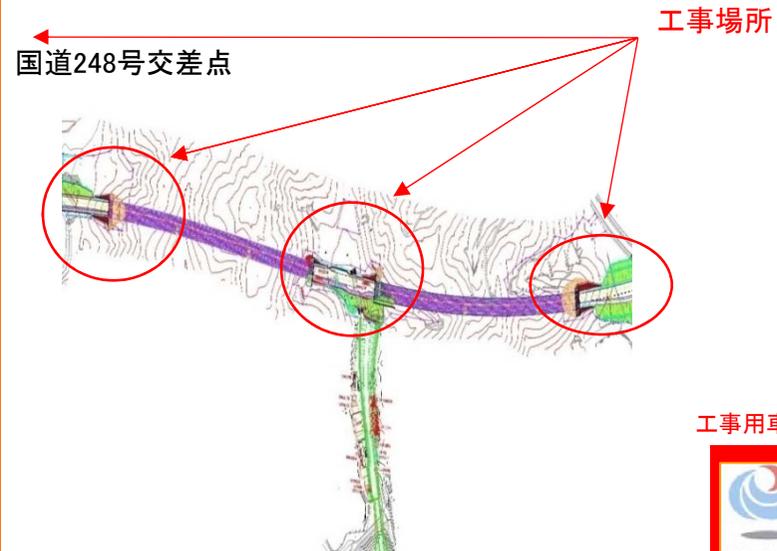

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)です。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。



平成27年 11月 (予定)


5

平成26年度 21号坂祝BPトンネル防災設備工事



| | |
|--|-------------------|
| 業者名 | 末永電気(株) |
| 現場代理人 | 高木 優 |
| 現場事務所 | 0585-22-2148 (会社) |
| 進捗率(10月末) | 65.5% |
| 12月からのお知らせ | |
| 12月も引き続きトンネル内にて順次機器を設置する予定です。 | |
| 11月の作業予定 | |
| 工場にて機器製作の確認・動作試験を行う予定です。 トンネル内にて機器を固定するアンカーボルトを打設し、順次機器を設置する予定です。 トンネル坑口にて支柱を建て警報表示させる機器を設置する予定です。 | |

本工事は道路トンネル内における災害発生時に通報及び警報表示させる設備を工事します。
安全には十分配慮し工事を行います。
ご理解ご協力よろしくお願いします。

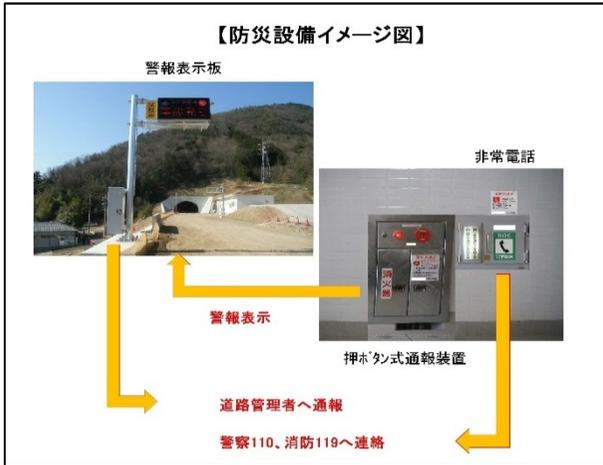

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)です。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は黄色です。



6

平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工事



| | |
|--|--------------|
| 業者名 | 榊市川工務店 |
| 現場代理人 | 高木 広志 |
| 現場事務所 | 0574-28-3209 |
| 進捗率(10月末) | 77.5% |
| 12月からのお知らせ | |
| 切土、法面工、排水構造物工を行う予定です。 | |
| 11月の作業予定 | |
| 路体盛土、切土、法面工、擁壁工、排水構造物工を行います。 工事に伴い、町道(深萱取組線)を片側交互通行にて切廻しています。 ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 | |



工事用車両の表示はピンク色です。



※現場事務所は現場の西側(坂祝町深萱79-6)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成27年 11月 (予定)

7

平成27年度 21号坂祝BP道路建設工事



| | |
|----------------------------------|--------------|
| 業者名 | 北川工務(株) |
| 現場代理人 | 北川 豊将 |
| 現場事務所 | 0574-49-6223 |
| 進捗率(10月末) | 76.4% |
| 12月からのお知らせ 法面工を行う予定です。 | |
| 11月の作業予定 擁壁工、盛土工、排水構造物工を行います。 | |



工事用車両の表示は紫色です。



※現場事務所は町営住宅の南側(坂祝町勝山306-3)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

8

平成27年度 21号坂祝BP南部舗装工



| | |
|--|--------------|
| 業者名 | 岐建(株) |
| 現場代理人 | 星野 智早 |
| 現場事務所 | 0574-49-7025 |
| 進捗率(10月末) | 14.5% |
| 12月からのお知らせ 第2トンネル～勝山IC間の工区を施工予定です。排水工～路盤工～舗装工 | |
| 11月の作業予定 第2トンネル～鶴沼方面へ200m程度の工区及び勝山IC付近を施工予定です。排水工～路盤工～舗装工 | |



工事用車両の表示はオレンジ色です。



10/19 撮影

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。
