



# 国道21号 坂祝バイパス工事のお知らせ

まだまだ寒さが厳しいですが、このところ日が長くなったように思えます。  
地域の皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成28年2月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025


中央公民館にご意見箱を設置しています。  
各工事についてお気づきの点がございましたら、  
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にて  
ご意見を承ります。



お知らせ  
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを  
是非ご覧ください。  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所


検索



# 工事用車両運搬経路図

坂祝幼稚園

掘削土砂運搬路  
資材運搬路

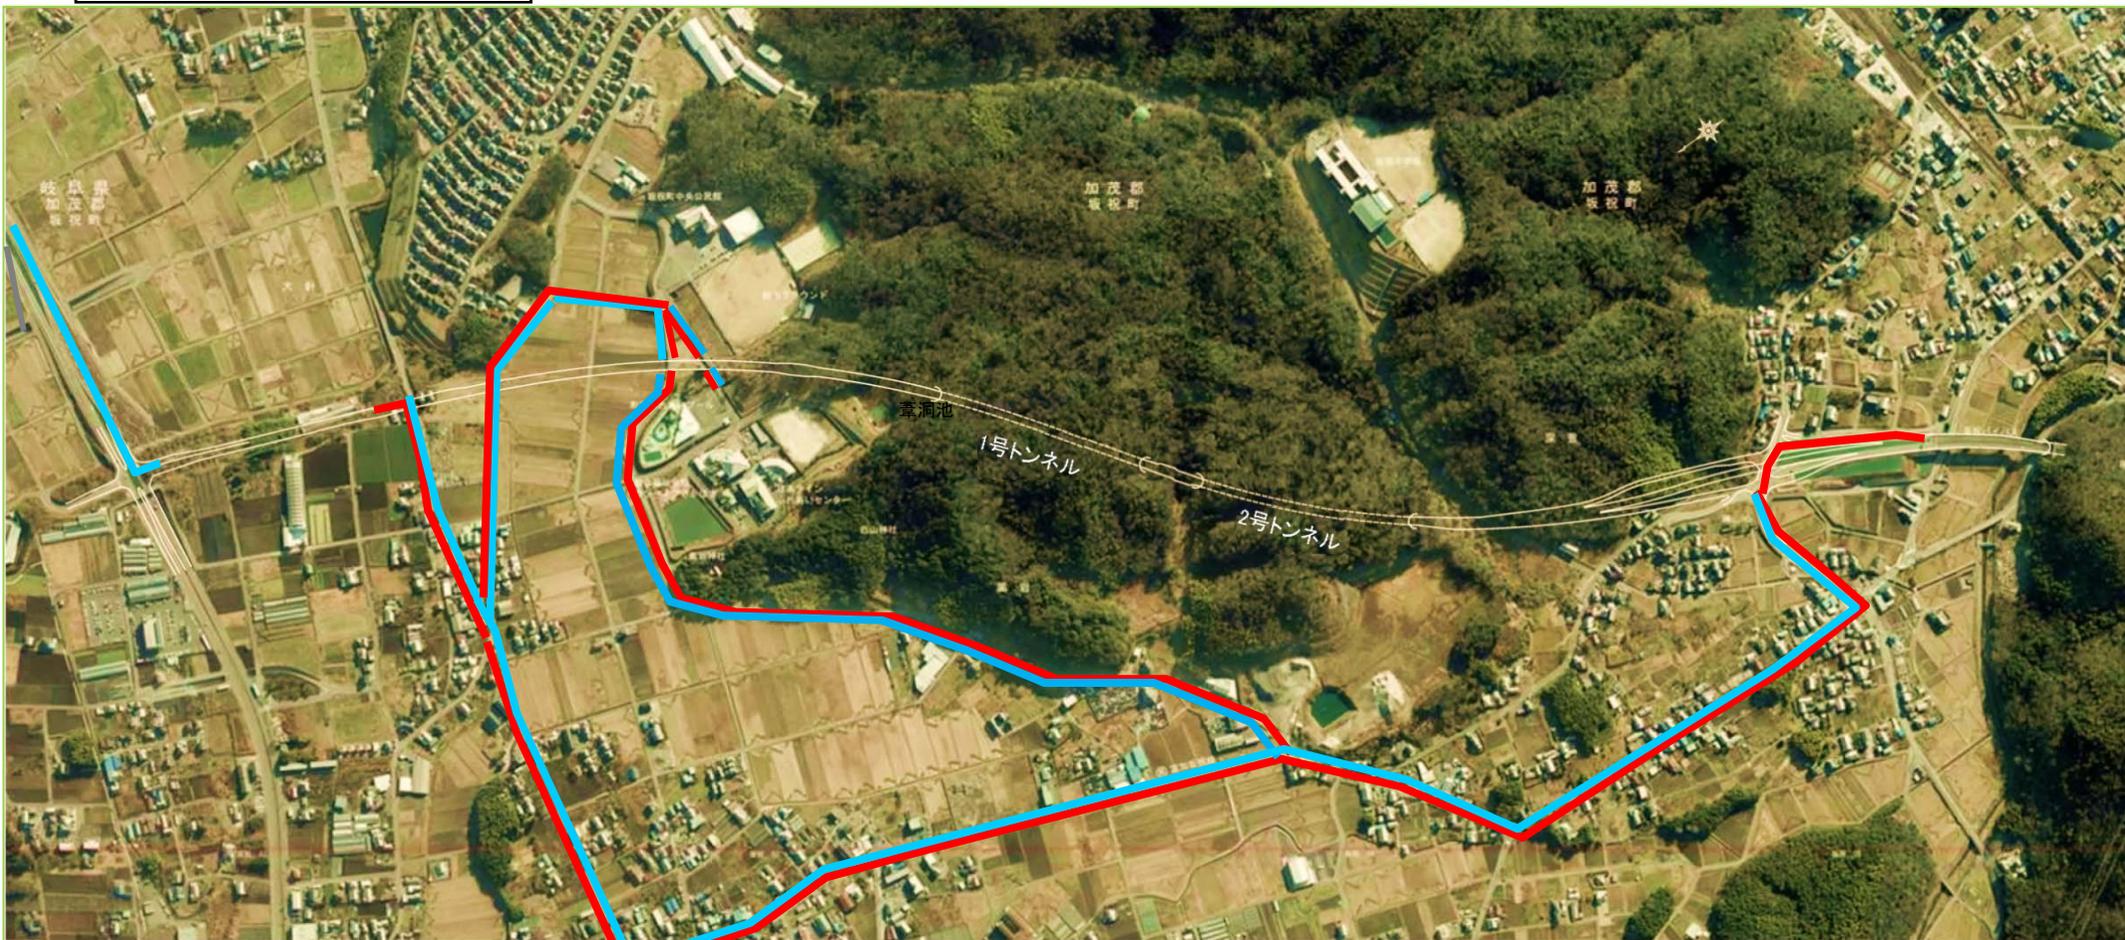

黒岩交差点

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

工事名	業者名	工事番号・車両表示色
平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事	榊栗山組	1
平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事	福田道路㈱	2
平成26年度 21号坂祝BPTンネル舗装工事	㈱ガイアート・K	3
平成26年度 21号坂祝BPTンネル照明工事	㈱関電工事	4
平成26年度 21号坂祝BPTンネル防災設備工事	末永電気㈱	5
平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工事	㈱市川工務店	6
平成27年度 21号坂祝BP道路建設工事	北川工務㈱	7
平成27年度 21号坂祝BP南部舗装工事	岐建㈱	8
平成27年度 21号坂祝BP整備工事	㈱友進道路	9

平成28年 2月（予定）

1

平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	林 浩
現場事務所	0574-42-8585
進捗率（1月末）	95.0%

3月からのお知らせ

工事完了予定

2月の作業予定

排水工（町道黒岩72号線）及び排水工を行う予定です。  
 ※片側通行時にはご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。



工事用車両の表示は白色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山（坂祝産業跡地）にあります。  
 お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。



2

平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事



業者名	福田道路(株)
現場代理人	高木 大輔
現場事務所	0574-49-6351
進捗率（1月末）	80.5%

3月からのお知らせ

3月は国道248号で最終の区画線を設置して、不要な保安設備等を順次撤去していき、供用開始に備えていく予定です。

2月の作業予定

21号坂祝バイパスと国道248号が交わる交差点整備と21号坂祝バイパスの本線部分の工事を行います。本線は車道舗装と区画線やガードレールが中心となります。国道248号では1月同様に車道にブロックを設置します。現地の案内看板に従い、注意して通行願います。※2月の国道248号通行形態は別紙参照願います。



【作業内容】

- ①21号坂祝バイパス本線において車道の舗装と区画線・ガードレール
- ②国道248号交差点整備においてブロックの設置

工事用車両の表示は黄緑色です。

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山（坂祝産業跡地）です。  
 お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。



平成28年 2月（予定）


3

平成26年度 21号坂祝BPトンネル舗装工事



業者名	㈱ガイアートT・K
現場代理人	田中 直巳
現場事務所	0574-49-6031
進捗率（1月末）	99.8%
3月からのお知らせ	
3月は、光ケーブルの試験調整を行う予定です。	
2月の作業予定	
2月は、落石防護柵・トンネル内の区画線（ライン）・1号トンネルから勝山ICまでの、光ケーブルを入線します。	

至大針

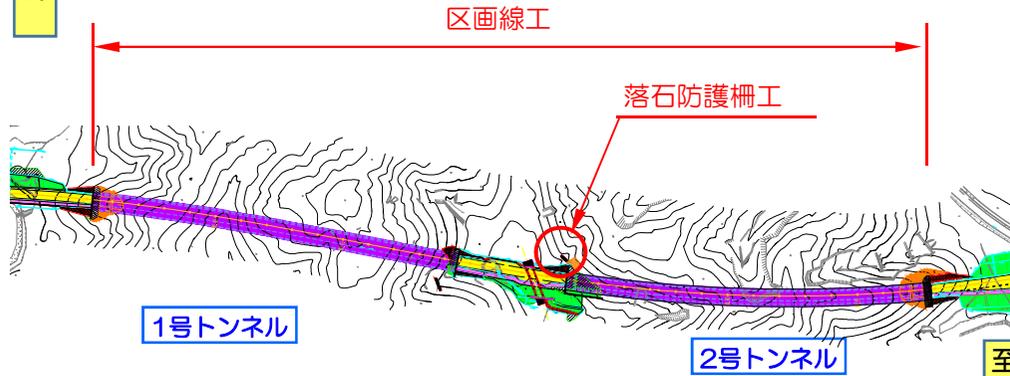

至勝山

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。




4

平成26年度 21号坂祝BPトンネル照明工事



業者名	㈱関電工事
現場代理人	永島 祐樹
現場事務所	0574-42-9481
進捗率（1月末）	89.8%
3月からのお知らせ	
2月末をもちまして工事を完了いたします。	
2月の作業予定	
2月は勝山交差点にて道路照明工事を行う予定です。	

本工事は道路照明及びトンネル照明を設置する工事です。安全には十分配慮し工事を行います。ご理解ご協力よろしく申し上げます。

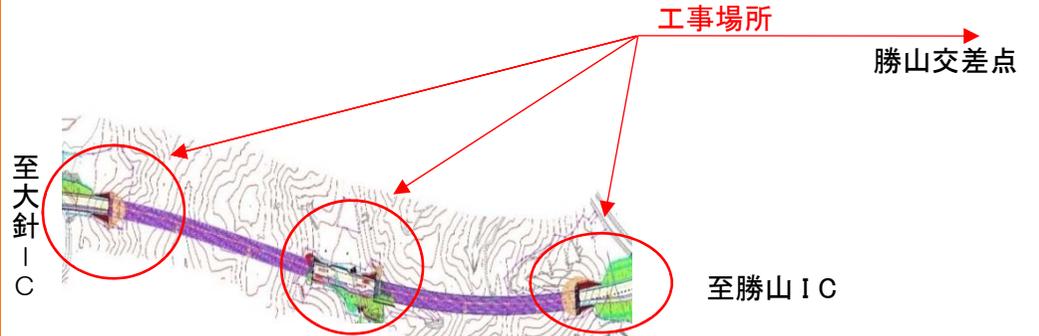

工事用車両の表示は赤色です。



平成28年 2月（予定）

5

平成26年度 21号坂祝BPトンネル防災設備工事



業者名	末永電気(株)
現場代理人	高木 優
現場事務所	0585-22-2148（会社）
進捗率（1月末）	98.4%
3月からのお知らせ	
通報及び警報装置を遠方で監視及び制御する為の確認を行う予定です。	
2月の作業予定	
1月に現地に設置した機器の動作試験を行いました。 2月は通報及び警報装置を遠方で監視及び制御する為の光ケーブルを接続する予定です。	

本工事は道路トンネル内における災害発生時に通報及び警報表示させる設備を工事します。  
安全には十分配慮し工事を行います。  
ご理解ご協力よろしくお願いします。

【警報表示板動作試験状況】



工事用車両の表示は黄色です。



6

平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工事



業者名	㈱市川工務店
現場代理人	高木 広志
現場事務所	0574-28-3209
進捗率（1月末）	94.8%
3月からのお知らせ	
施工の予定はありません。	
2月の作業予定	
法面工、排水構造物工、防護柵工を行います。 工事に伴い、町道(深萱取組線)を片側交互通行にて切廻しています。 ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。	



工事用車両の表示はピンク色です。



平成28年 2月（予定）

7

平成27年度 21号坂祝BP道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	北川 豊将
現場事務所	0574-49-6223
進捗率（1月末）	99.0%

3月からのお知らせ

2月末をもちまして工事を完了いたします。

2月の作業予定

施工の予定はありません。



工事用車両の表示は紫色です。



※現場事務所は町営住宅の南側(坂祝町勝山306-3)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

8

平成27年度 21号坂祝BP南部舗装工事



業者名	岐建(株)
現場代理人	星野 智早
現場事務所	0574-49-7025
進捗率（1月末）	65.2%

3月からのお知らせ

勝山1C周辺の舗装工・防護柵工・区画線工を施工します。供用に備え不要な施設を撤去します。

2月の作業予定

勝山1C周辺の舗装工・排水工・防護柵工を施工します。施工に伴い勝山1Cの規制切替を行いますので、現地の案内看板に従ってご通行願います。

※2月の国道21号通行形態は別紙参照願います。



工事用車両の表示はオレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

9

平成27年度 21号坂祝BP整備工事



業者名	(株)友進道路
現場代理人	大野 裕丈
現場事務所	0574-42-8017
進捗率（1月末）	11.3%

3月からのお知らせ

2月に引き続き、21号BP内で道路付属施設工、調整池にて護岸工を行う予定です。

2月の作業予定

坂祝BP及び周辺道路において道路案内標識の設置、21号BP内で植生工、道路付属施設工、調整池の護岸工を行う予定です。

※標識工事は、2月中旬より片側交互通行にて作業を行ない、当月中に完了する予定です。



工事用車両の表示は灰色です。

赤枠が標識工箇所



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。
