



国道21号 坂祝バイパス工事のお知らせ

ここのところ、寒さもずいぶんと落ち着いてきたように感じます。

地域の皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。皆様のご協力により3月26日(土)に坂祝バイパスを開通することとなりました。開通に向けてひきつづき、周辺環境・安全には十分配慮し、工事を行ないますので、ご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。

尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成28年3月の工事予定**をお知らせ致します。

最後に、今月をもちまして「国道21号 坂祝バイパス工事のお知らせ」は終了となります。

発注者



工務第二課 0572-25-9025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にて
ご意見を承ります。




お知らせ

国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。

<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所


検索



工事用車両運搬経路図

坂祝幼稚園

掘削土砂運搬路
資材運搬路

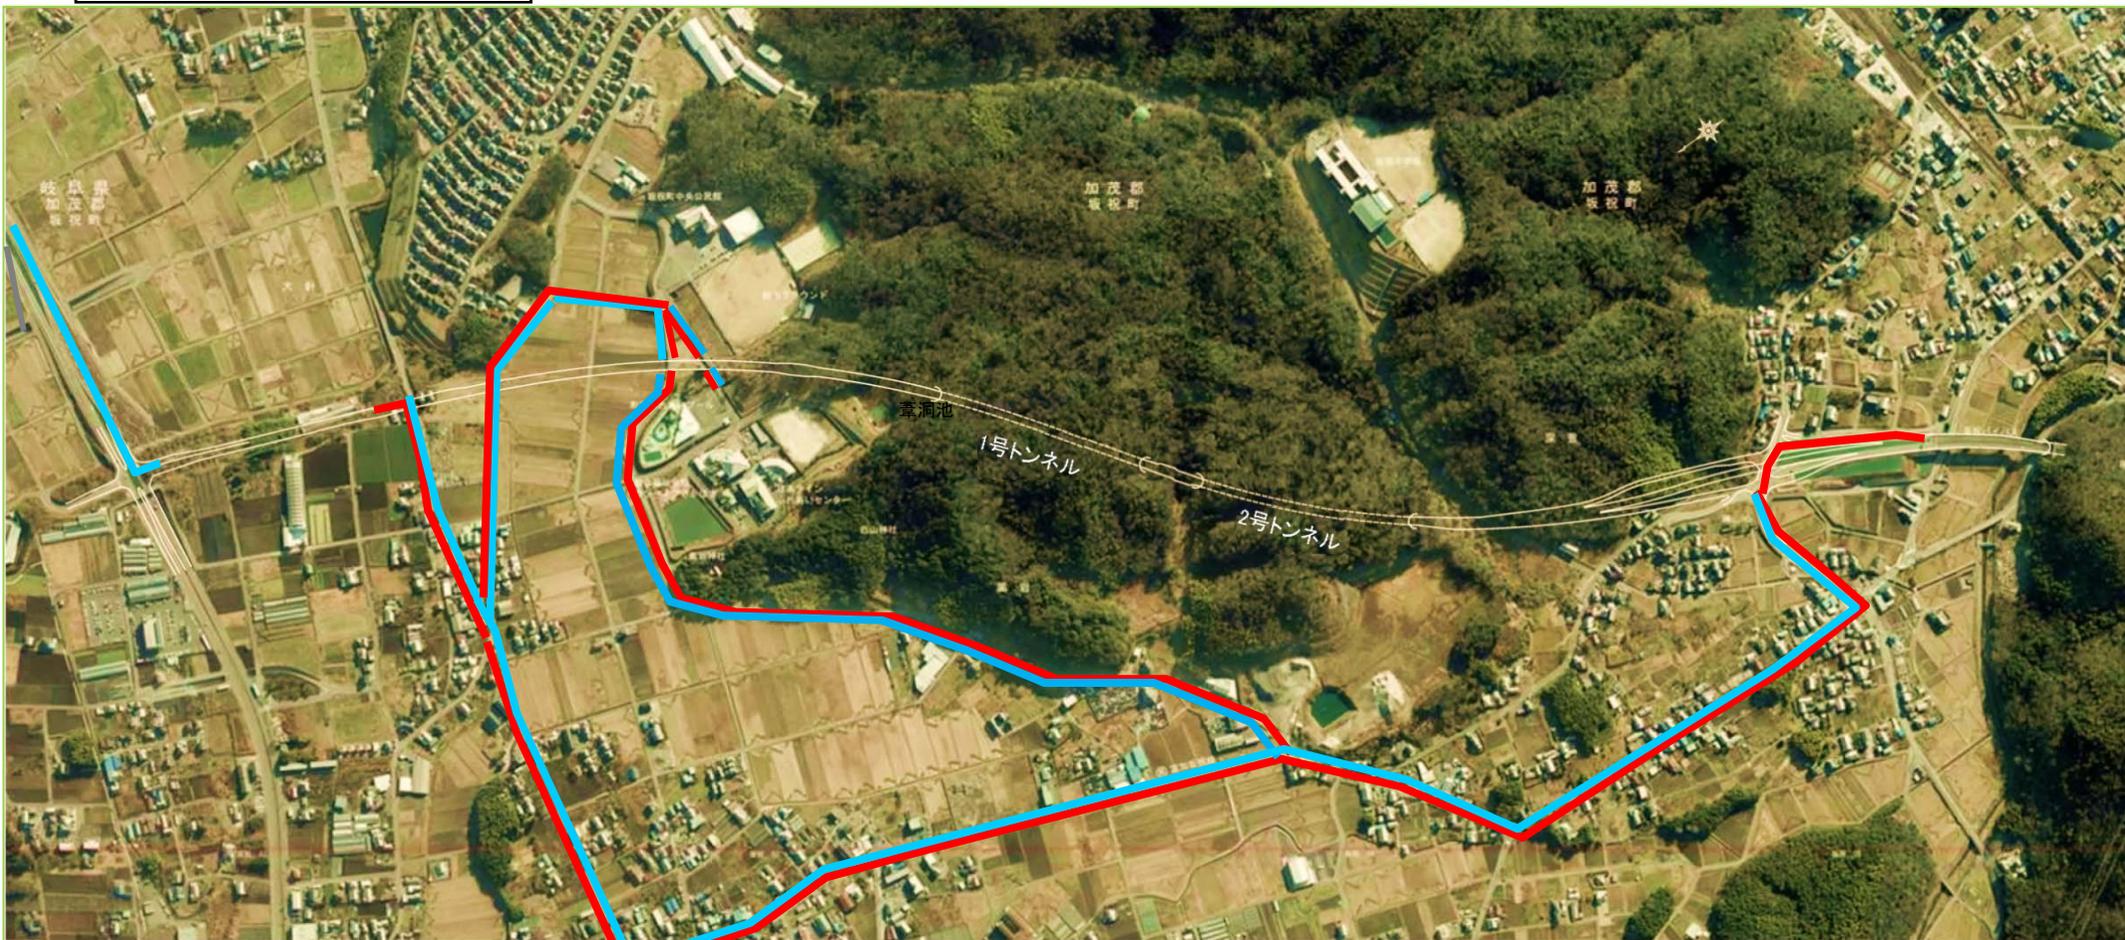

黒岩交差点

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

工事名	業者名	工事番号・車両表示色
平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事	榊栗山組	1
平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事	福田道路㈱	2
平成26年度 21号坂祝BPTンネル舗装工事	㈱ガイアート・K	3
平成26年度 21号坂祝BPTンネル照明工事	㈱関電工事	4
平成26年度 21号坂祝BPTンネル防災設備工事	末永電気㈱	5
平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工事	㈱市川工務店	6
平成27年度 21号坂祝BP道路建設工事	北川工務㈱	7
平成27年度 21号坂祝BP南部舗装工事	岐建㈱	8
平成27年度 21号坂祝BP整備工事	㈱友進道路	9

平成28年 3月（予定）

1

平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	林 浩
現場事務所	0574-42-8585
進捗率（2月末）	99.5%

3月の作業予定

3月14日にて工事を完了いたします。3月の作業予定はありません。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



工事用車両の表示は白色です。

2

平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事



業者名	福田道路(株)
現場代理人	高木 大輔
現場事務所	0574-49-6351
進捗率（2月末）	99.5%

3月の作業予定

3月は国道248号で最終の区画線を設置して、不要な保安設備等を順次撤去していき、供用開始に備えていく予定です。尚、3月の国道248号の通行形態は別紙を参照願います。
又、21号坂祝バイパス本線は2月中で工事完了となります。
(清掃等の軽作業はあります)
国道248号、21号坂祝バイパス共に3月で全ての作業が完了するため、4月の作業はありません。



① 本線舗装
工事延長 L=1201m

② 交差点整備

【作業内容】
①国道248号交差点整備において
区画線の設置と不要な保安資材の撤去

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)です。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は黄緑色です。



平成28年 3月（予定）

3

平成26年度 21号坂祝BPトンネル舗装工事




業者名	㈱ガイアートT・K
現場代理人	田中 直巳
現場事務所	0574-49-6031
進捗率（2月末）	99.9%

3月の作業予定

光ケーブルの試験調整を行い、3月中旬をもちまして、舗装工事が完了となります。皆様には、大変ご迷惑をお掛けしましたがご協力ありがとうございました。

至大針

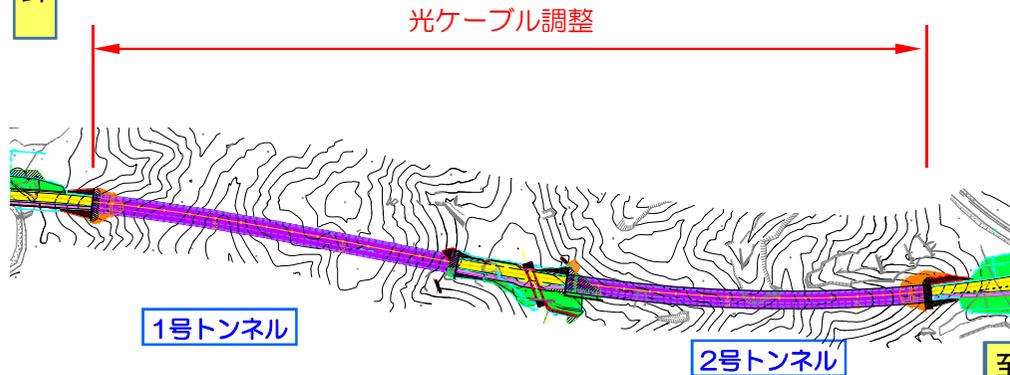

工事用車両の表示は水色です

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



4

平成26年度 21号坂祝BPトンネル照明工事



業者名	㈱関電工事
現場代理人	永島 祐樹
現場事務所	0574-42-9481
進捗率（2月末）	100%

3月からのお知らせ

2月末をもちまして工事を完了いたします。工期中のご支援に厚く感謝申し上げます。



平成28年 3月（予定）

5

平成26年度 21号坂祝BPTンネル防災設備工事



業者名	末永電気(株)
現場代理人	高木 優
現場事務所	0585-22-2148（会社）
進捗率（2月末）	99.8%

3月の作業予定
 通報及び警報装置を遠方で監視及び制御する為の確認を行い、3月中旬に工事完了予定です。

本工事は道路トンネル内における災害発生時に通報及び警報表示させる設備を工事します。
 安全には十分配慮し工事を行います。
 ご理解ご協力よろしくお願いします。

【警報表示板動作試験状況】



表示パターン



工事用車両の表示は黄色です。



6

平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工事



業者名	㈱市川工務店
現場代理人	高木 広志
現場事務所	0574-28-3209
進捗率（2月末）	99.5%

3月の作業予定
 排水構造物工を行います。
 工事に伴い、町道(深萱取組線)を片側交互通行にて切廻しています。
 ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしく申し上げます。
 なお、3月中旬にて工事完了となります。



↓ 鶴沼方面

工事用車両の表示はピンク色です。



平成28年 3月（予定）

7

平成27年度 21号坂祝BP道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	北川 豊将
現場事務所	0574-49-6223
進捗率（2月末）	100.0%

3月からのお知らせ

2月をもちまして工事を完了いたしました。皆様のご理解・ご協力ありがとうございました。

工事完了全景写真



8

平成27年度 21号坂祝BP南部舗装工事



業者名	岐建(株)
現場代理人	星野 智早
現場事務所	0574-49-7025
進捗率（2月末）	80.3%

4月からのお知らせ

勝山IC仮設ランプの撤去作業を行います。

3月の作業予定

勝山IC周辺の舗装工・防護柵工・区画線工を施工します。町道深菅～取組線の舗装工事に伴い、**町道通行止規制**を3月7日（月）～3月11日（金）まで行います。（施工日は2日間）工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成28年 3月（予定）

9

平成27年度 21号坂祝BP整備工事



業者名	㈱友進道路
現場代理人	大野 裕丈
現場事務所	0574-42-8017
進捗率（2月末）	48.8%

4月からのお知らせ

- ・3月に引き続き、調整池にて排水構造物工、法面保護工を行う予定です。

3月の作業予定

- ・21号BP内で植生工、道路附属施設工、階段工を行いません。
- ・総合グラウンドとなりの調整池で、排水構造物工、法面保護工を行う予定です。




工事用車両の表示は灰色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

一般国道248号 坂祝町大針地区 通行形態のお知らせ

21号坂祝バイパス新設に伴い、現道国道248号の交差点改良工事を行っています。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、通行の際にはご注意くださいよう、よろしくお願い致します。
3月も先月に引き続き、下記の通行形態となります。現在の通行形態は21号坂祝BPの供用開始まで続きます。
(供用開始直前に順次不要な保安資材は撤去予定)

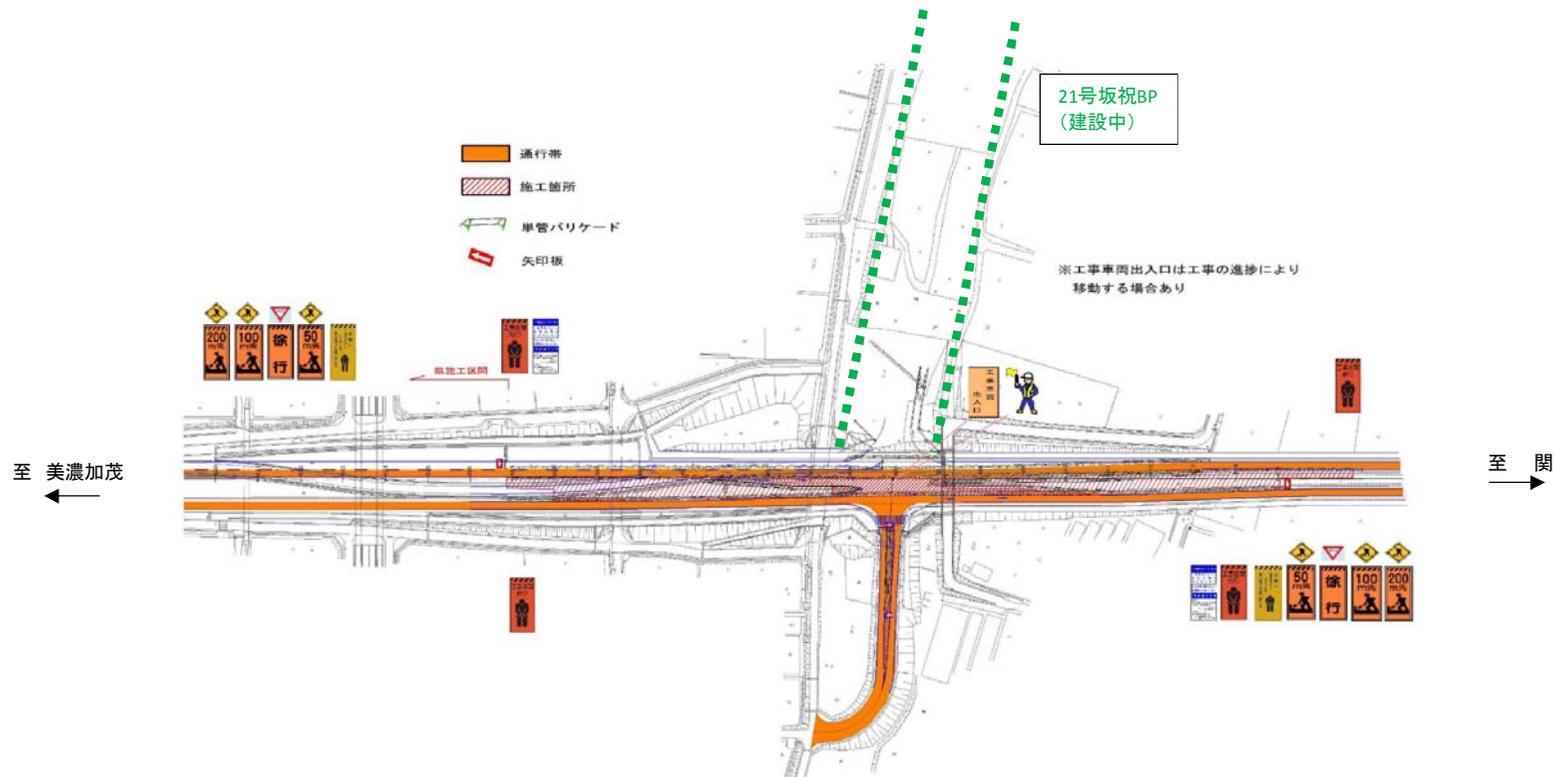

※この通行形態は21号坂祝BP供用開始まで続きます。

坂祝バイパス工事進捗状況(平成28年2月)

坂祝バイパス全体平面図



①地点—起点より終点を望む



②地点—黒岩橋より終点を望む



③地点—坂祝1号トンネル起点側より起点を望む



④地点—坂祝2号トンネルよりトンネル間明かり部を望む



⑤地点—勝山IC付近より起点を望む



⑥地点—勝山IC付近より終点を望む

