

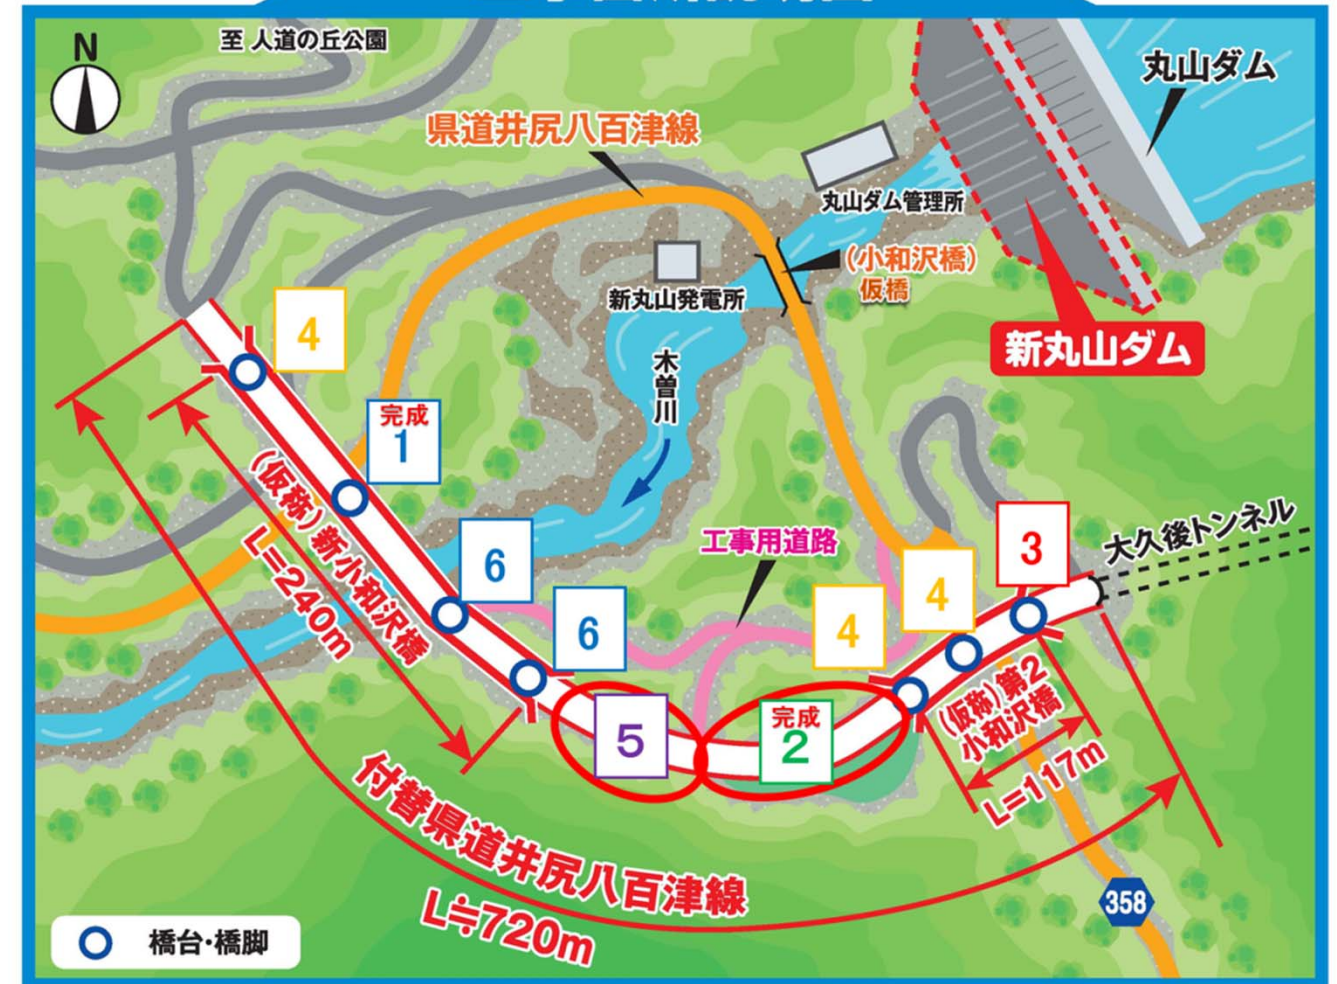


# 新丸山ダム 井尻八百津線関連工事だより (12月期)

皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

**工事の近況状況及び平成26年12月期の工事予定**をお知らせ致します。  
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。  
又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。  
尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。


## 工事箇所説明図



発注者  
国土交通省 中部地方整備局  
新丸山ダム工事事務所  
TEL 0574-43-2780(代)  
工事課

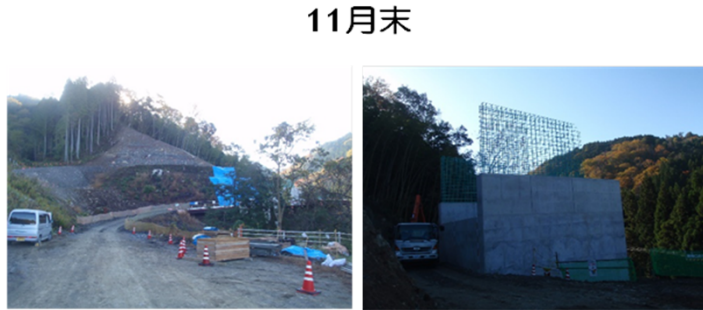
3

平成26年11月末時点

業者名	曙開発(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成26年1月26日
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良(土工等) 1式
12月の作業内容	現在橋の台座(橋台)を完了しました。今後は、順次埋戻しや周りの整備、道路部分の掘削、斜面の保護を行っていきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650
進捗率	




着工前



11月末

4

平成26年11月末時点

業者名	日産工業(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成27年 1月16日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
12月の作業内容	引き続き(仮称)第2小和沢橋P1橋脚の基礎(深礎)工事とA2橋台の躯体工事を行う予定をしています。火薬の使用に伴い県道井尻八百津線を通行止めさせていただく予定です。(別図規制情報参照) 詳細については、お知らせ看板にてお知らせ致します。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629
進捗率	




着工前(第2小和沢橋P1,A2)

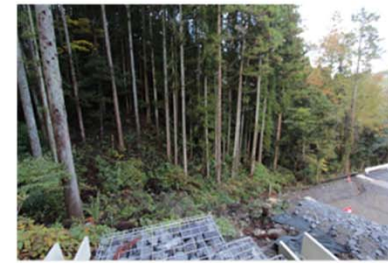
11月末(第2小和沢橋P1,A2)



5

平成26年11月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線改良工事
工事期間	平成26年 8月20日～平成27年 3月31日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	道路改良(土工等) 1式
12月の作業内容	関係機関との協議がようやく整い、11/25より立木の伐採に着手しました。12月も引き続き伐採を行い、伐採木の搬出、仮水路の設置など土工工事を行う予定をしております。ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 瀬藤 0574-25-2323
進捗率	




着工前



11月末

6

平成26年11月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 3月20日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基、道路改良(工事用道路) 1式
12月の作業内容	12月の中頃より着工する予定です。立木の伐採・搬出と仮設道路施工のための土工工事を行います。ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	



着工前

11月末

未着工
