



国道247号 西知多道路（東海JCT） 令和3年8月 工事便り

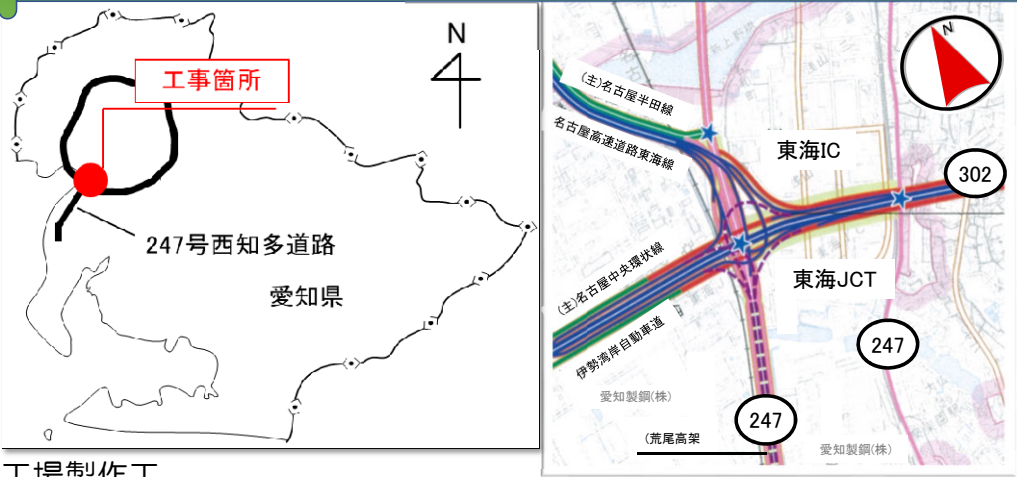


工場製作工

④ 愛知国道		⑥ 愛知国道 新しい工事です	
工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋鋼橋脚工事	工事名	令和3年度 247号西知多道路東海 JCT・Hランプ橋P13・14鋼橋脚工事
工期	令和3年2月26日 ～ 令和4年12月16日	工期	令和3年8月27日 ～ 令和6年2月29日
施工業者	JFEエンジニアリング 株式会社 TEL 052-561-8611 FAX 052-561-8620	施工業者	佐藤鉄工 株式会社 TEL 052-961-6200 FAX 052-968-2250
進捗率	12%	進捗率	0%
次月作業予定	工場製作工	次月作業予定	準備工
工事概要	東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	工事概要	東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。
今月の工事内容		今月の工事内容	
現在は工場にて鋼製橋脚の製作をしています。		工事着手に向けて、製作準備をしています	

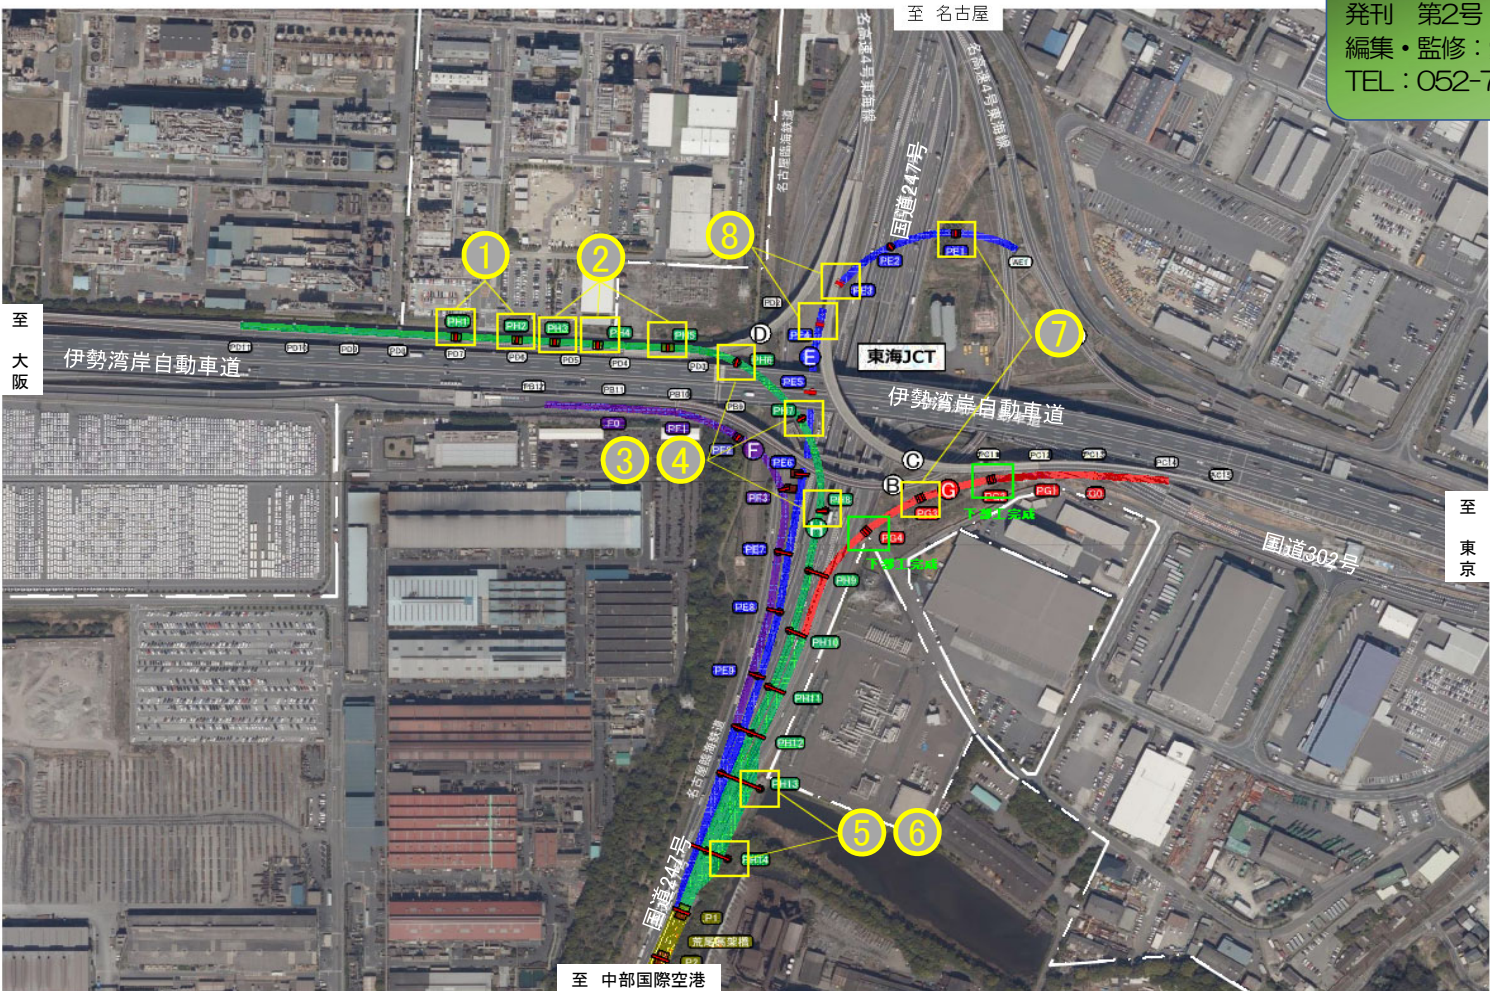

発刊 第2号 令和 3年9月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195

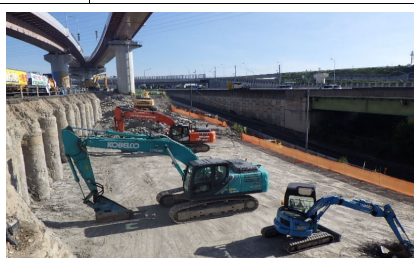① 愛知国道		② 愛知国道		③ 愛知国道		⑤ 愛知国道		⑦ 愛知国道		⑧ 愛知国道	
工事名	令和2年度302号梅之郷北地区道路建設工事	工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋下部工事	工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋基礎工事	工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋P13・14 基礎工事	工事名	令和元年度 247号西知多道路 東海JCT東部地区下部工事	工事名	令和元年度 247号西知多道路 東海JCT・Eランプ橋下部工事
工期	令和2年6月4日 ～ 令和3年11月30日	工期	令和2年12月1日 ～ 令和4年3月31日	工期	令和2年10月29日 ～ 令和4年3月31日	工期	令和3年3月16日 ～ 令和4年8月26日	工期	令和2年3月1日 ～ 令和3年9月30日	工期	令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日
施工業者	中目建設 株式会社 TEL 052-364-8815 FAX 052-364-8816	施工業者	矢作建設工業株式会社 TEL 052-602-5840 FAX 052-602-5840	施工業者	株式会社大林組 TEL 052-602-5707 FAX 052-602-5708	施工業者	大日本土木 株式会社 TEL 052-618-5813 FAX 052-618-5814	施工業者	中部土木 株式会社 TEL 052-883-8929 FAX 052-883-8930	施工業者	関興業株式会社 TEL 052-602-4012 FAX 052-825-5150
進捗率	91%	進捗率	4%	進捗率	0%	進捗率	0%	進捗率	90%	進捗率	50%
次月作業予定	橋脚躯体工（PH1）	次月作業予定	側道切廻し工、構造物撤去工	次月作業予定	準備工	次月作業予定	準備工、土壌調査	次月作業予定	ブロック積み擁壁工、排水構造物工（PG3）	次月作業予定	杭施工に向けての準備工、構造物撤去工
工事概要	東海市新宝町で西知多道路の橋脚2基をつくっています。	工事概要	東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚をつくっています。	工事概要	東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要	東海市名和町で東海JCTの橋脚基礎をつくっています。	工事概要	東海市浅山で橋脚をつくっています。	工事概要	東海市新宝町で橋脚の杭を作っています。
											
今月の工事内容		今月の工事内容		今月の工事内容		今月の工事内容		今月の工事内容		今月の工事内容	
PH2橋脚の梁の鉄筋、型枠の組立、そしてコンクリートの打設をしています。		工事着手に向けて、既設橋脚のひび割れ調査や測量などの現地調査をしています。		工事の準備として試掘や測量を行っています。		工事着手に向けて、測量や試掘、土壌調査などを行っています。		PG3橋脚の躯体構築が終わり、足場の解体や後片付けなどをしております。		杭施工の作業ヤード確保のため、構造物の取り壊しをしています。	
