
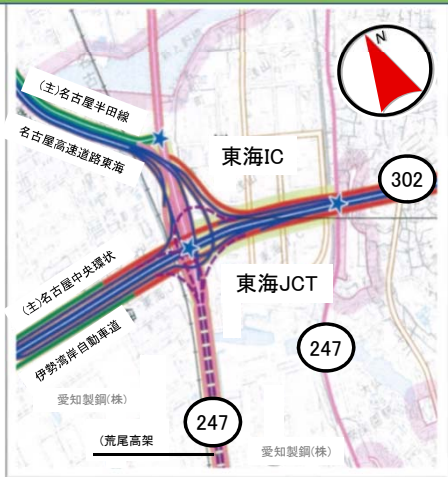


国道247号 西知多道路（東海JCT） 令和3年10月 工事便り

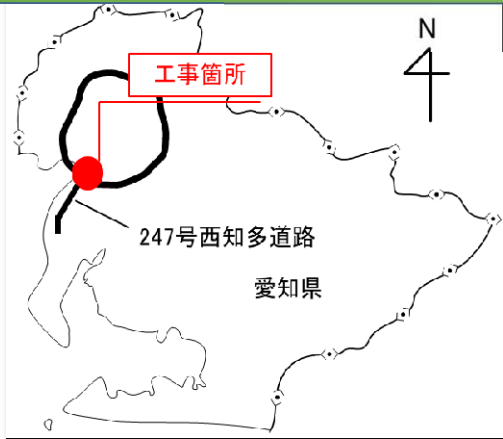

発刊 第4号 令和3年11月
編集・監修：愛知県道事務所
TEL：052-761-1195

工場製作工

④	⑥	⑨
工事名	令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋鋼橋脚工事	令和3年度 247号西知多道路東海 JCT・Hランプ橋P13・14鋼橋脚工事
工期	令和3年2月26日 ～ 令和4年12月16日	令和3年8月27日 ～ 令和6年2月29日
施工業者	JFEエンジニアリング 株式会社 TEL 052-561-8611 FAX 052-561-8620	佐藤鉄工 株式会社 TEL 052-961-6200 FAX 052-968-2250
進捗率	16%	0%
次月作業予定	工場製作工	準備工
工事概要	東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。	東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっています。
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
現在、工場にてPH6～8の鋼製橋脚の製作をしています。	工事着手に向けて、製作準備をしています。	工事着手に向けて、製作準備をしています。

①	②	③	⑤	⑦	⑧
工事名	令和2年度302号梅之郷北地区道路建設工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋下部工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋基礎工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋P13・14 基礎工事	工事名 令和元年度 247号西知多道路 東海JCT・Eランプ橋下部工事
工期	令和2年6月4日 ～ 令和3年11月30日	工期 令和2年12月1日 ～ 令和4年3月31日	工期 令和2年10月29日 ～ 令和4年3月31日	工期 令和3年3月16日 ～ 令和4年8月26日	工期 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日
施工業者	中日建設 株式会社 TEL 052-364-8815 FAX 052-364-8816	施工業者 やはぎけんせつこうぎょう 矢作建設工業株式会社 TEL 052-602-5840 FAX 052-602-5840	施工業者 かぶしきがいしやおおばやし 株式会社大林組 TEL 052-602-5707 FAX 052-602-5708	施工業者 だいにとびんどぼく 大日本土木 株式会社 TEL 052-618-5813 FAX 052-618-5814	施工業者 かんぎょうふくしきがいしや 関興業株式会社 TEL 052-602-4012 FAX 052-825-5150
進捗率	99%	進捗率 7%	進捗率 0%	進捗率 0%	進捗率 76%
次月作業予定	排水構造物工	次月作業予定 杭施工を行うため鋼矢板打設作業	次月作業予定 PH8の工事のための、既設物撤去、仮設工	次月作業予定 基礎工事に向けての作業ヤード整備工	次月作業予定 杭施工に向けての準備工、構造物撤去工
工事概要	東海市新宝町で西知多道路の橋脚2基をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で橋脚の杭を作っています。
					
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
橋脚の施工工事が終わり、足場の解体と排水構造物の復旧をしています。	杭施工の作業ヤード確保のため、掘削をしています。	準備工として新宝高架橋下の設備ヤードを整備します。	土壌調査および既設構造物等の現地調査をしています。	杭施工の作業ヤード確保のため、構造物の取り壊しをしています。	杭施工の作業ヤード確保のため、構造物の取り壊しをしています。
