
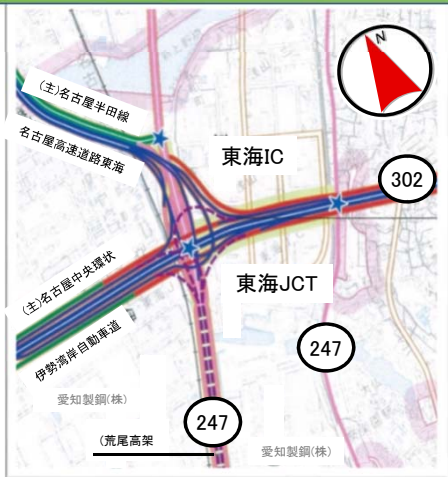


国道247号 西知多道路（東海JCT） 令和4年1月 工事便り

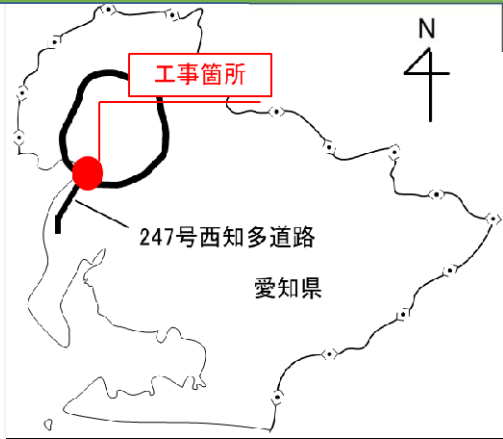

発刊 第7号 令和4年2月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195

工場製作工

③ 愛知国道	⑤ 愛知国道	⑦ 愛知国道
工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋鋼橋脚工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海 JCT・Hランプ橋P13・14鋼橋脚工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路東海JCT・ H-1ランプ橋鋼上部工事
工期 令和3年2月26日 ～ 令和4年12月16日	工期 令和3年8月27日 ～ 令和6年2月29日	工期 令和3年10月1日 ～ 令和5年2月28日
施工業者 JFEエンジニアリング 株式会社 TEL 052-561-8611 FAX 052-561-8620	施工業者 佐藤鉄工 株式会社 TEL 052-961-6200 FAX 052-968-2250	施工業者 日本車輛製造 株式会社 TEL 052-882-3320 FAX 052-883-2540
進捗率 19.3%	進捗率 0%	進捗率 0%
次月作業予定 工場製作工	次月作業予定 準備工、材料手配の着手	次月作業予定 準備工
工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっ ています。	工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚をつくっ ています。	工事概要 東海市新宝町で東海JCTのランプ部の橋梁 をつくっています。
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
現在、工場にてPH7、8橋脚の部材の組み 立て、溶接をしています。	工事着手に向けて、製作準備をしていま す。	工事着手に向けて、製作準備をしていま す。

① 愛知国道	② 愛知国道	④ 愛知国道	⑥ 愛知国道	⑧ 愛知国道
工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋下部工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋基礎工事	工事名 令和2年度 247号西知多道路 東海JCT・Hランプ橋P13・14 基礎工事	工事名 令和元年度 247号西知多道路 東海JCT・Eランプ橋下部工事	工事名 令和3年度 247号西知多道路 東海JCT・EHランプ橋基礎工事
工期 令和2年12月1日 ～ 令和4年6月30日	工期 令和2年10月29日 ～ 令和4年10月17日	工期 令和3年3月16日 ～ 令和5年2月28日	工期 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日	工期 令和3年12月1日 ～ 令和5年3月24日
施工業者 矢作建設工業株式会社 TEL 052-602-5840 FAX 052-602-5840	施工業者 株式会社大林組 TEL 052-602-5707 FAX 052-602-5708	施工業者 大日本土木 株式会社 TEL 052-618-5813 FAX 052-618-5814	施工業者 関興業株式会社 TEL 052-602-4012 FAX 052-825-5150	施工業者 五洋建設株式会社 TEL 052-209-8950 FAX 052-201-3260
進捗率 32.9%	進捗率 5.7%	進捗率 4.4%	進捗率 96%	進捗率 0%
次月作業予定 橋脚の下部の杭作業	次月作業予定 ケーソン施工に先立ち掘削、覆工設置	次月作業予定 基礎工事に向けての作業ヤード整備工	次月作業予定 土留・仮締切工 RC橋脚工	次月作業予定 準備工
工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋 脚をつくっています。	工事概要 東海市新宝町で西知多道路Hランプ橋の橋 脚基礎をつくっています。	工事概要 東海市名和町で東海JCTの橋脚基礎をつ くっています。	工事概要 東海市新宝町で橋脚の杭を作っています。	工事概要 東海市名和町で西知多道路Eランプ橋とH ランプ橋の橋脚基礎をつくっています。
				
今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容	今月の工事内容
橋脚構築のために、下部工の基礎部分 の場所打杭を施工しています。	橋脚基礎施工のため、国道247号に鋼矢板 を打設しました。	基礎工事の作業ヤード確保のため、ヤード 整備をしています。	PE3橋脚の土留・仮締切（鋼矢板圧入）と PE3.4橋脚の掘削、コンクリート打設を行 い、場所打ち杭の仕上げ（杭頭処理）の施 工を実施しています。	準備工として、現地調査（埋設）と夜間道路 規制ための協議資料作成を行っています。
