

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所


「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ コンクリート床版の撤去(①)が完了し、橋桁を撤去する設備(②)を準備中。また橋桁撤去に向け、県道及び市道を南側に移動させる道路整備(③)を実施中。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 右岸側の仮橋(④)及び国土交通省保有の応急組立橋(⑤)の架設が完了。また、左岸側の仮橋の一部(⑥)が完了し、引き続き、仮橋(⑦)を施工中。
- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 新橋の架橋位置・形式が確定。(詳細は、3ページ目参照)

作業時間帯：午前6時から午後7時まで ※土・日曜日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】

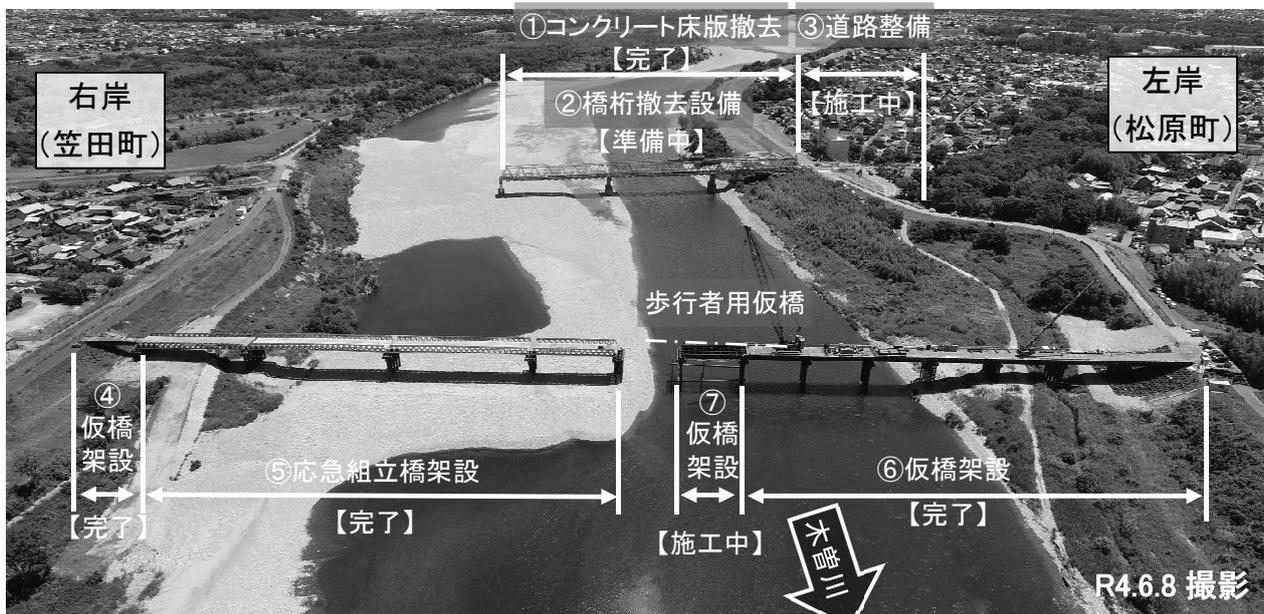

② 橋桁撤去設備の準備




⑦ 橋脚の施工

令和4年度 工事/業務一覧表

	工事 / 業務内容	施工者
1	歩行者用の仮橋設置 (令和4年8月頃開通予定)	市川・日東地域維持型建設共同企業体 (株)市川工務店
2	被災した川島大橋の橋桁撤去	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
3	進入路の設置、作業ヤードの整備等	(株)市川工務店
4	本復旧(新橋)検討のための地質調査	(株)テイコク

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 県道及び市道を南側に移動させる道路整備(①)を実施。橋桁撤去設備の設置完了後、歩道桁の撤去(②)を実施。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 引き続き、矢印の方向に向かって、仮橋架設(③)を施工。順次、仮橋に上がる階段・スロープ部(④)及び舗装・道路付属物(⑤)を施工。
- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 地質調査(⑥)を実施するとともに、橋梁の詳細設計を実施。

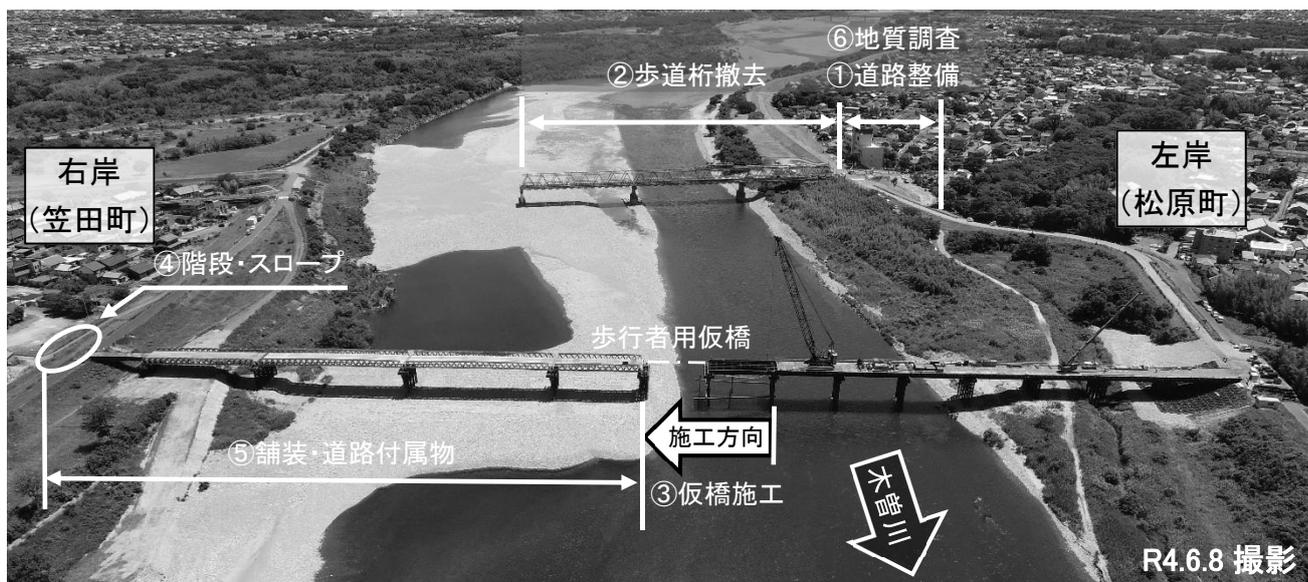

<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所

電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)

電話番号:052-212-8145

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093


川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。
URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>




【新橋の概要】

- 新橋の位置は、既設橋を撤去し、同位置に設置します。
- 新橋の形式は、被災原因の除去や早期復旧を図るため、経済性など総合的に判断して鋼2径間アーチ橋を採用します。

○平面図

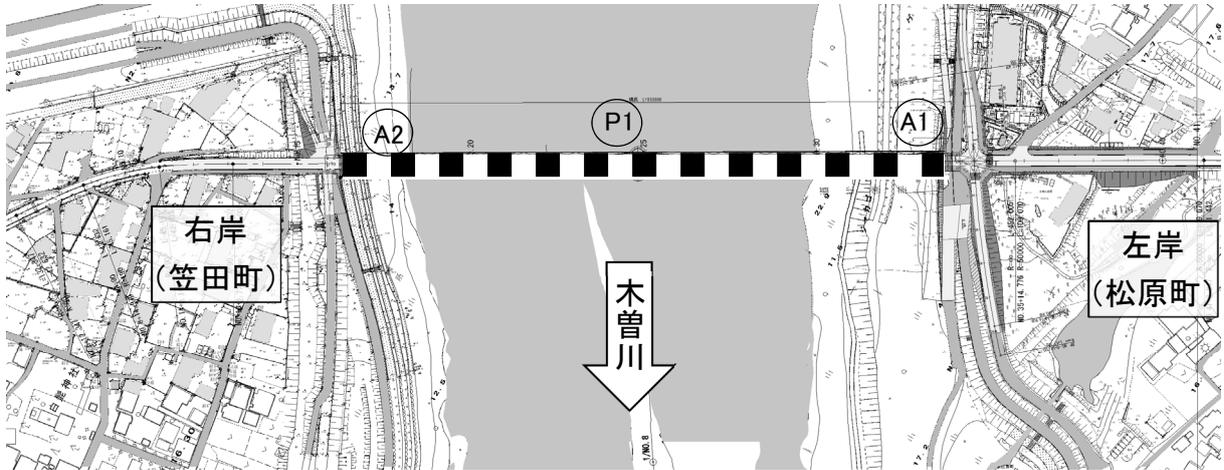

○断面図

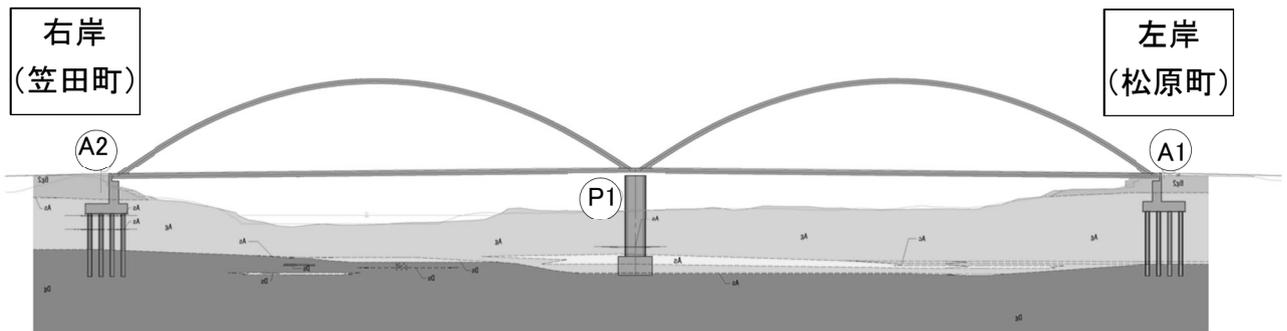

※色彩等の詳細については今後検討します。

【歩行者用仮橋の設置】

- 歩行者用仮橋については、令和4年8月頃の開通予定です。
※詳細な日程が決まり次第、別途お知らせします。
- 歩行者、自転車のみ通行可能です。※バイクは通行不可。

○断面図

