

令和4年7月15日

## 川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所


「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

### 1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 橋桁撤去設備(①)が完了し、歩道桁の撤去(②)に着手。また、県道及び市道の道路切り替えが完了し、残りの道路整備(③)を施工中。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 右岸側の仮橋(④)、国土交通省保有の応急組立橋(⑤)及び左岸側の仮橋(⑥)の架設が完了し、右岸の仮橋に上がる階段・スロープ部(⑦)及び仮橋上の道路付属物(⑧)、橋面舗装(⑨)を施工中。
- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 新橋の詳細設計を実施中。

作業時間帯：午前6時から午後7時まで ※土・日曜日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】

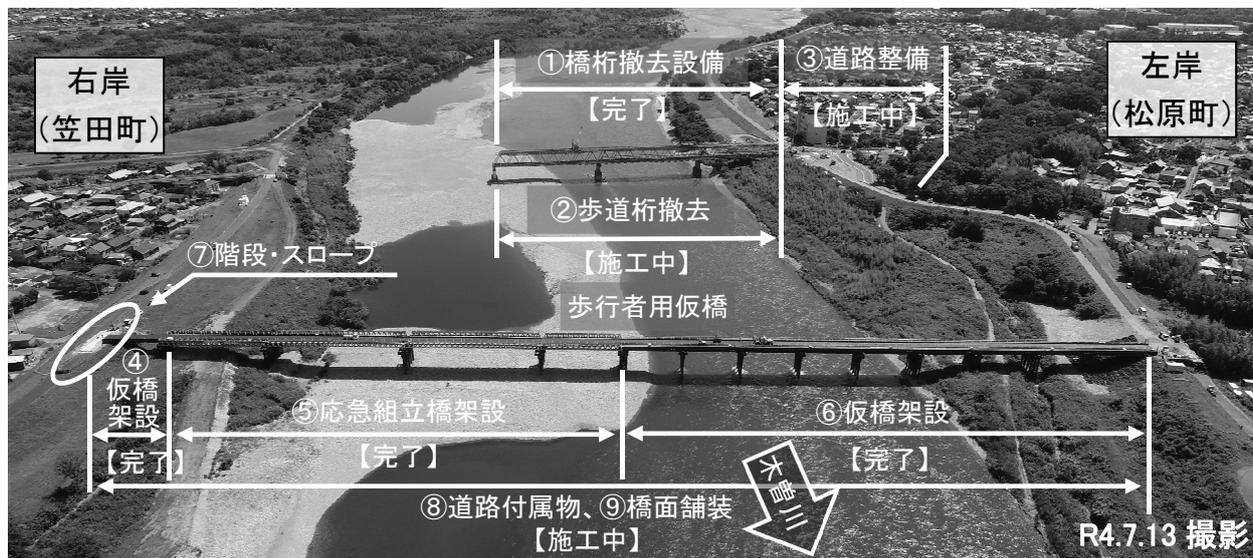

②歩道桁撤去状況



⑦スロープ施工状況



⑧⑨仮橋上施工状況

令和4年度 工事/業務一覧表


	工事 / 業務内容	施工者
1	歩行者用の仮橋設置 (令和4年8月頃開通予定)	市川・日東地域維持型建設共同企業体 (株)市川工務店
2	被災した川島大橋の橋桁撤去	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
3	進入路の設置、作業ヤードの整備等	(株)市川工務店
4	本復旧(新橋)検討のための地質調査	(株)テイコク

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 矢印の方向に向かって、歩道桁の撤去(①)を実施。  
車道桁の撤去に向けて、引き続き、道路整備(②)を実施。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 仮橋に上がる階段・スロープ部(③)及び道路付属物(④)、  
橋面舗装(⑤)を施工。

**※仮橋の開通日につきましては、決まり次第ご案内いたします。**

- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 地質調査(⑥)を実施するとともに、橋梁の詳細設計を実施。

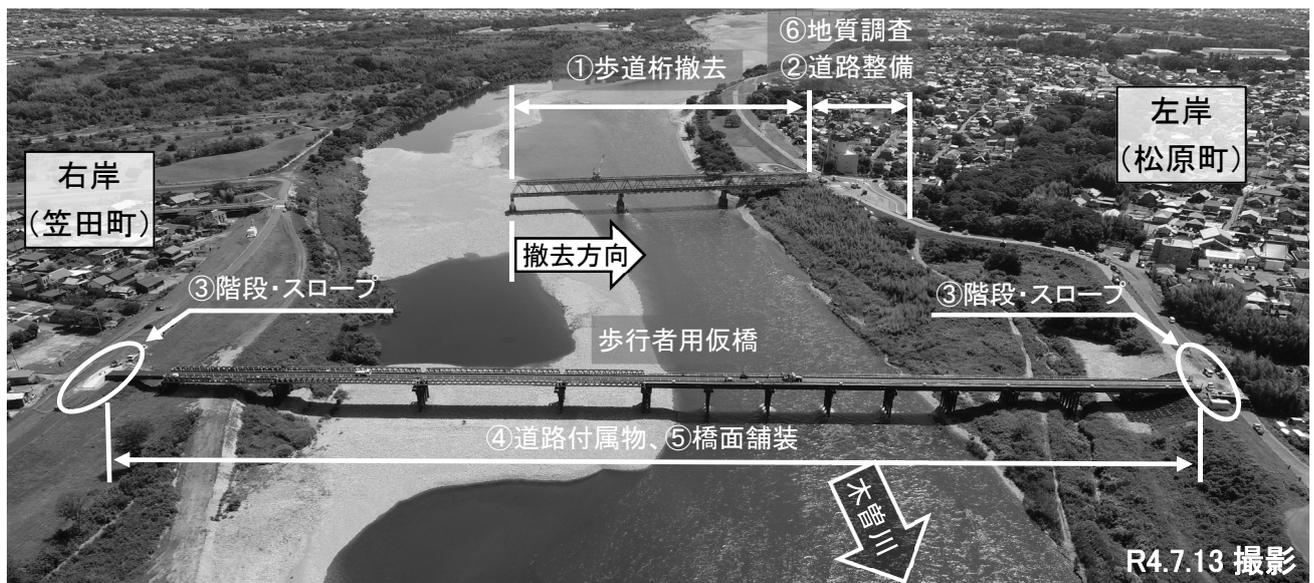

<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所

電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)

電話番号:052-212-8145

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。

URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

