

令和5年4月18日

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所


「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」 ⇒ ①旧 A 2 橋台、③旧 P 3 橋脚 . . . 撤去完了
②旧 P 2 橋脚、④旧 P 4 橋脚 . . . 柱の撤去完了
- 「新しい川島大橋の設置」 ⇒ ⑤ P 1 橋脚工事
⑥両岸の A 1、A 2 橋台（基礎）工事 を施工中
工事影響の調査（井戸調査）を実施中
- 「歩行者用の仮橋設置」 ⇒ 令和4年8月26日に開通

作業時間帯：午前6時～翌日午前6時（昼夜施工） ※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】
※今月から主に「被災した川島大橋の撤去」及び「新しい川島大橋の設置」の進捗をお伝えいたします。

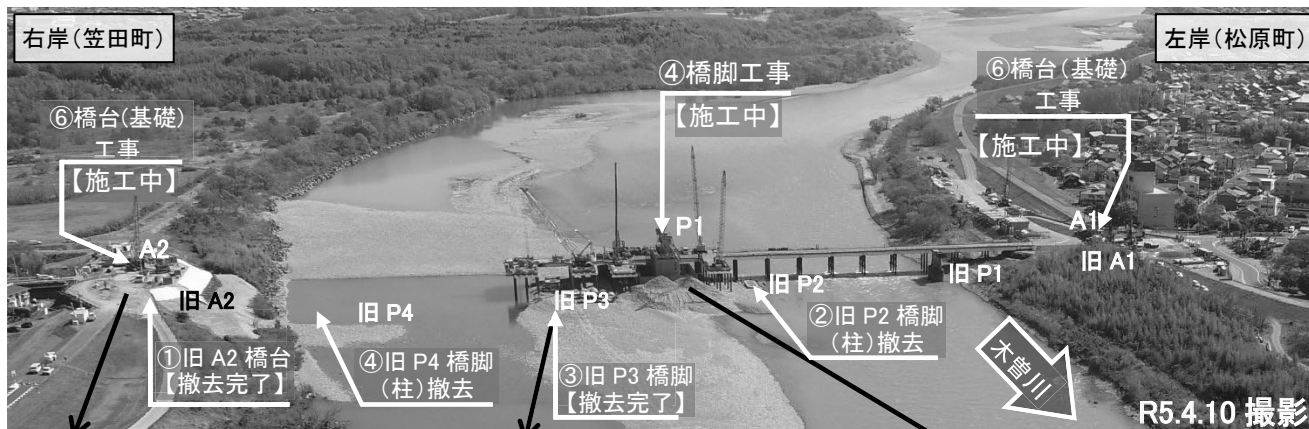

▼⑥A2 橋台基礎



橋を支える土台（橋台）の杭を作っています。

▼③旧 P3 橋脚



被災した川島大橋を支えていた、P3 橋脚の撤去が完了しました。

▼④P1 橋脚工事



橋を支える柱（橋脚）のコンクリートを打つ準備をしています。

裏面へ続く

令和5年度 工事/業務一覧表

工事 / 業務内容		施工者
1	被災した川島大橋の撤去	橋脚 (株)市川工務店
2	新しい川島大橋の設置	橋脚 (株)市川工務店
		橋台
3	作業ヤードの整備等	青協建設(株)
4	本復旧(新橋)検討のための調査	(株)建設技術研究所 日本工営(株)・日本工営都市空間(株)

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」 ⇒ ①仮栈橋の撤去工事を実施。
- 「新しい川島大橋の設置」 ⇒ ②P1橋脚工事
③兩岸のA1、A2橋台(基礎)工事を施工。
工事影響の調査(井戸調査)を実施。



<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課

電話番号:058-271-9814

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 青協建設(株)(土木部)

電話番号:0575-22-3110

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。

URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

