

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所

「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」 ⇒ 旧A2橋台、旧P3橋脚・・・撤去完了
旧P2橋脚、旧P4橋脚・・・柱の撤去完了
- 「新しい川島大橋の設置」 ⇒ ①左岸のA1台（基礎）工事を施工中
②左岸の高水敷の後片付けを実施中
③右岸の工事用道路を施工中
工事影響の調査（井戸調査）を実施中
右左岸において電波障害の調査を実施予定
- 「歩行者用の仮橋設置」 ⇒ 令和4年8月26日に開通

作業時間帯：午前6時～翌日午前6時（昼夜施工） ※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】



※①A1橋台（基礎）工事において、振動・騒音が発生しており大変ご迷惑をおかけ致します。

（6月中の完了を予定しています。）

▼③工事用道路



かさだ公園付近の堤防道路を、
大型の工事用車両が走行出来るように
拡幅しています。


令和5年度 工事/業務一覧表

	工事 / 業務内容		施工者
1	新しい川島大橋の設置	橋台	(株)市川工務店
2	作業ヤードの撤去等		青協建設(株)
3	本復旧(新橋)検討のための調査		(株)建設技術研究所 日本工営(株)・日本工営都市空間(株) 国際航業(株)


2. 今後の予定

○「新しい川島大橋の設置」 ⇒ 右岸県道の撤去工事を実施。

※7～9月での工事を予定しており、工事中は振動・騒音等が想定されるため、大変ご迷惑をおかけ致します。(近隣のお宅へは個別に工事のご説明に伺います。)

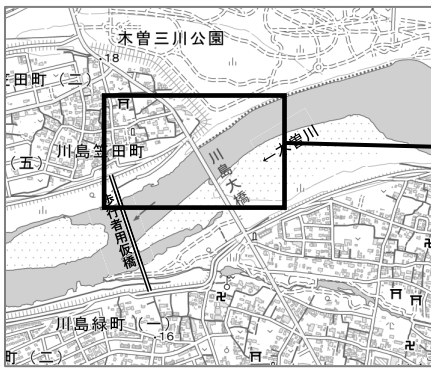

地図出典: 国土地理院ウェブサイト

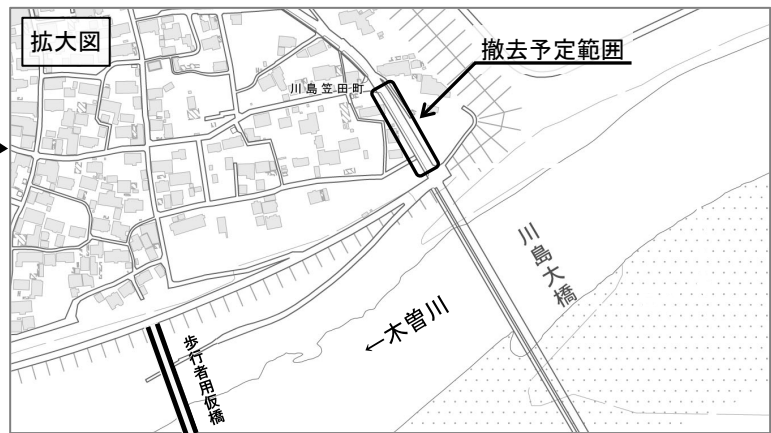

3. 回覧について

○6月以降は、雨が多い季節を迎えるため河川内での工事は実施していません。

このため、現在は10月以降に河川内で実施する、橋台工事、橋脚工事、旧川島大橋の橋脚・橋台の撤去工事等に向けた段取り・調整を行っています。

次回の回覧は9月頃を予定しておりますので、ご了承願います。

<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課

電話番号: 058-271-9814

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 市川工務店(株) (建設管理部)

電話番号: 058-251-2244

※施工者の連絡先が変わりました。

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号: 058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。
URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

