

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所

令和7年9月吉日

「川島大橋の通行止め」に関しまして、地域の皆様には大変ご不便をおかけしております。
川島大橋の復旧事業に関する進捗状況や今後の予定などについて、お知らせいたします。
一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携し、復旧を進めてまいります。
ご理解ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。

進捗状況

作業時間帯：午前7時～翌午前7時（昼夜施工）※土日・祝日も工事を行う場合があります。【荒天の場合は中止】

両岸では、橋台付近にて①取付道路工事、③進入路設置工事を行っています。
今秋より橋架設予定の②川島大橋の橋部材を工場で作っています。

右岸（笠田町）

①取付道路工事

⑥鋼橋架設工事

新A2橋台

③進入路設置工事

①取付道路工事

④工事用栈橋設置工事

新P1橋脚

③進入路設置工事

⑤バント（橋を架けるための仮支え）設置工事

左岸（松原町）

新A1橋台

R7.9.8撮影

完成イメージ図

□…これまでに確認済み
□…R7.9月確認予定

今秋よりの現場架設に向け、現在、橋部材を製作しています。これまでに、工場内で、完成イメージ図の□部分の橋部材を組み立て、設計図どおり作られていることを確認しました。R7.9月には、□部分を確認します。確認後は分解し、塗装などの作業を行います。引き続き、残る橋部材を作りながら、工場内で組み立て設計図どおりであることの確認を行い、今秋からの橋架設に備えます。



②工場での橋製作
および仮組み立て状況

今後の予定・・・以下の工事を予定しています。


引き続き、両岸の橋台付近にて①取付道路工事、③進入路設置工事を進め、工場では②川島大橋の橋部材を作ります。10月からは、橋架設のため、河川内で④工事用栈橋工事、⑤バント設置工事を始めます。そして、橋架設の準備が整い次第、⑥鋼橋架設工事を進めていきます。天候や河川状況等により作業内容が変更になる場合があります。

裏面へ続く

※イラストはイメージであり、縮尺、色、設置場所などは実際とは異なります。



お知らせ

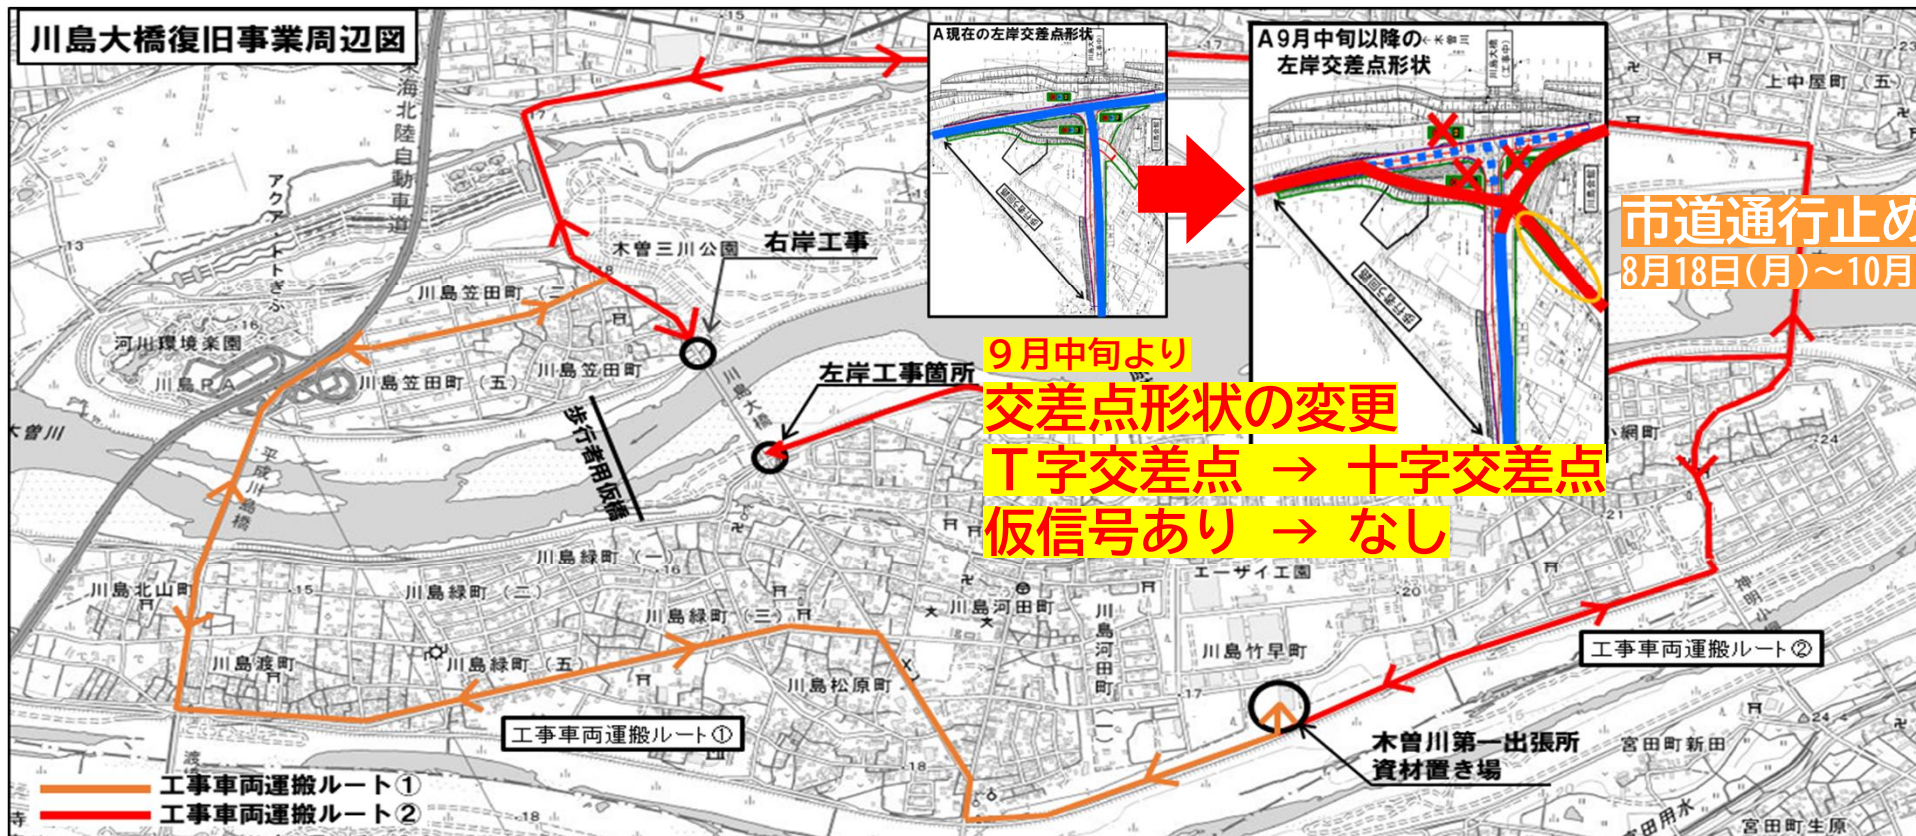

工事車両に番号を
掲示しています。
工事車両に関する
お問合せ時に上記番
号をお伝えいただけ
れば、担当工事に連
絡いたします。

●工事車両の走行について

- ・資機材の搬出入等に伴って車両が多数走行するため、安全には十分注意いたします。

●騒音・振動の発生について

- ・工事作業等に伴って、**騒音・振動が発生**いたします。時間帯等には十分注意して作業いたします。

●通行規制について

- ・左岸側道路は周辺図内の「A現在の左岸交差点形状」のとおり、信号交差点です。9月中旬より、**T字交差点を十字交差点に切り替える**と同時に、**仮信号交差点ではなくなります**のでご利用時は注意願います。
- ・川島会館南の市道は、8/18(月)から10月下旬まで通行止めとなります。
- ・県道についても片側交互通行を行う場合があります。

お問合せ先

① 復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課
電話番号：058-271-9814

施 工 者 川島大橋復旧工事連絡協議会
青協建設(株) 土木部
電話番号：0575-22-3111

② 川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課
電話番号：058-215-0093

※川島大橋復旧事業に関する情報は 岐阜国道事務所HPでご覧いただけます。
→<https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

