

## 川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所

令和8年2月吉日

「川島大橋の通行止め」に関しまして、地域の皆様には大変ご不便をおかけしております。川島大橋の復旧事業に関する進捗状況や今後の予定などについて、お知らせいたします。一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携し、復旧を進めてまいります。ご理解ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。

## 進捗状況

作業時間帯：午前7時～翌午前7時（昼夜施工）※土日・祝日も工事を行う場合があります。【荒天の場合は中止】

兩岸の橋台付近にて①取付道路工事を行っています。河川内では製作した橋部材を現場へ輸送し②鋼橋上部工事を進めています。2月上旬、補剛桁（アーチ橋の床組部分となる地面に平行な部分）が兩岸につながり、現在、アーチ部の架設を進めています。



完成イメージ図

右岸（笠田町）

①取付道路工事

②鋼橋架設工事

①取付道路工事

②鋼橋架設工事

左岸（松原町）

新A2橋台 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 新P1橋脚 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 新A1橋台

B0～B14はベント  
（橋を架けるための仮支え）



※イラストはイメージであり、縮尺、色、設置場所などは実際とは異なります。

R8.2.21撮影

工場では、12月までにすべての橋部材を組み立て、設計図どおり作られていることの確認を終えました。確認を終え塗装など行った橋部材は順次現場に搬入しながら、橋架設を進めています。

鋼橋上部工事について、両側堤防より新P1橋脚に向かって伸ばしていた橋桁は、写真のとおり、2月上旬につながりました。地元の皆さまに安全な形で工事途中の状況を見て頂く機会を3月22日（日）に設ける予定をしています。詳細は別途ご案内いたしますので今しばらくお待ち頂けますようお願いいたします。


## 今後の予定・・・以下の工事を予定しています。

今後も工場で作られた川島大橋の橋部材の塗装を行い、順次現場へ輸送します。そして、引き続き鋼橋架設工事を進めていきます。ただし、天候や河川状況等により作業内容が変更になる場合があります。

裏面へ続く

# お知らせ

## 川島大橋復旧事業周辺図

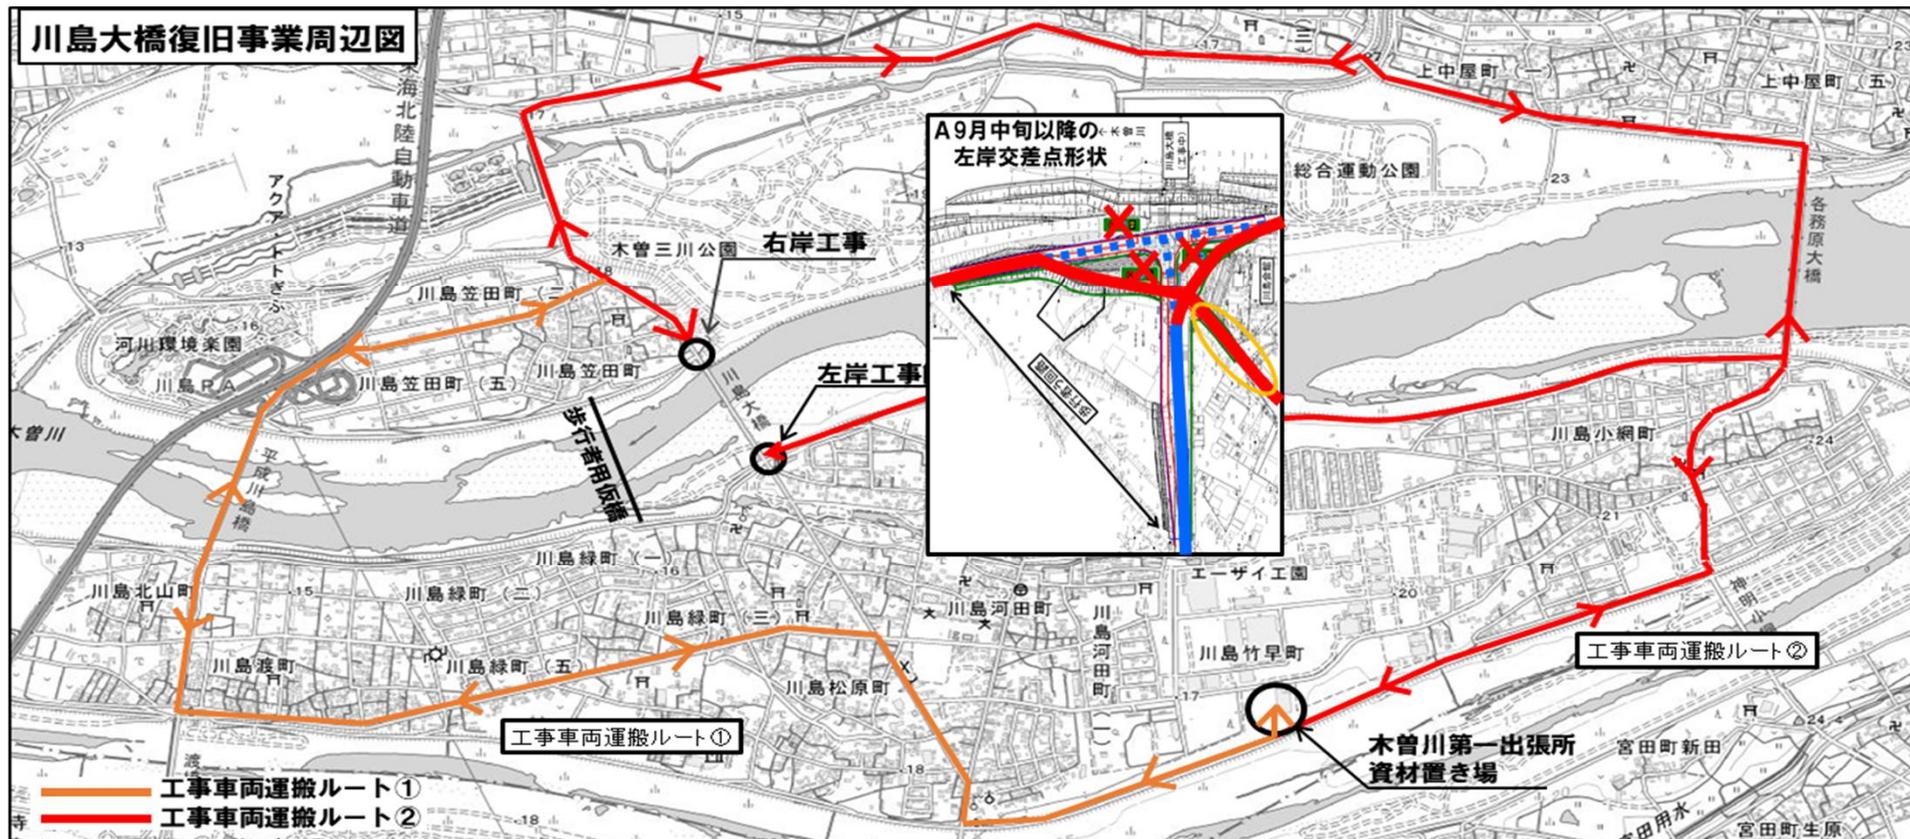

工事車両に番号を掲示しています。工事車両に関するお問合せ時に上記番号をお伝えいただければ、担当工事に連絡いたします。

### ●工事車両の走行について

・資機材の搬出入等に伴って車両が多数走行するため、安全には十分注意いたします。

### ●騒音・振動の発生について

・工事作業等に伴って、**騒音・振動が発生**いたします。時間帯等には十分注意して作業いたします。

### ●通行規制について

・左岸側道路は周辺図内の「A9月中旬以降の左岸交差点形状」のとおり、T字交差点を**十字交差点に切り替え**ています。

・当面は、現状の交差点形状での運用となります。ご利用時は注意をお願いします。

## お問合せ先

### ① 復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課  
電話番号：058-271-9814

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会  
IHI・瀧上特定建設工事共同企業体  
電話番号：0586-82-3183

### ② 川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課  
電話番号：058-215-0093

※川島大橋復旧事業に関する情報は 岐阜国道事務所HPでご覧いただけます。  
→<https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

