


令和8年4月吉日

川島大橋の復旧事業に関する進捗状況や今後の予定などについて、お知らせいたします。  
 一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携し、復旧を進めてまいります。  
 「川島大橋の通行止め」に関し、地域の皆様に大変ご不便をおかけしております。ご理解ご協力を賜りますよう何卒宜しくお願いいたします。

## 進捗状況

作業時間帯：午前7時～翌午前7時（昼夜施工）※土日・祝日も工事を行う場合があります。【荒天の場合は中止】

両岸の橋台付近にて①取付道路工事を行っています。②鋼橋上部工事は4月上旬にアーチ部分がつながり、現在は、河川内ベントの撤去、つないだ橋部材箇所（添接部）の現場塗装を進めています。

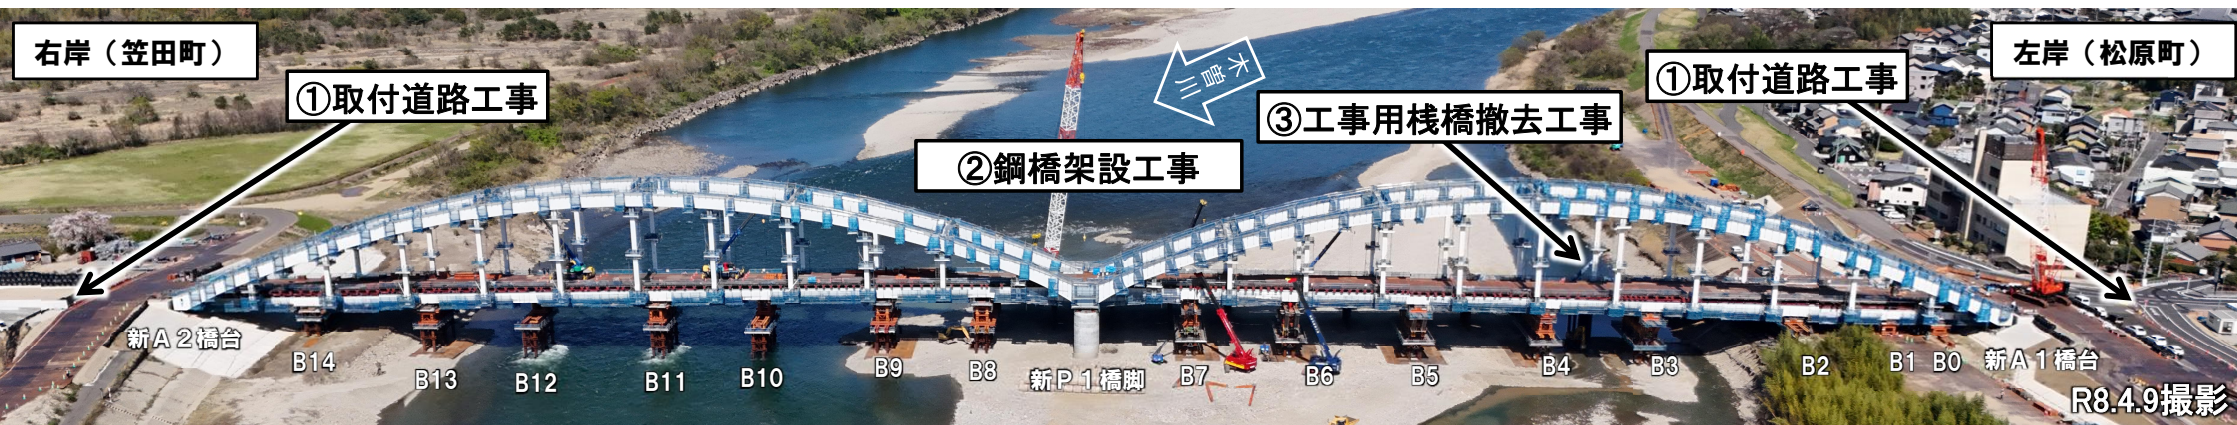

※ B0～B14はベント（橋を架けるための仮支え）

## 今後の予定・・・以下の工事を予定しています。

②鋼上部工事は、河川内ベントの撤去、現場塗装を引き続き進めていきます。鋼上部工事にて使用した③工事用栈橋を撤去する工事を開始します。②鋼上部工事が終わりましたら、車が走れるよう床版の設置を進めて行く予定です。ただし、天候や河川状況等により作業内容が変更になる場合があります。

## お問合せ先

### ① 復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課  
 電話番号：058-271-9814

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会  
 IHI・瀧上特定建設工事共同企業体  
 電話番号：0586-82-3183

### ② 川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課  
 電話番号：058-215-0093

※川島大橋復旧事業に関する情報は 岐阜国道事務所HPでご覧いただけます。  
 →<https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>



# 川島大橋災害復旧事業 現場状況

令和8年4月1日時点

## 1 被災状況(施工前状況)



## 4 旧橋撤去③ 新橋設置①



## 7 新橋設置④



## 2 旧橋撤去①(大型クレーンによる一括撤去)



## 5 新橋設置②



## 8 新橋設置⑤



現況

## 3 旧橋撤去②(トラペラクレーン及び架設桁を用いた撤去)



## 6 新橋設置③



## 9 新橋設置⑥

