

令和8年9月吉日

国土交通省 岐阜国道事務所

川島大橋の復旧事業に関する進捗状況や今後の予定などについてお知らせいたします。
一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携し、復旧を進めてまいります。
「川島大橋の通行止め」に関し、地域の皆様に大変ご不便をおかけしております。ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

進捗状況

作業時間帯：午前7時～翌午前7時（昼夜施工）

※土日・祝日も工事を行う場合があります。【荒天の場合は中止】

兩岸の橋台付近にて①取付道路工事を行っています。また、車が走るための②床版の設置を7月から行っていましたが、9月上旬に無事に設置が完了しました。現在、安全に車が走行できるように地覆および鋼製高欄の設置を進めています。



今後の予定・・・以下の工事を予定しています。

引き続き①取付道路工事および②床版設置工事（地覆および鋼製高欄の設置）を進めて行きます。復旧工事を進めるにあたり、今後、川島会館前道路の通行止め規制を必要とします。次ページにて詳細をご連絡いたします。

復旧予定のお知らせ

川島大橋は今年度内での復旧が発表されています。
詳細な復旧の日につきましては決まり次第ご報告いたします。

お問合せ先

① 復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課
電話番号：058-271-9814
施 工 者 川島大橋復旧工事連絡協議会
ピー・エス・コンストラクション(株)
電話番号：0586-89-3570

② 川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課
電話番号：058-215-0093

※川島大橋復旧事業に関する情報は
岐阜国道事務所HPで
ご覧いただけます。
→<https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>




お知らせ

●通行規制について

川島大橋南詰交差点付近（川島会館周辺）の道路は、11月より3月まで通行規制（段階的な通行止め）を行いながら工事を進めて行くこととなります。

- STEP1 R8. 11月～R9. 1月 交差点西側市道通行止め
- STEP2 R9. 1月～ 2月 交差点東西市道通行止め
- STEP3 R9. 2月～ 3月 交差点東西市道、南側県道通行止め

具体的な日にちについては、今後、お知らせいたします。※現在、工事工程精査中
今後の回覧、現地看板（設置予定）をご確認頂き、ご利用時は注意をお願いします。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

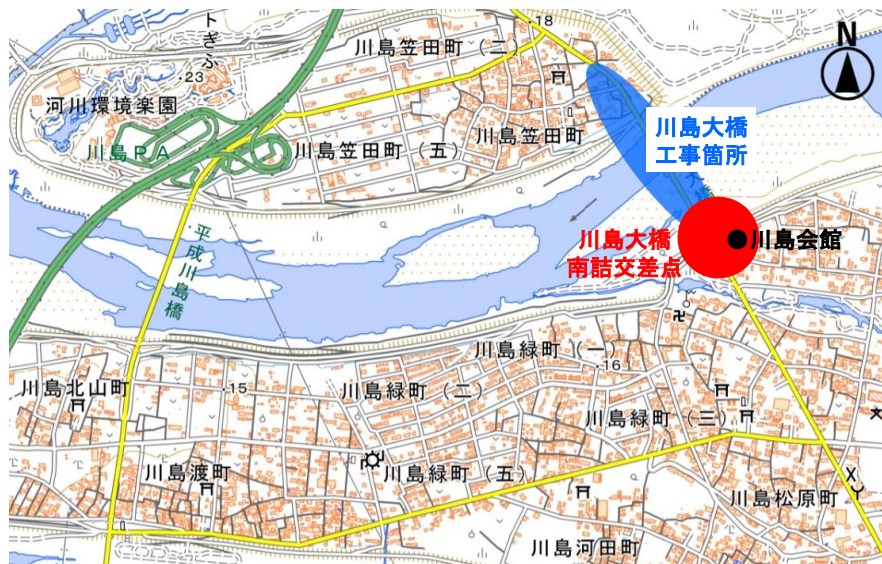

step1



Step2



step3



●工事用車両の走行について

資機材の搬出入等に伴い工事車両が多数走行するため、安全には十分注意いたします。

●騒音・振動の発生について

工事作業等に伴って、**騒音・振動が発生**いたします。時間帯等に十分注意し作業します。



工事用車両に番号を掲示しています。
工事用車両に関するお問合せ時に上記番号をお伝えいただければ、担当工事に連絡いたします。
