

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路(川合工区)かわら版

発行第69号
(平成27年12月1日)
責任者:安全協議会
株式会社中村組
間瀬 拓弥
TEL 053-965-1370

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要 佐久間第2トンネル(浦川~川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況 トンネル坑口部の掘削と、トンネルずりの判定、運搬を行っています。11/23時点進捗: 200.0m(上半)/2.408m

トンネル坑口



トンネルずり判定場



② 平成26年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 間瀬 053-965-1370

工事概要 佐久間道路橋梁の橋台・橋脚、佐久間IC(仮称)の盛土を行います。

進捗状況 橋脚深礎杭を掘削しています。佐久間IC(仮称)は引き続き盛土を行っています。

川合2号橋 橋脚深礎杭掘削



佐久間IC(仮称)



③ 平成26年度 佐久間道路川合地区下部工事 中村建設(株)松永 053-965-0082


工事概要 佐久間道路橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 川合1号橋は橋台築造のため、鉄筋・型枠の施工をしています。川合2号橋は橋台・橋脚の深礎杭を施工しています。

川合1号橋 躯体築造



川合2号橋 進捗状況

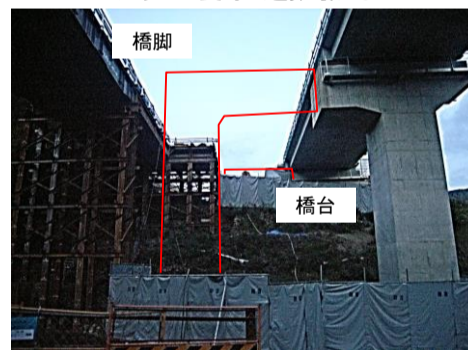

④ 平成27年度 佐久間道路川合地区整備工事 中村建設(株)清水 053-965-0082

工事概要 佐久間IC(仮称)付近の道路改良工事を行います。

進捗状況 BOX周辺は舗装終了後、規制を切替えて施工を行います。24号線は引き続き排水構造物を行っています。

路盤施工完了(BOX周辺)



排水工事(24号線)



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る

～建設モノづくりの最前線～



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>
