



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第144号
(2022年3月1日)
責任者:安全協議会
(株)安部日鋼工業
藤井 英樹
TEL 0536-29-9502

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成富 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 2月はトンネル内は覆工コンクリート工・防水工、起点側坑門部擁壁工、終点側では切土工を行いました。3月は、引続き覆工コンクリート工・防水工、終点側は急崖部の切土工を行います。

工事箇所全景

終点側施工状況



覆工コンクリート施工状況



② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 2月は貫通側坑門工の足場組立～型枠組立を行いました。3月は貫通側坑門工のコンクリート打設および仮設備の解体などを行います。

工事箇所全景

貫通側坑口 全景①



貫通側坑口 全景②



③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事 名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 2月はA1橋台で躯体工の工事を行いました。3月はA1橋台において片付けを行い工事完了となります。工事期間中は皆様のご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。

工事箇所全景



④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あおみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 2月は橋脚躯体工(柱部1ロット)が完了しました。3月は橋脚躯体工(柱部2ロット)の施工を行います。

工事箇所全景



P2橋脚



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

○住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
○電話番号：053-542-3877
○受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓↓↓↓↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第 144 号
(2022年 3月 1日)
責任者: 安全協議会
(株)安部日鋼工業
藤井 英樹
TEL 0536-29-9502

⑤ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴中工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要 三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況 2月はA2橋台の掘削と掘削面の補強工事を行いました。3月よりA2橋台の深礎杭の施工を行います。

工事箇所全景

3月施工
予定箇所



⑥ 令和2年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 大有建設(株) 小林 0536-76-0600

工事概要 三遠道路3号トンネルのコンクリート舗装工事(L=1070.0m)を行います。

進捗状況 2月は監視員通路壁側のハンドホール設置を行い、通過試験を取り行いました。3月は仕上げ・補修・清掃等を取り行い工事完了となります。工事期間中は皆様のご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。
工事箇所全景



起点側現況




終点側現況

⑦ 令和3年度 三遠道路7号PC上部工事 (株)安部日鋼工業 藤井 0536-29-9502

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 2月はP4橋脚脚頭部のコンクリート打設を完了、P2は脚頭部の鉄筋型枠を施工しました。3月はP4橋脚柱頭部工、P2橋脚脚頭部のコンクリート打設を施工します。

工事箇所全景

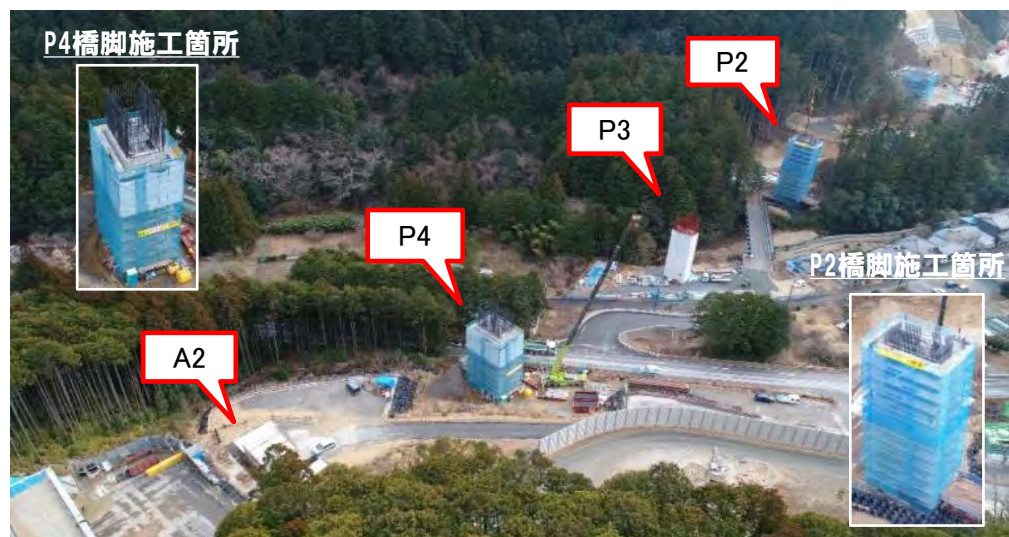

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

○住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
○電話番号：053-542-3877
○受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
