



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第163号
(2023年10月1日)
責任者：安全協議会
(株)佐藤渡辺
森内 勇
TEL 050-5527-4650

① 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 9月は、P3橋脚上の移動作業台車解体、P3橋脚～P4橋脚間の壁高欄工、A1橋台の躯体工事を行いました。10月は、引続き、P3橋脚～P4橋脚間の壁高欄工、A1橋台の壁高欄工、P3橋脚～A2橋台間の足場解体を行います。
工事状況



② 令和4年度 三遠道路1号トンネル舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工事概要 三遠道路1号トンネルの舗装工事(L=642m)を行います。

進捗状況 9月は、連続鉄筋コンクリート舗装工事(下り線)を行いました。また、電気等の配線用の配管工事を行いました。本工事は9月末をもって全ての作業が完了となりました。工事期間中は、皆様のご理解・ご協力ありがとうございました。
工事状況



③ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組③ 鈴木 053-412-1122

工事概要 三遠道路7号橋～8号橋間における法面整備工事及び、場所打擁壁工事の施工を行います。


進捗状況 本工事の川合地区における工事は全ての作業が完了となりました。11月から、東栄地区にて擁壁工事を行います。工事期間中は、皆様のご理解・ご協力ありがとうございました。
工事状況



④ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区整備工事 神野建設(株) 増田 050-5536-7159

工事概要 三遠道路3号トンネル内の新城地区(一部東栄地区)の整備工事(内面塗装・配水管・防護柵・舗装・監視員通路)を行います。

進捗状況 9月は、本坑の新城市側で、監視員通路工の埋戻し作業と、東栄町側で、配水管の工事を行いました。10月は、引続き、埋戻し作業と内面塗装工の施工を行います。
工事状況

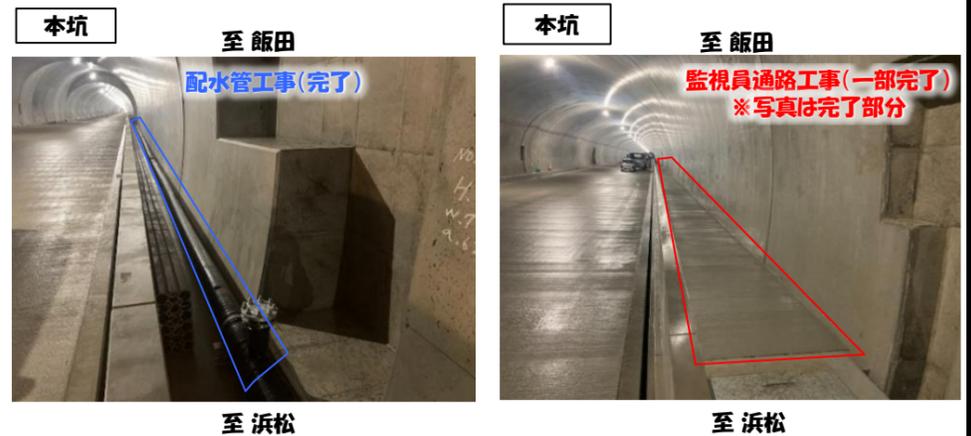

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道「三遠道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第163号
(2023年10月1日)
責任者:安全協議会
(株)佐藤渡辺
森内 勇
TEL 050-5527-4650

⑤ 令和4年度 三遠道路新城東栄地区道路建設工事 長坂建設興業(株)② 山田 090-6334-8683

工事概要 三遠道路1号、2号トンネル飯田市側の法面工事、落石雪害防止工事を行います。

進捗状況 9月は、各トンネル北側においてモルタル吹付工の準備、落石防護網工、排水構造物工を行いました。
10月は、9月工事に加え、モルタル吹付工、落石防護柵工の施工を行います。

工事状況



⑥ 令和5年度 三遠道路2号トンネル舗装工事 (株)佐藤渡辺② 森内 050-5527-4650

工事概要 三遠道路2号トンネルの舗装工事(L=436m)を行います。

進捗状況 9月は、ケーブル配管工と情報ボックス布設工を行いました。
10月は、コンクリート舗装の準備及び、上層路盤・中間層の施工を行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
