

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 三遠道路 (東栄・新城) かわら版

発行第92号  
(平成29年11月1日)  
責任者:安全協議会  
戸田建設(株)  
相羽 周  
TEL0536-33-5015

## ① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

### 進捗状況

避難坑を掘削しています。今月は本坑の掘削も進めていきます。

現在進捗(10/31時点) 本坑 17.5m/1,790m  
避難坑 196.0m/1,786m

工事箇所全景(坑口対岸より望む)




引き続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月は、本坑も夜間作業を開始します。工事に伴う騒音でご迷惑をおかけしておりますが、防音扉の増強や坑口周辺の防音シートの増設等の対策を順次行っていきます。

トンネル工事に対し、皆様におかれてはご不便を感じられることと思います。今後も皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解ご協力賜いますようお願いいたします。



防音扉

先月設置した防音扉にコンクリートを吹付けて扉の厚さを200mm厚くしました。防音効果の向上を図っています。

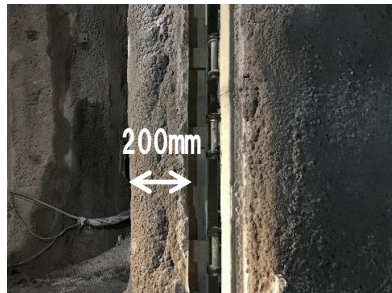

200mm

## ② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

### 進捗状況

先月と同じく避難坑を掘削しています。今月から本坑の掘削を開始します。

現在進捗(10/31時点) 避難坑 296.5m/1,782.6m

工事箇所全景(写真奥に向かってトンネルを掘削)



先月に引き続き避難坑の掘削を進めております。本坑については今月の初旬頃から掘削を開始する予定です。

本坑掘削開始に伴い国道を走行する工事車両が増加致します。皆様方にご迷惑をおかけいたしますが何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

避難坑削孔状況(爆薬を詰める穴を削孔中)




避難坑全景(坑内から坑口に向けて撮影)



### 三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
