

# 三遠道路 (東栄・新城) かわら版

発行第99号  
(平成30年6月1日)  
責任者:安全協議会  
(株)大林組  
黒川 尚義  
TEL053-966-6011

## ① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。


### 進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めていきます。  
現在進捗(5/20時点) 本坑 605.7m/1.790m  
避難坑 1099.9m/1.786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。  
今月は、本坑・避難坑の掘削作業と、並行して仕上げの覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。  
皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いたします。

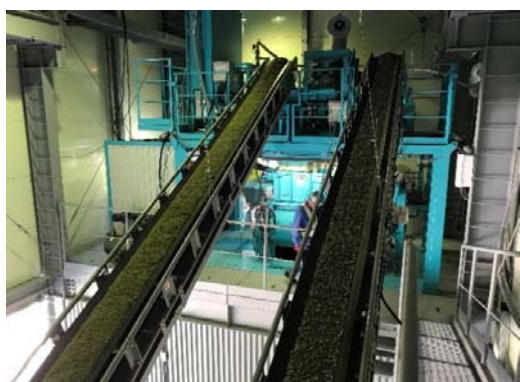

左の写真は、現場のバッチャープラント(コンクリート工場)です。右の写真はその内部の様子です。トンネル工事では24時間コンクリートを使用するため、工事現場敷地内にコンクリート工場を作ります。日々、材料の状態から水分量等の微調整を行い品質の良いコンクリートを出荷しています。

## ② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

### 工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

### 進捗状況

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めていきます。  
現在進捗(5/20時点) 本坑 544.1m/1.766m  
避難坑 1238.1m/1.783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。  
今月は本坑・避難坑の掘削作業と並行して本坑の入口部分の仕上がり、坑門工(こうもんこう)の作業を行います。  
皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いたします。



左の写真は、本坑の覆工(ふっこう)コンクリート打設完了後、パネルを並べて養生している状況と、覆工(ふっこう)コンクリートへの透水を防ぐための防水シートを設置した全景になります。右の写真は、避難坑の先端部(切羽)の全景になります。右に向って掘ってある穴は本坑と避難坑をつなぐ連絡坑になります。この連絡坑は将来、本坑で緊急事態等が発生した際に、避難坑へ避難したり緊急車両が本坑へ出入りする際に使用します。

三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック！  
【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
