



三遠道路 かわら版

(東栄・新城)

発行第101号
 (平成30年8月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)大林組
 黒川 尚義
 TEL053-966-6011

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑および避難坑の掘削を進めていきます。
 現在進捗(7/20時点) 本坑 924.9m/1,790m
 避難坑 1350.2m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。
 今月は、本坑・避難坑の掘削作業と、本坑の覆工(ぶっこう)コンクリートの作業を行います。
 皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。
 ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



上の写真は、本坑トンネルの出入口部分の坑門工(もうもんこう)を作っている様子です。右は完成のイメージ図です。トンネルの出入口に高さ約9.5mのコンクリートの壁(3階建ての建物と同じくらい)が出来上がります。坑門工は、トンネル周辺の山が崩れたり、落石があってもトンネルが塞がることのないように保護する役割もっています。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-33-5015


工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

引続き、本坑及び避難坑の掘削を進めていきます。
 現在進捗(7/20時点) 本坑 833.1m/1,766m
 避難坑 1575.3m/1,783m

工事箇所全景

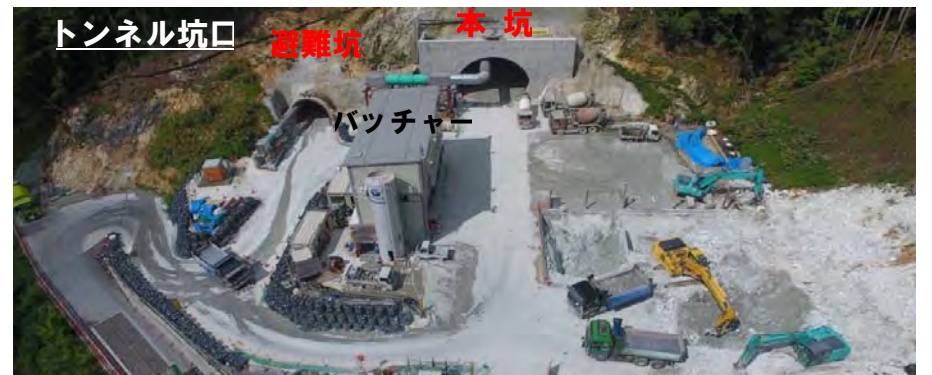

引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。
 今月も本坑・避難坑の掘削作業と並行して、本坑の覆工(ぶっこう)コンクリートの作業を行います。
 皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。
 ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



左の写真は、本坑(右側)と避難坑(左側)の坑口部(入口)全景写真になります。
 右の写真は6月26日に打設しました、本坑坑門部(入口部分の仕上げ)の写真になります。
 コンクリート打設完了後、一定期間の養生を行ってから型枠を脱型、足場を解体しおおよそ約1カ月半かかり完成しました。
 今後、避難坑も本坑と同様に坑門部(入口部分の仕上げ)の打設を行っていきます。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
 ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！
 【URL】
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
