


三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(東栄)

# かわら版

発行第157号  
(2023年4月1日)  
責任者:安全協議会  
株式会社中村組  
鈴木 雄祐  
TEL080-8252-9435

## ① 令和2年度 三遠道路4号トンネル工事 三井住友建設(株) 大原 053-966-6030

**工事概要** 三遠道路4号トンネル(トンネル延長L=841m)の新設工事を行います。

**進捗状況** 3月は覆工コンクリート工の施工を行いました。  
4月は覆工コンクリート工、終点側における坑門工の施工を行います。

工事状況



坑内施工状況

(覆工コンクリート完了区間)

## ② 令和3年度 三遠道路東栄地区道路建設工事 (株)中村組② 鈴木 080-8252-9435

**工事概要** 三遠道路1号橋A2側の東栄IC構築工事(東栄地区)を行います。

**進捗状況** 3月はクレーンによる上部工架設のため、排水工事の作業は中止しました。  
4月は東栄ICでは排水工事を行います。

工事状況



新城方面

排水工施工箇所

東栄IC

佐久間方面

新城方面

佐久間方面

## ③ 令和4年度 三遠道路PC上部工事 (株)安部日鋼工業② 大澤 080-1610-2711

**工事概要** 佐久間道路東栄IC(東栄2号橋)におけるフレテンション単純T桁橋(L=23m)の架橋を行います。

**進捗状況** 3月は資材を撤去し、清掃・片付けを行い、工事完了となります。工事期間中は皆様のご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。

工事状況



新城方面

佐久間方面

A1


A2

## ④ 令和3年度 三遠道路1号橋鋼上部工事 日本車輛製造(株) 井上 090-1419-2190

**工事概要** 三遠道路の東栄町における橋梁上部工3橋(本線L=44.9m、BランプL=39.1m、CランプL=53m)の架設を行います。

**進捗状況** 3月はベントの組立を行いました。  
4月は桁架設を行い足場組立も行います。  
林道小田線を8:00~17時まで規制して作業します。

工事状況

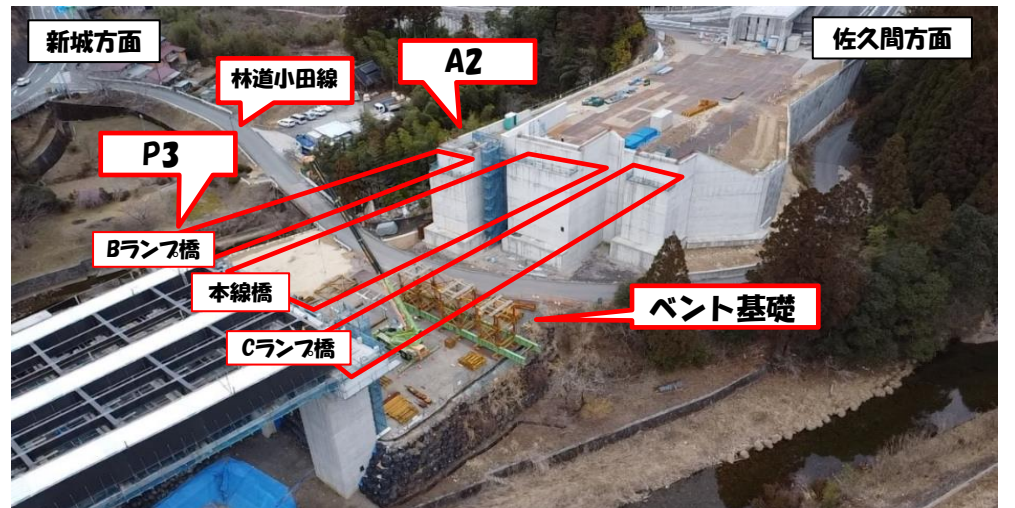

新城方面

佐久間方面

林道小田線

A2

P3

Bランプ橋

本線橋

Cランプ橋

ベント基礎

三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>
