



佐久間道路(浦川工区)かわら版

発行第68号
(平成27年11月1日)
責任者:安全協議会
須山建設(株)
鈴木 肇
TEL053-967-3951

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。
トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況 本坑の入り口と地中の奥でそれぞれ施工を進めています。
10/25現在の進捗 本坑 1097.6m/1555m
避難坑 1575m ★掘削完了



② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況 P1橋脚・P2橋脚共に、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を行っています。だいぶ橋らしくなってきました。
10/25時点での進捗 150.0m/270.0m



③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木肇 053-967-3951

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。


進捗状況 軽量盛土(発泡スチロールブロック)を施工しています。段数は8/20完了いたしました。
また、法面に重機足場(PC構台)を設置して13tクレーンにて施工を行っています。



④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木信 053-967-2511

工事概要 浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

進捗状況 軽量盛土(発泡スチロールブロック)により、連絡路の工事を行っています。上部床版コンクリートが完了し、グラウンドアンカーの施工に入ります。

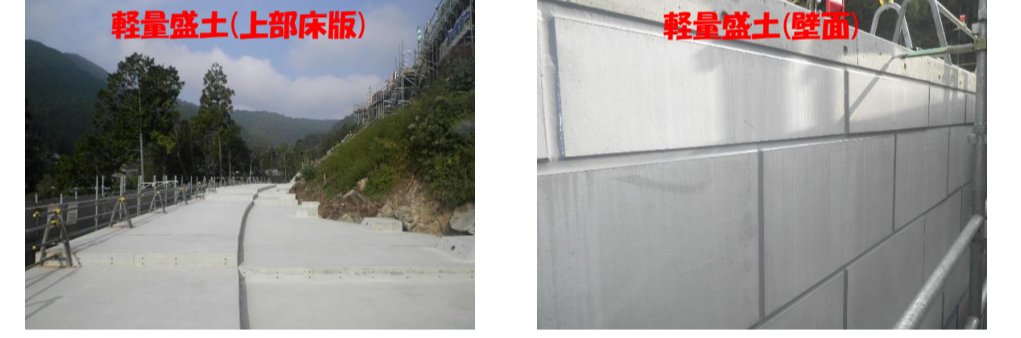

⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木克 053-967-2731

工事概要 佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

進捗状況 道路拡幅のため、法面の掘削作業を行っています。急斜面での作業のため、専用のロッククライムマシンにて作業を行っています。



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
↓↓↓↓↓

三遠南進自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!
【URL】
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。
ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>
