

再 評 価 に 係 る 資 料
【道路事業】


令和 6 年 1 0 月 9 日

国土交通省中部地方整備局

目 次

1. 事業再評価対象事業位置図	1
2. 事業再評価を実施する事業の一覧表（道路事業）	2
3. 費用対効果分析判定表	3
4. 事業再評価対象事業再評価結果原案、B／Cバックデータ	
○近畿自動車道紀勢線 一体評価	5
○一般国道42号 熊野道路	26
○一般国道42号 紀宝熊野道路	51

事業評価対象箇所(第2回委員会審議対象)

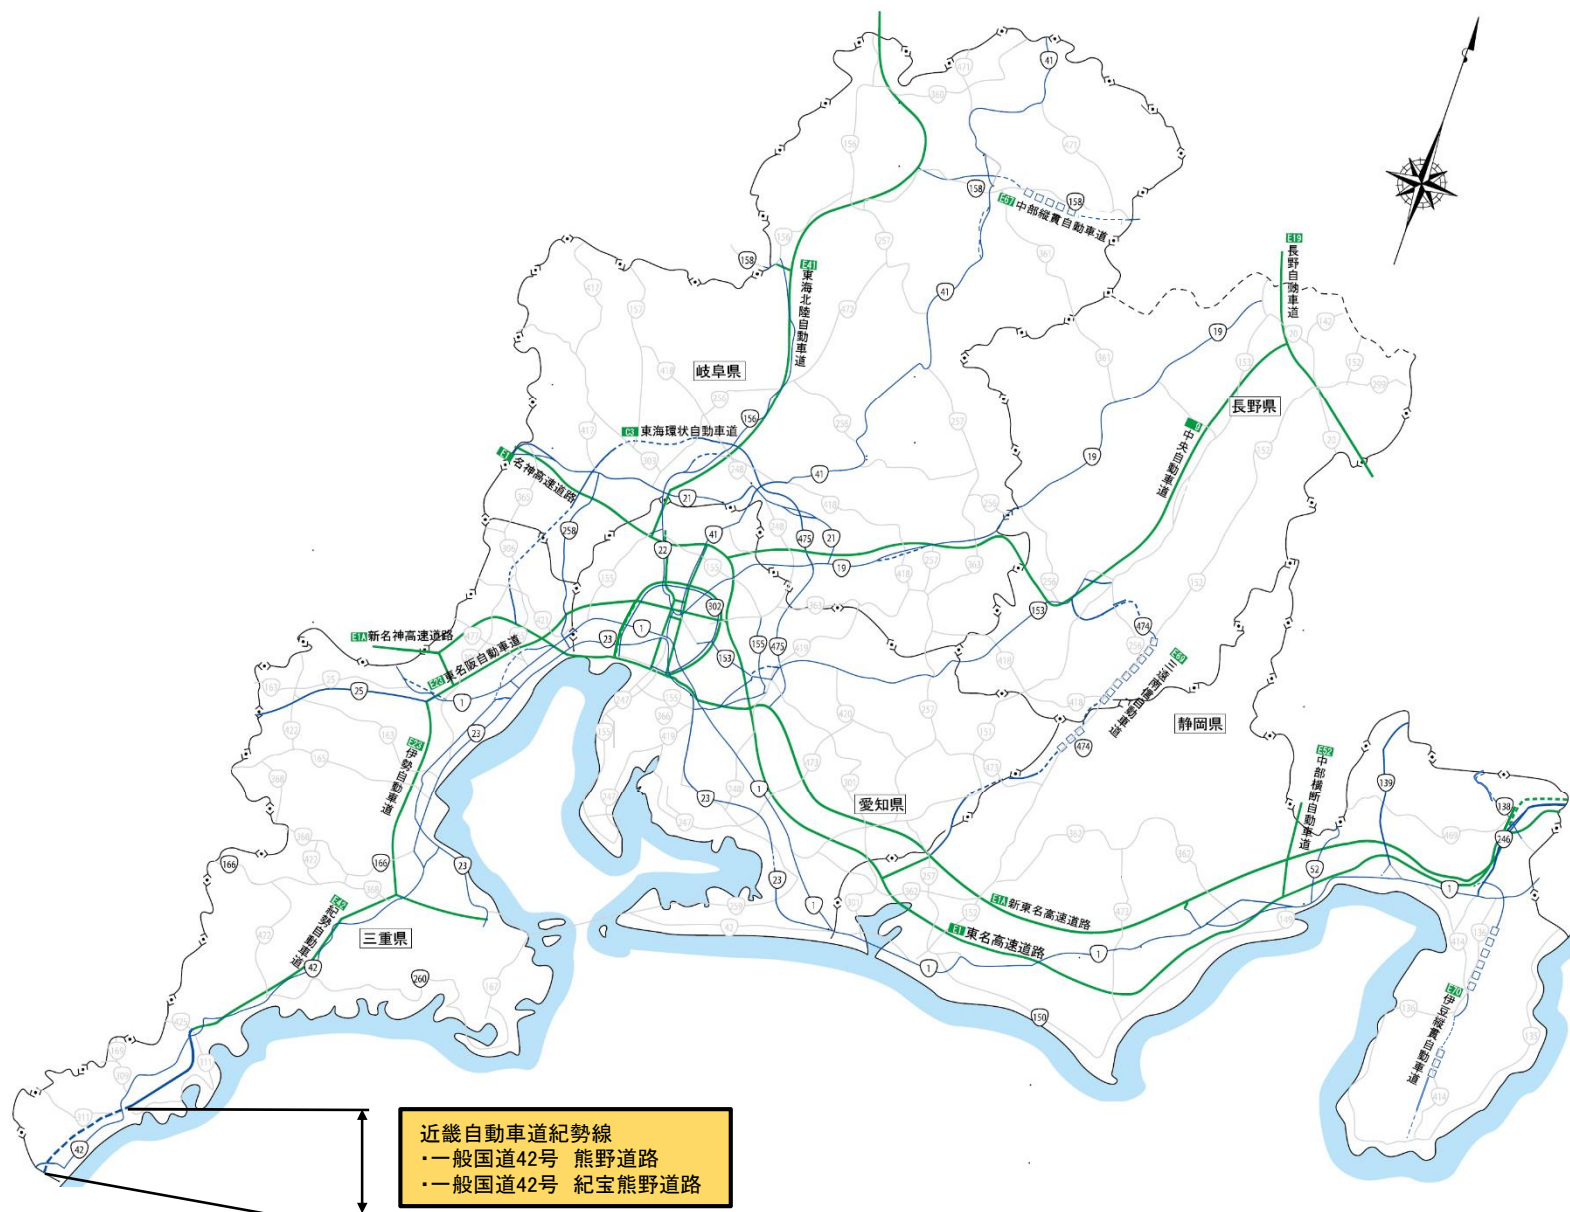

事業再評価を実施する事業の一覧表(道路事業)

中部地方整備局

整理 番号	事業 種別 ※1	該当 項目 ※2	都道府 県名	路線 番号	箇 所 名	事業 延長 (km)	事業化 年度	都市計画 決定又は 変更年度	用地 着手 年度	工事 着手 年度	供用済 み延長 (km)	全体 事業費 (億円)	事業 進捗率 (%)	事業を巡る社会情勢等の変化	事業の状況及び今後の見通し	B／C	対応方針 (原案)	備 考	
1	高	⑤	三重県	42	一般国道42号 熊野道路	一般国道42号熊野道路は、三重県熊野市大泊町から熊野市久生屋町に至る延長6.7kmの自動車専用道路で、近畿自動車道紀勢線と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 並行する一般国道42号では、南海トラフ巨大地震等の大規模地震における緊急輸送道路の確保、高次救急医療機関へのアクセス等に課題があり、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援等を目的に整備を進めている。	6.7	H26	-	H28	R1	0.0	438	約53	・高速道路ネットワークの整備により、愛知県や関東方面からの観光客が増加。 ・平成28年度は、「熊野トレイルランニングレース」が世界選手権代表選考大会に指定されたことで東海・近畿地域からの参加者が増加傾向。 ・また、平成31年度には紀勢線が全線事業化。	・平成26年度より事業着手しており、早期開通に向けて用地買収および工事を推進。	【一体】 事業全体 (6.2) 残事業 (2.6) 【個別】 事業全体 (0.7) 残事業 (1.5)	事業継続	
2	高	⑤	三重県	42	一般国道42号 紀宝熊野道路	一般国道42号紀宝熊野道路は、熊野市久生屋町から南牟婁郡紀宝町神内に至る延長15.6kmの自動車専用道路で、近畿自動車道紀勢線と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 並行する一般国道42号では、南海トラフ巨大地震等の大規模地震における緊急輸送道路の確保、高次救急医療機関へのアクセス等に課題があり、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援等を目的に整備を進めている。	15.6	H31	-	R2	未着手	0.0	849	約4	・高速道路ネットワークの整備により、愛知県や関東方面からの観光客が増加。 ・また、平成31年度には紀勢線が全線事業化。	・平成31年度より事業着手しており、早期開通に向けて調査設計及び用地買収を推進。	【一体】 事業全体 (6.2) 残事業 (2.6) 【個別】 事業全体 (0.7) 残事業 (0.8)	事業継続	

※1. (事業種別) 高規格・高規格・地域高規格・地高 一般1次改築・1次 一般2次改築・2次
 ※2. (再評価該当項目)
 ①事業採択後3年間を経過した時点で未着工の事業
 ②事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業
 ③準備・計画段階で3年間が経過している事業
 ④再評価実施後5年間が経過している事業
 ⑤社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
 ※印は国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の改定による期間

再評価の重点化・効率化判定票(道路・街路事業)

年度: 令和6年度 事業名: 一般国道42号 熊野道路

担当課: 道路計画課 担当課長名: 紫田 康晴

項目	判定		
	判断根拠	チェック欄	
事業を巡る社会経済情勢等の変化			
事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない	変化なし	■	
前回評価からの事業費・事業期間の増加			
		増加無し	10%以内増加
事業費の増加	事業費の増加は10%以上(前回350億円→今回438億円 約25%増加)	☐	☐
事業期間の増加	事業期間の増加は10%以上(前回14年→今回18年 約29%増加)	☐	☐
前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等			
費用便益分析マニュアルに変更がない	変更がある (前回:費用便益分析マニュアル(平成30年2月)→今回:費用便益分析マニュアル(令和5年12月))	☐	
需要量の変化(需要量等の減少が10%以内)	需要量の減少が10%以上 (前回:57,657TE/日→今回:37,022TE/日 約35.8%減少)	☐	
周辺ネットワークで新規事業化がない	紀勢自動車道勢和多気JCT～大宮大台IC4車線化が事業化	☐	
下記のうち、一方もしくは両方を満たしている ・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい ・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている	前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を下回っている。 (事業全体) 交通量 B/C=0.9 事業費 B/C=0.9 事業期間 B/C=0.9 (残事業) 交通量 B/C=1.1 事業費 B/C=1.1 事業期間 B/C=1.1	■	
前回評価で資料の作成を省略していない		■	
前回評価で費用対効果分析を省略していない		■	
その他の事由(重点的な評価が必要な特別な事由)	—		—
以上より、審議区分 : 重点 資料 : 作成 費用対効果分析 : 実施 とする。			

再評価の重点化・効率化判定票(道路・街路事業)

年度:	令和6年度	事業名:	一般国道42号 紀宝熊野道路
担当課:	道路計画課	担当課長名:	紫田 康晴

項目	判定		
	判断根拠	チェック欄	
事業を巡る社会経済情勢等の変化			
事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない	変化なし	■	
前回評価からの事業費・事業期間の増加			
事業費の増加	事業費の増加は10%以内（前回849億円→今回849億円 増加なし）	■	□
事業期間の増加	事業期間の増加は10%以上（前回16年→今回16年 増加なし）	■	□
前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等			
費用便益分析マニュアルに変更がない	変更がある （前回：費用便益分析マニュアル（平成30年2月）→今回：費用便益分析マニュアル（令和5年12月）	□	
需要量の変化（需要量等の減少が10%以内）	需要量の減少が10%以上 （前回：125,591TE/日→今回：90,792TE/日 約27.7%減少）	□	
周辺ネットワークで新規事業化がない	紀勢自動車道勢和多気JCT～大宮大台IC4車線化が事業化	□	
下記のうち、一方もしくは両方を満たしている ・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい ・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている	前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を下回っている。 （事業全体） 交通量 B/C=0.9 事業費 B/C=0.9 事業期間 B/C=0.9 （残事業） 交通量 B/C=0.9 事業費 B/C=0.9 事業期間 B/C=0.9	■	
前回評価で資料の作成を省略していない			■
前回評価で費用対効果分析を省略していない			■
その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由）	一体評価する熊野道路が、重点審議、資料作成、費用対効果分析実施のため。		—
以上より、審議区分：重点 資料：作成 費用対効果分析：実施 とする。			

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
近畿自動車道紀勢線	松原JCT ～勢和多気JCT	L＝328.9km	高規格道路	ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
18,400	2・4	中部地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和6年度			
単純合計	19,990億円	10,367億円	5,215億円	35,572億円
うち残事業分	3,058億円	1,295億円	40億円	4,392億円
基準年における 現在価値（C）	46,191億円	9,006億円	2,672億円	57,869億円
うち残事業分	2,639億円	436億円	3.9億円	3,079億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和6年度			
供 用 年	昭和50年度、平成元年度、平成2年度、平成4年度、平成6年度、平成7年度、平成8年度、平成16年度、平成18年度、平成20年度、平成21年度、平成24年度、平成25年度、平成26年度、平成28年度、令和4年度、令和7年度、令和10年度、令和11年度、令和12年度、令和13年度、令和14年度、令和17年度			
単年便益 (初年便益)	282億円	23億円	3.8億円	309億円
基準年における 現在価値（B）	323,196億円	29,582億円	4,664億円	357,443億円
うち残事業分	7,404億円	534億円	100億円	8,037億円

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。

③ 結 果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	6.2 〔4%〕	[参考] 6.9 〔2%〕	[参考] 7.5 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	299,574億円 〔4%〕	[参考] 349,436億円 〔2%〕	[参考] 391,975億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	27.3%		

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	2.6 〔4%〕	[参考] 3.7 〔2%〕	[参考] 4.5 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	4,958億円 〔4%〕	[参考] 9,618億円 〔2%〕	[参考] 13,571億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	11.5%		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	18,400台/日	±10%	5.6～6.8
事業費	19,990億円	±10%	6.2～6.2
事業期間	67年	±20%	6.2～6.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	18,400台/日	±10%	2.3～2.9
事業費	3,058億円	±10%	2.4～2.9
事業期間	10年	±20%	2.5～2.9

交通状況の変化

様式－3①

事業名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT（事業全体）

（推計時点 令和22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)		
①新設・改築道路 [近畿自動車道紀勢 線 松原JCT ～勢和多気 JCT] (328. 9km)			交通量※ ¹	[台/日]	－	18, 400
			走行時間※ ²	[分]	－	295
			走行時間費用※ ³	[億円/年]	－	1, 084. 92
②主な周 辺道路※ ⁴	一般国道42 号 (351. 0km)	交通量	[台/日]	11, 300	5, 900	
		走行時間	[分]	937	612	
		走行時間費用	[億円/年]	2, 413. 94	779. 70	
	一般国道26 号 (68. 5km)	交通量	[台/日]	52, 900	47, 300	
		走行時間	[分]	200	170	
		走行時間費用	[億円/年]	1, 838. 04	1, 492. 85	
	一般国道 170号 (新) (40. 6km)	交通量	[台/日]	29, 600	23, 800	
		走行時間	[分]	85	78	
		走行時間費用	[億円/年]	468. 90	341. 12	
③その他道路合計 (28, 845. 7km)		走行時間費用	[億円/年]	132, 174. 68	128, 476. 71	

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：29,634.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	136,895.55	132,175.31	4,720.24

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)

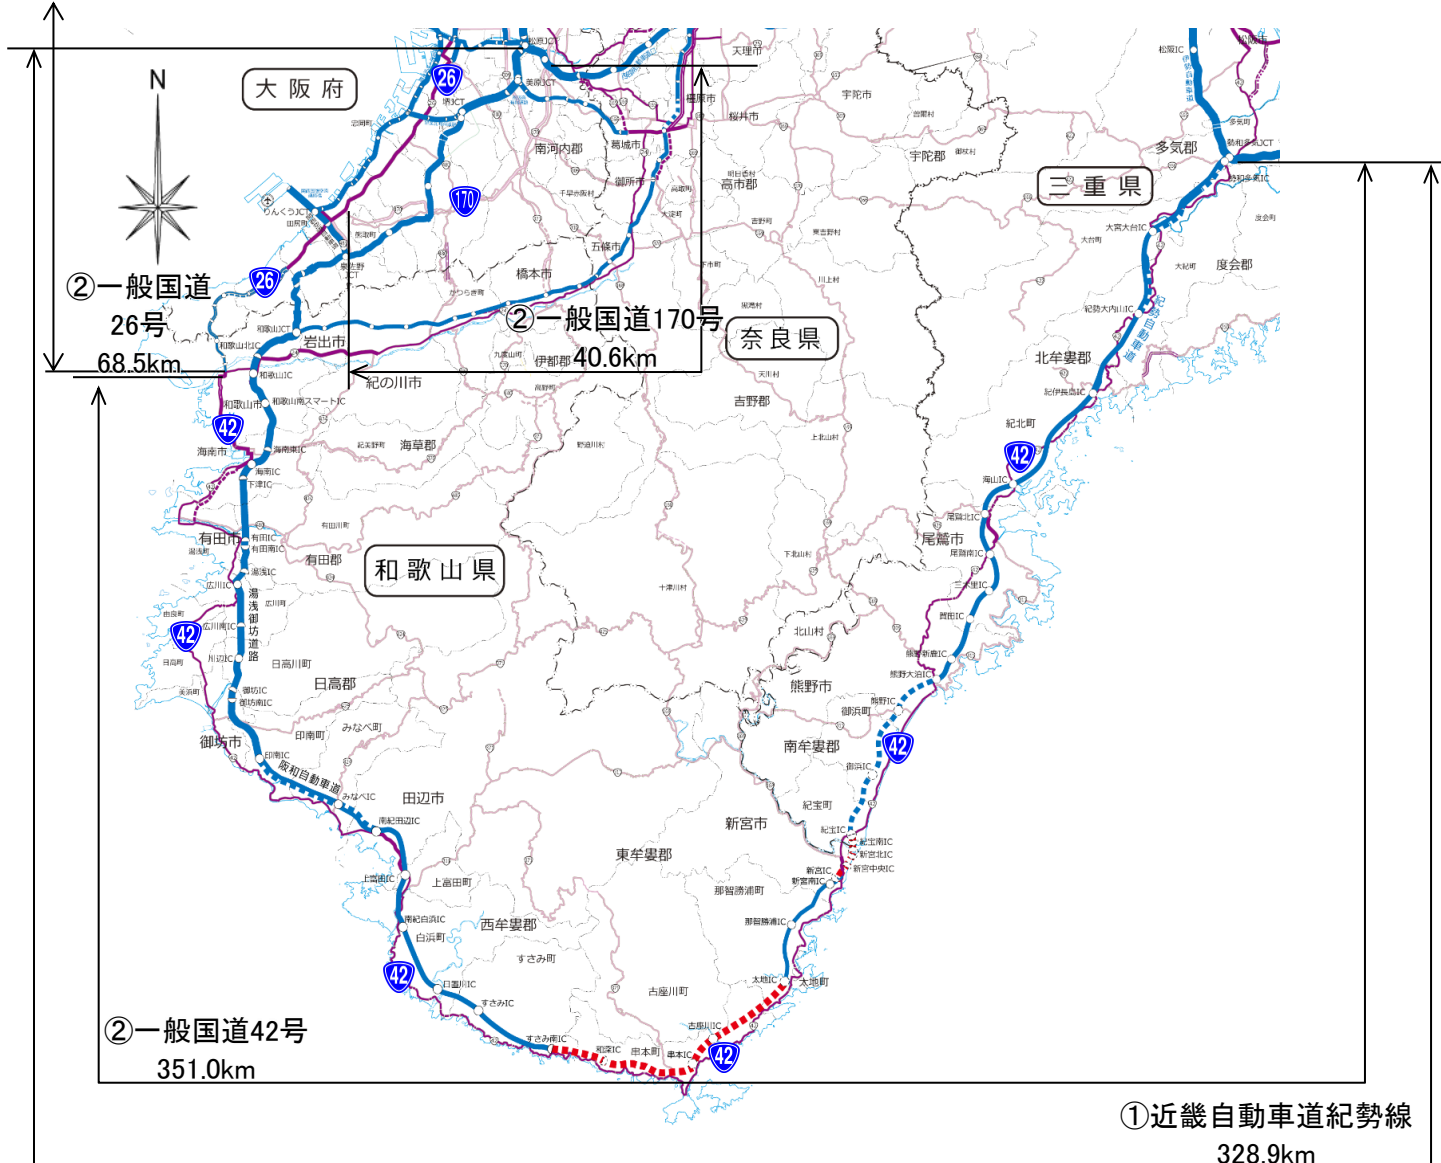

交通状況の変化

様式－3①

事業名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT（残事業）

（推計時点 令和22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)		
①新設・改築道路 [近畿自動車道紀勢 線 松原JCT ～勢和多気 JCT] (328.9km)			交通量※ ¹	[台/日]	19,900	18,400
			走行時間※ ²	[分]	270	295
			走行時間費用※ ³	[億円/年]	1,067.61	1,084.92
②主な周 辺道路※ ⁴	一般国道42 号 (351.0km)	交通量	[台/日]	7,300	5,900	
		走行時間	[分]	662	612	
		走行時間費用	[億円/年]	1,022.50	779.70	
	一般国道26 号 (68.5km)	交通量	[台/日]	47,400	47,300	
		走行時間	[分]	170	170	
		走行時間費用	[億円/年]	1,493.08	1,492.85	
	一般国道 170号(新) (40.6km)	交通量	[台/日]	23,800	23,800	
		走行時間	[分]	78	78	
		走行時間費用	[億円/年]	341.23	341.12	
③その他道路合計 (28,845.7km)		走行時間費用	[億円/年]	128,713.40	128,476.71	

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：29,634.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	132,637.82	132,175.31	462.51

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)

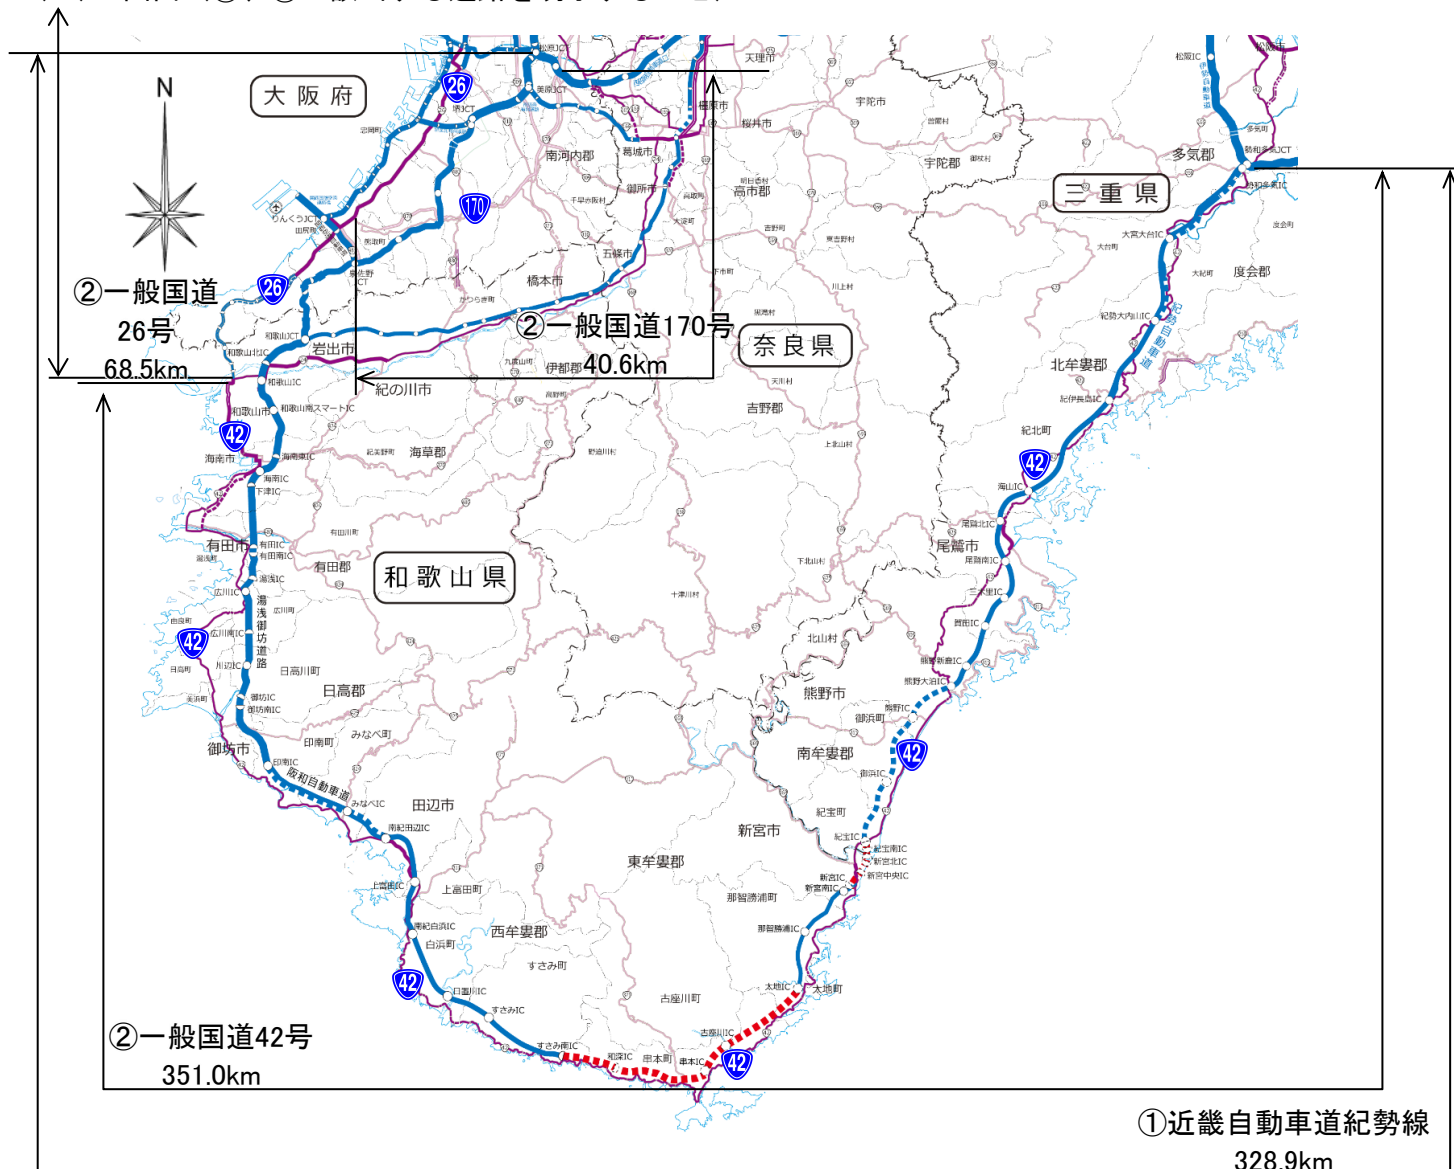

費用便益分析の条件

事業名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	☒ (R22) ☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
		開発交通量の考慮	無	☒
	有		☐	
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日
	配分交通量の推計手法		Q－V式を用いた配分	☐
		転換率式を用いた配分	☐	
		Q－V式と転換率式の併用による配分	☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	☐	
		簡易手法	☐	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
			その他()	
		簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
		その他()	☐	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	☐		
	採用理由を記載			
	最終配分の速度	☒		
	採用理由を記載	分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。		
	その他()	☐		

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☐	
		標準投資パターンを採用	☒	
		その他()	☐	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		既存の路線の実績を参考に設定		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
		更新計画、過年度の施工実績をもとに算出		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☐	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		☒
		考慮する		☐
考慮する場合のみ		事業費を考慮	☐	
		維持管理費を考慮	☐	
		当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)		
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT								単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
								0.40	328.9	133.16
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-67年目	S 43	4%	8.9922	39.8	0.31	7.20				
-66年目	S 44	4%	8.6464	42.0	5.59	118.08				
-65年目	S 45	4%	8.3138	44.9	21.63	411.52				
-64年目	S 46	4%	7.9941	47.0	105.06	1833.74				
-63年目	S 47	4%	7.6866	50.2	162.75	2558.38				
-62年目	S 48	4%	7.3910	57.8	71.33	936.25				
-61年目	S 49	4%	7.1067	69.0	50.58	535.29				
部分供用開始	S 50	4%	6.8333	72.9	7.17	68.98	8.82	84.81		
部分1年目	S 51	4%	6.5705	79.1	3.70	31.57	8.96	76.45		
部分2年目	S 52	4%	6.3178	83.8	4.65	35.98	9.08	70.27		
部分3年目	S 53	4%	6.0748	87.4	50.67	361.82	9.24	65.97		
部分4年目	S 54	4%	5.8412	89.6	82.62	552.89	9.37	62.69		
部分5年目	S 55	4%	5.6165	95.3	113.22	685.11	9.50	57.50		
部分6年目	S 56	4%	5.4005	97.8	142.30	807.40	9.66	54.81		
部分7年目	S 57	4%	5.1928	98.9	172.61	931.20	9.82	52.97		
部分8年目	S 58	4%	4.9931	99.8	286.77	1472.79	9.99	51.31		
部分9年目	S 59	4%	4.8010	101.8	154.19	746.57	13.01	63.01		
部分10年目	S 60	4%	4.6164	102.6	211.38	976.72	13.26	61.27		
部分11年目	S 61	4%	4.4388	104.4	228.70	998.91	13.52	59.07		
部分12年目	S 62	4%	4.2681	104.1	330.48	1390.89	13.84	58.25		
部分13年目	S 63	4%	4.1039	104.7	497.40	2002.26	14.67	59.07		
部分供用開始	H 1	4%	3.9461	107.5	498.55	1880.18	17.21	64.91		
部分供用開始	H 2	4%	3.7943	109.9	232.31	823.79	27.66	98.09		
部分16年目	H 3	4%	3.6484	112.5	319.99	1065.42	34.16	113.72		
部分供用開始	H 4	4%	3.5081	114.1	218.57	690.28	38.44	121.41		
部分18年目	H 5	4%	3.3731	114.4	269.08	814.73	49.56	150.06		
部分供用開始	H 6	4%	3.2434	114.3	89.21	259.98	61.10	178.06		
部分供用開始	H 7	4%	3.1187	113.7	104.91	295.52	38.45	108.32		
部分供用開始	H 8	4%	2.9987	113.2	55.19	150.15	59.96	163.12		
部分22年目	H 9	4%	2.8834	114.2	109.52	284.00	68.85	178.54		
部分23年目	H 10	4%	2.7725	113.6	233.27	584.70	68.27	171.12		
部分24年目	H 11	4%	2.6658	112.0	267.84	654.72	67.90	165.97		
部分25年目	H 12	4%	2.5633	110.7	283.54	674.28	67.76	161.13		
部分26年目	H 13	4%	2.4647	109.4	305.57	707.02	68.89	159.39		
部分27年目	H 14	4%	2.3699	107.6	302.57	684.40	66.17	149.68		
部分28年目	H 15	4%	2.2788	106.1	360.90	796.05	70.86	156.30		
部分供用開始	H 16	4%	2.1911	105.0	269.12	576.76	72.57	155.54		
部分30年目	H 17	4%	2.1068	103.7	304.21	634.72	74.44	155.31		
部分供用開始	H 18	4%	2.0258	103.0	386.48	780.66	79.99	161.57		
部分32年目	H 19	4%	1.9479	102.1	465.68	912.44	84.23	165.03		
部分供用開始	H 20	4%	1.8730	101.6	479.73	908.26	84.94	160.82		
部分供用開始	H 21	4%	1.8009	100.3	536.89	990.02	90.74	167.33		
部分35年目	H 22	4%	1.7317	98.6	531.62	958.89	94.00	169.55		
部分36年目	H 23	4%	1.6651	97.2	526.86	926.91	93.60	164.67		
部分供用開始	H 24	4%	1.6010	96.4	869.01	1482.21	96.91	165.29		
部分供用開始	H 25	4%	1.5395	96.4	607.78	996.83	101.69	166.79		
部分供用開始	H 26	4%	1.4802	98.7	500.01	770.11	108.57	167.21		
部分40年目	H 27	4%	1.4233	100.2	595.67	868.97	108.86	158.81		
部分供用開始	H 28	4%	1.3686	100.2	111.04	155.76	118.70	166.50		
部分42年目	H 29	4%	1.3159	100.5	196.30	263.97	119.09	160.14		
部分43年目	H 30	4%	1.2653	100.4	276.21	357.50	118.57	153.47		
部分44年目	R 1	4%	1.2167	101.2	487.88	602.40	120.07	148.26		
部分45年目	R 2	4%	1.1699	101.9	690.59	814.26	110.74	130.58		
部分46年目	R 3	4%	1.1249	101.8	874.37	992.27	111.98	127.08		
部分供用開始	R 4	4%	1.0816	102.7	359.17	388.48	113.08	122.31		
部分48年目	R 5	4%	1.0400	102.7	537.42	558.91	108.35	112.68		
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7	971.44	971.44	117.79	117.79	1042.75	1042.75
部分供用開始	R 7	4%	0.9615	102.7	458.12	440.48	118.20	113.65		
部分51年目	R 8	4%	0.9246	102.7	586.66	542.42	118.20	109.29		
部分52年目	R 9	4%	0.8890	102.7	686.62	610.41	118.20	105.08		
部分供用開始	R 10	4%	0.8548	102.7	411.28	351.56	122.68	104.87		
部分供用開始	R 11	4%	0.8219	102.7	353.65	290.67	123.75	101.71		
部分供用開始	R 12	4%	0.7903	102.7	164.05	129.65	124.26	98.20		
部分供用開始	R 13	4%	0.7599	102.7	123.14	93.57	124.94	94.94		
部分供用開始	R 14	4%	0.7307	102.7	103.54	75.65	126.05	92.10		
部分58年目	R 15	4%	0.7026	102.7	97.59	68.57	125.81	88.39		
部分59年目	R 16	4%	0.6756	102.7	73.62	49.74	125.36	84.69	172.34	116.43
供用開始年次	R 17	4%	0.6496	102.7			129.87	84.37		
1年目	R 18	4%	0.6246	102.7			130.07	81.24		
2年目	R 19	4%	0.6006	102.7			129.67	77.88		
3年目	R 20	4%	0.5775	102.7			129.36	74.71	133.38	77.03
4年目	R 21	4%	0.5553	102.7			128.88	71.57	320.03	177.71
5年目	R 22	4%	0.5339	102.7			128.49	68.60	314.49	167.91
6年目	R 23	4%	0.5134	102.7			128.11	65.77	952.47	489.00
7年目	R 24	4%	0.4936	102.7			127.70	63.03		
8年目	R 25	4%	0.4746	102.7			127.39	60.46	156.33	74.19
9年目	R 26	4%	0.4564	102.7			126.90	57.92	180.03	82.16
10年目	R 27	4%	0.4388	102.7			126.51	55.51		
11年目	R 28	4%	0.4220	102.7			126.12	53.22	117.66	49.65
12年目	R 29	4%	0.4057	102.7			125.72	51.01		
13年目	R 30	4%	0.3901	102.7			125.41	48.92		
14年目	R 31	4%	0.3751	102.7			124.91	46.85		
15年目	R 32	4%	0.3607	102.7			124.51	44.91		
16年目	R 33	4%	0.3468	102.7			124.13	43.05		
17年目	R 34	4%	0.3335	102.7			123.83	41.30		
18年目	R 35	4%	0.3207	102.7			123.36	39.56	197.00	63.18
19年目	R 36	4%	0.3083	102.7			122.96	37.91		
20年目	R 37	4%	0.2965	102.7			122.58	36.34		
21年目	R 38	4%	0.2851	102.7			122.19	34.84		
22年目	R 39	4%	0.2741	102.7			121.90	33.41	96.49	26.45
23年目	R 40	4%	0.2636	102.7			121.42	32.01	157.85	41.61
24年目	R 41	4%	0.2534	102.7			121.04	30.67	50.10	12.69
25年目	R 42	4%	0.2437	102.7			120.65	29.40	141.14	34.39
26年目	R 43	4%	0.2343	102.7			120.27	28.18	50.10	11.74
27年目	R 44	4%	0.2253	102.7			119.96	27.03	50.10	11.29
28年目	R 45	4%	0.2166	102.7			119.50	25.88	65.43	14.17
29年目	R 46	4%	0.2083	102.7			119.11	24.81	77.31	16.10
30年目	R 47	4%	0.2003	102.7			118.73	23.78	77.92	15.61
31年目	R 48	4%	0.1926	102.7			118.34	22.79	444.82	85.67
32年目	R 49	4%	0.1852	102.7			118.04	21.86	95.44	17.68
33年目	R 50	4%	0.1780	102.7			117.57	20.93	58.85	10.48
34年目	R 51	4%	0.1712	102.7			117.19	20.06	2.53	0.43
35年目	R 52	4%	0.1646	102.7			116.80	19.23		
36年目	R 53	4%	0.1583	102.7						

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)
注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名 : 近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT							単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
							0.24		108.3		25.82	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)			
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値		
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7								
部分供用開始	R 7	4%	0.9615	102.7	458.12	440.48	5.21	5.01				
部分1年目	R 8	4%	0.9246	102.7	586.66	542.42	5.21	4.82				
部分2年目	R 9	4%	0.8890	102.7	686.62	610.41	5.21	4.63				
部分供用開始	R 10	4%	0.8548	102.7	411.28	351.56	9.62	8.22				
部分供用開始	R 11	4%	0.8219	102.7	353.65	290.67	10.79	8.87				
部分供用開始	R 12	4%	0.7903	102.7	164.05	129.65	11.15	8.82				
部分供用開始	R 13	4%	0.7599	102.7	123.14	93.57	17.40	13.22				
部分供用開始	R 14	4%	0.7307	102.7	103.54	75.65	18.77	13.72				
部分8年目	R 15	4%	0.7026	102.7	97.59	68.57	18.74	13.17				
部分9年目	R 16	4%	0.6756	102.7	73.62	49.74	18.72	12.65				
供用開始年次	R 17	4%	0.6496	102.7			23.57	15.31				
1年目	R 18	4%	0.6246	102.7			24.08	15.04				
2年目	R 19	4%	0.6006	102.7			24.06	14.45				
3年目	R 20	4%	0.5775	102.7			24.03	13.88				
4年目	R 21	4%	0.5553	102.7			24.01	13.33				
5年目	R 22	4%	0.5339	102.7			23.98	12.80				
6年目	R 23	4%	0.5134	102.7			23.96	12.30				
7年目	R 24	4%	0.4936	102.7			23.93	11.81				
8年目	R 25	4%	0.4746	102.7			23.90	11.34				
9年目	R 26	4%	0.4564	102.7			23.88	10.90				
10年目	R 27	4%	0.4388	102.7			23.85	10.47				
11年目	R 28	4%	0.4220	102.7			23.83	10.05				
12年目	R 29	4%	0.4057	102.7			23.80	9.66				
13年目	R 30	4%	0.3901	102.7			23.77	9.27				
14年目	R 31	4%	0.3751	102.7			23.75	8.91				
15年目	R 32	4%	0.3607	102.7			23.72	8.56				
16年目	R 33	4%	0.3468	102.7			23.70	8.22				
17年目	R 34	4%	0.3335	102.7			23.67	7.89				
18年目	R 35	4%	0.3207	102.7			23.65	7.58				
19年目	R 36	4%	0.3083	102.7			23.62	7.28				
20年目	R 37	4%	0.2965	102.7			23.60	7.00				
21年目	R 38	4%	0.2851	102.7			23.57	6.72				
22年目	R 39	4%	0.2741	102.7			23.55	6.45				
23年目	R 40	4%	0.2636	102.7			23.52	6.20				
24年目	R 41	4%	0.2534	102.7			23.50	5.95				
25年目	R 42	4%	0.2437	102.7			23.47	5.72				
26年目	R 43	4%	0.2343	102.7			23.45	5.49				
27年目	R 44	4%	0.2253	102.7			23.42	5.28				
28年目	R 45	4%	0.2166	102.7			23.40	5.07				
29年目	R 46	4%	0.2083	102.7			23.37	4.87				
30年目	R 47	4%	0.2003	102.7			23.35	4.68				
31年目	R 48	4%	0.1926	102.7			23.32	4.49				
32年目	R 49	4%	0.1852	102.7			23.30	4.31				
33年目	R 50	4%	0.1780	102.7			23.27	4.14				
34年目	R 51	4%	0.1712	102.7			23.25	3.98				
35年目	R 52	4%	0.1646	102.7			23.22	3.82				
36年目	R 53	4%	0.1583	102.7			23.20	3.67				
37年目	R 54	4%	0.1522	102.7			23.17	3.53				
38年目	R 55	4%	0.1463	102.7			23.15	3.39				
39年目	R 56	4%	0.1407	102.7			23.12	3.25				
40年目	R 57	4%	0.1353	102.7			23.10	3.12				
41年目	R 58	4%	0.1301	102.7			23.07	3.00				
42年目	R 59	4%	0.1251	102.7			23.05	2.88				
43年目	R 60	4%	0.1203	102.7			23.02	2.77				
44年目	R 61	4%	0.1157	102.7			23.00	2.66				
45年目	R 62	4%	0.1112	102.7			22.97	2.55				
46年目	R 63	4%	0.1069	102.7			22.95	2.45				
47年目	R 64	4%	0.1028	102.7			22.92	2.36	13.20	1.36		
48年目	R 65	4%	0.0989	102.7			22.90	2.26	13.20	1.31		
49年目	R 66	4%	0.0951	102.7			22.87	2.18	13.20	1.26		
合 計					2913.41	2638.94	1294.58	436.42	39.60	3.93		
単純事業費計					3058.26		1,294.58		39.60			

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

様式-5

年次	年度 (基準年) R 6	総走行台+Rの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)				社会的 割引率	割引率 デフレータ	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)				事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)			
		乗用車類	普通貨物	小型貨物	全 車			① 計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 (2)×(A)	③	現在価値 (1+2)×(A)	便益合計 (①+③)	現在価値				
部分供用開始	S 50	1.05999	1.09710	1.08349	1.06983	4%	6.8333	72.9	154.07	39.20	88.67	281.93	2,712.50	13.61	4.31	5.20	23.13	222.51	3.80	36.57	308.86	2,971.58
部分1年目	S 51	1.05659	1.08851	1.07706	1.06527	4%	6.5705	79.1	163.31	43.00	96.07	302.38	2,580.34	14.43	4.73	5.64	24.80	211.60	4.07	34.70	331.24	2,826.64
部分2年目	S 52	1.05356	1.08131	1.07154	1.06127	4%	6.3178	83.8	172.55	46.81	103.48	322.83	2,498.15	15.25	5.15	6.07	26.47	204.80	4.33	33.52	353.63	2,736.47
部分3年目	S 53	1.05084	1.07520	1.06677	1.05773	4%	6.0748	87.4	181.79	50.61	110.88	343.28	2,451.27	16.06	5.57	6.51	28.14	200.91	4.60	32.83	376.02	2,685.01
部分4年目	S 54	1.04838	1.06894	1.06259	1.05458	4%	5.8412	89.6	191.03	54.42	118.28	363.73	2,434.12	16.88	5.99	6.94	29.81	199.46	4.86	32.54	398.40	2,666.12
部分5年目	S 55	1.01911	1.00944	1.04650	1.02558	4%	5.6165	95.3	200.28	58.23	125.68	384.19	2,324.76	17.70	6.40	7.38	31.48	190.46	5.13	31.03	420.79	2,546.25
部分6年目	S 56	1.03192	1.02144	1.04515	1.03450	4%	5.4005	97.8	204.10	58.77	131.53	394.41	2,237.85	18.03	6.46	7.72	32.22	182.80	5.26	29.64	421.98	2,450.49
部分7年目	S 57	1.01223	1.04438	1.05717	1.02838	4%	5.1928	98.9	210.62	60.03	137.47	408.12	2,201.75	18.61	6.60	8.07	33.28	179.54	5.44	29.35	446.84	2,410.64
部分8年目	S 58	1.01819	1.05867	1.04396	1.03007	4%	4.9931	99.8	213.20	62.70	145.33	421.22	2,163.30	18.84	6.90	8.53	34.26	175.96	5.60	28.74	461.08	2,368.00
部分9年目	S 59	1.03501	1.04879	1.05902	1.04362	4%	4.8010	101.8	217.07	66.38	151.71	435.17	2,107.03	19.18	7.30	8.90	35.38	171.32	5.76	27.91	476.31	2,306.26
部分10年目	S 60	1.03074	1.06110	1.06140	1.04331	4%	4.6164	102.6	224.67	69.62	160.67	454.96	2,102.21	19.85	7.66	9.43	36.94	170.67	6.01	27.79	497.91	2,300.67
部分11年目	S 61	1.03015	1.07318	1.07482	1.04864	4%	4.4388	104.4	231.58	73.87	170.53	475.98	2,078.98	20.46	8.12	10.01	38.59	168.57	6.28	27.41	520.85	2,274.96
部分12年目	S 62	1.04269	1.08593	1.05056	1.05017	4%	4.2681	104.1	238.56	79.28	183.29	501.13	2,109.10	21.08	8.72	10.76	40.55	170.68	6.58	27.70	548.27	2,307.48
部分13年目	S 63	1.06084	1.06255	1.00366	1.04319	4%	4.1039	104.7	248.75	86.09	192.56	527.39	2,123.00	21.98	9.47	11.30	42.75	172.07	6.91	27.82	577.05	2,322.89
部分供用開始	H 1	1.07018	1.05184	0.99939	1.04666	4%	3.9461	107.5	377.74	145.47	279.32	802.53	3,026.60	35.65	16.72	17.34	69.71	262.88	12.12	45.71	884.36	3,335.19
部分供用開始	H 2	1.04152	1.05838	0.98969	1.02885	4%	3.7943	109.9	472.70	178.67	328.90	980.27	3,476.16	46.19	20.52	21.08	87.79	311.33	16.50	58.50	1,084.56	3,845.99
部分16年目	H 3	1.02876	1.04535	0.97720	1.01663	4%	3.6484	112.5	492.32	199.28	325.51	1,007.11	3,353.23	48.11	21.74	20.86	90.71	302.03	16.97	56.51	1,114.79	3,711.77
部分供用開始	H 4	1.00496	1.02024	0.95419	0.99349	4%	3.5081	114.1	731.28	320.11	416.98	1,468.37	4,637.35	71.36	37.91	26.12	135.39	427.58	25.72	81.23	1,629.47	5,146.16
部分18年目	H 5	1.01268	1.02721	0.96103	1.00146	4%	3.3731	114.4	734.91	326.58	397.88	1,459.37	4,418.77	71.72	38.67	24.92	135.31	409.71	25.55	77.37	1,620.24	4,905.85
部分供用開始	H 6	1.03435	1.02456	0.99078	1.02235	4%	3.2434	114.3	889.30	399.03	457.63	1,745.96	5,088.15	86.72	47.56	29.38	163.65	476.93	31.00	90.35	1,940.62	5,655.43
部分供用開始	H 7	1.02159	1.01217	0.97820	1.01002	4%	3.1187	113.7	951.14	418.21	468.24	1,837.59	5,176.46	91.30	49.21	29.45	169.96	478.79	32.36	91.15	2,039.91	5,746.40
部分供用開始	H 8	1.00650	0.99744	0.96335	0.99535	4%	2.9987	113.2	1,177.05	489.17	563.98	2,230.20	6,067.39	109.80	57.79	36.16	203.75	554.30	35.91	97.70	2,469.86	6,719.39
部分22年目	H 9	0.99983	0.99115	0.95863	0.98910	4%	2.8834	114.2	1,184.70	487.92	543.31	2,215.93	5,745.98	110.51	57.64	34.83	202.99	526.35	35.74	92.68	2,454.65	6,365.01
部分23年目	H 10	1.02352	1.01475	0.97870	1.01268	4%	2.7725	113.6	1,184.62	483.60	519.75	2,187.97	5,484.09	110.51	57.13	33.92	200.96	503.70	35.35	88.61	2,424.28	6,076.40
部分24年目	H 11	0.99245	1.01196	0.98719	0.99407	4%	2.6658	112.0	1,212.48	490.74	508.68	2,211.90	5,406.85	113.11	57.97	32.61	203.69	497.91	35.80	87.52	2,451.39	5,992.28
部分25年目	H 12	0.99820	1.01822	0.99266	0.99988	4%	2.5633	110.7	1,203.33	496.61	502.16	2,202.10	5,236.71	112.25	58.67	32.19	203.11	483.01	35.59	84.63	2,440.80	5,804.35
部分26年目	H 13	0.97883	0.99887	0.97314	0.98055	4%	2.4647	109.4	1,201.16	505.65	498.47	2,205.29	5,102.49	112.05	59.74	31.96	203.74	471.41	35.59	82.34	2,444.62	5,656.24
部分27年目	H 14	0.98162	1.00214	0.97564	0.98341	4%	2.3699	107.6	1,175.73	505.08	485.08	2,165.90	4,899.21	109.68	59.67	31.10	200.44	453.40	34.89	78.93	2,401.24	5,431.54
部分28年目	H 15	0.96483	0.98543	0.95866	0.96666	4%	2.2788	106.1	1,154.12	506.16	473.27	2,133.55	4,706.14	107.66	59.80	30.34	197.80	438.30	34.31	75.69	2,365.67	5,218.13
部分供用開始	H 16	0.96201	0.98302	0.95555	0.96392	4%	2.1911	105.0	1,421.76	590.22	606.97	2,618.95	6,617.68	131.54	70.34	39.38	241.26	517.04	39.14	83.88	2,899.35	6,213.60
部分30年目	H 17	1.02368	1.00586	1.02774	1.02172	4%	2.1068	103.7	1,367.75	580.19	579.99	2,527.94	5,674.50	126.54	69.14	40.63	233.32	498.81	37.73	78.72	2,798.98	5,840.03
部分32年目	H 18	1.03266	1.01544	1.03673	1.03097	4%	2.0258	103.0	1,399.67	604.32	642.42	2,642.41	5,781.94	141.12	75.80	40.82	267.15	519.42	40.02	81.61	3,159.99	6,382.57
部分32年目	H 19	1.00863	0.99215	1.01222	1.00687	4%	1.9479	102.1	1,631.88	650.21	665.73	2,947.83	5,775.82	145.98	76.97	41.49	264.44	518.12	41.65	81.61	3,253.92	6,375.55
部分供用開始	H 20	1.02992	1.01361	1.03341	1.02821	4%	1.8730	101.6	1,736.25	660.23	704.81	3,101.29	5,871.61	158.39	79.17	45.11	282.66	535.16	44.47	84.19	3,428.42	6,490.96
部分供用開始	H 21	1.02622	1.01044	1.02952	1.02458	4%	1.8009	100.3	1,872.51	707.16	753.41	3,333.08	6,146.18	169.39	84.25	47.72	301.36	555.70	46.94	86.55	3,681.38	6,788.43
部分35年目	H 22	0.98100	0.99560	0.96143	0.97913	4%	1.7317	98.6	1,921.60	714.55	775.65	3,411.80	6,153.89	173.83	85.13	49.13	308.09	555.70	48.09	86.74	3,767.98	6,796.33
部分36年目	H 23	1.00559	1.02074	0.98455	1.00361	4%	1.6651	97.2	1,885.10	711.41	745.74	3,342.24	5,880.06	170.53	84.75	47.24	302.51	532.22	47.09	82.84	3,691.84	6,495.12
部分供用開始	H 24	0.98363	0.99864	0.96203	0.98164	4%	1.6010	96.4	2,355.12	845.20	911.90	4,112.22	7,013.92	223.00	105.63	60.39	389.02	663.52	58.51	89.80	4,559.75	7,777.24
部分供用開始	H 25	0.97481	0.99388	0.95230	0.97277	4%	1.5395	96.4	2,357.78	863.90	886.78	4,108.46	6,738.33	224.09	108.90	59.01	392.00	642.93	58.77	96.39	4,559.23	7,477.65
部分40年目	H 26	0.98640	1.00184	0.96241	0.98427	4%	1.4902	98.7	2,361.89	886.22	865.09											

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名： 近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率				社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
	(基準年)	(近畿臨海ブロック)							乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
	R 6	乗用車類	普通貨物	小型貨物	全 車																	
部分供用開始	R 7	0.99857	1.00513	0.98275	0.99714	4%	0.9615	102.7	18.91	8.63	4.60	32.14	30.90	2.45	0.81	1.02	4.28	4.00	1.30	1.25	37.72	36.15
部分1年目	R 8	0.99857	1.00511	0.98245	0.99713	4%	0.9246	102.7	18.89	8.67	4.52	32.08	29.66	2.45	0.82	1.00	4.27	4.00	1.30	1.20	37.64	34.86
部分2年目	R 9	0.99856	1.00508	0.98214	0.99712	4%	0.8890	102.7	18.86	8.71	4.44	32.01	28.46	2.45	0.82	0.98	4.25	4.00	1.30	1.15	37.56	33.61
部分供用開始	R 10	0.99856	1.00506	0.98181	0.99711	4%	0.8548	102.7	41.21	14.76	8.44	64.41	55.06	5.94	1.65	1.32	8.91	8.00	2.45	2.10	75.76	65.16
部分供用開始	R 11	0.99856	1.00503	0.98147	0.99710	4%	0.8219	102.7	47.19	15.70	9.95	72.84	59.87	7.02	1.77	1.41	10.20	8.00	2.80	2.30	85.85	70.17
部分供用開始	R 12	0.99599	1.00372	0.98948	0.99639	4%	0.7903	102.7	54.02	18.91	10.85	83.77	66.20	7.14	1.71	1.38	10.23	8.00	2.85	2.25	96.85	76.45
部分供用開始	R 13	0.99597	1.00370	0.98937	0.99637	4%	0.7599	102.7	188.26	70.33	47.68	306.27	232.74	14.66	5.81	2.59	23.05	18.00	4.22	3.21	333.55	253.95
部分供用開始	R 14	0.99596	1.00369	0.98926	0.99636	4%	0.7307	102.7	208.51	79.81	52.63	340.94	249.13	15.67	6.34	2.69	24.70	18.00	4.39	3.21	370.04	270.34
部分8年目	R 15	0.99594	1.00368	0.98914	0.99635	4%	0.7026	102.7	207.67	80.10	52.06	339.83	238.76	15.61	6.36	2.66	24.63	17.00	4.37	3.07	368.84	258.83
部分9年目	R 16	0.99592	1.00366	0.98902	0.99633	4%	0.6756	102.7	206.83	80.40	51.49	338.72	228.84	15.55	6.39	2.63	24.56	17.00	4.36	2.94	367.64	248.78
供用開始年次	R 17	0.99591	1.00365	0.98890	0.99632	4%	0.6496	102.7	291.96	111.04	67.19	470.19	305.44	20.82	8.52	3.11	32.45	21.00	5.88	3.82	508.51	330.26
1年目	R 18	0.99589	1.00364	0.98877	0.99631	4%	0.6246	102.7	290.76	111.45	66.45	468.65	292.72	20.74	8.55	3.07	32.36	20.00	5.85	3.66	506.87	316.38
2年目	R 19	0.99587	1.00362	0.98865	0.99629	4%	0.6006	102.7	289.57	111.85	65.70	467.12	280.55	20.65	8.58	3.04	32.27	19.00	5.83	3.50	505.22	303.05
3年目	R 20	0.99586	1.00361	0.98852	0.99628	4%	0.5775	102.7	288.37	112.26	64.95	465.58	268.87	20.57	8.61	3.00	32.18	19.00	5.81	3.36	503.58	291.23
4年目	R 21	0.99584	1.00360	0.98838	0.99626	4%	0.5553	102.7	287.18	112.66	64.21	464.05	257.69	20.48	8.64	2.97	32.09	18.00	5.79	3.21	501.93	278.90
5年目	R 22	0.99119	0.99987	0.99243	0.99329	4%	0.5339	102.7	285.98	113.07	63.46	462.51	246.93	20.40	8.67	2.93	32.01	17.00	5.77	3.08	500.28	267.01
6年目	R 23	0.99112	0.99987	0.99237	0.99325	4%	0.5134	102.7	283.46	113.05	62.98	459.50	235.91	20.22	8.67	2.91	31.80	16.00	5.73	2.94	497.03	254.85
7年目	R 24	0.99104	0.99987	0.99231	0.99320	4%	0.4936	102.7	280.94	113.04	62.50	456.48	225.32	20.04	8.67	2.89	31.60	16.00	5.69	2.81	493.77	244.13
8年目	R 25	0.99095	0.99987	0.99225	0.99315	4%	0.4746	102.7	278.43	113.02	62.02	453.47	215.22	19.86	8.67	2.87	31.40	15.00	5.65	2.68	490.52	232.90
9年目	R 26	0.99087	0.99987	0.99219	0.99311	4%	0.4564	102.7	275.91	113.01	61.54	450.45	205.59	19.68	8.67	2.85	31.19	14.00	5.61	2.56	487.26	222.15
10年目	R 27	0.99079	0.99987	0.99213	0.99306	4%	0.4388	102.7	273.39	112.99	61.06	447.44	196.34	19.50	8.67	2.82	30.99	14.00	5.57	2.45	484.01	212.79
11年目	R 28	0.99070	0.99987	0.99207	0.99301	4%	0.4220	102.7	270.87	112.98	60.58	444.43	187.55	19.32	8.67	2.80	30.79	13.00	5.54	2.34	480.75	202.89
12年目	R 29	0.99062	0.99987	0.99200	0.99296	4%	0.4057	102.7	268.35	112.96	60.10	441.41	179.08	19.14	8.67	2.78	30.58	12.00	5.50	2.23	477.49	193.31
13年目	R 30	0.99053	0.99987	0.99194	0.99291	4%	0.3901	102.7	265.83	112.95	59.62	438.40	171.02	18.96	8.67	2.76	30.38	12.00	5.46	2.13	474.24	185.15
14年目	R 31	0.99044	0.99987	0.99187	0.99286	4%	0.3751	102.7	263.32	112.93	59.14	435.38	163.31	18.78	8.66	2.73	30.18	11.00	5.42	2.03	470.98	176.34
15年目	R 32	0.99034	0.99987	0.99181	0.99281	4%	0.3607	102.7	260.80	112.92	58.66	432.37	155.96	18.60	8.66	2.71	29.98	11.00	5.38	1.94	467.73	168.90
16年目	R 33	0.99025	0.99987	0.99174	0.99276	4%	0.3468	102.7	258.28	112.90	58.18	429.36	148.90	18.42	8.66	2.69	29.77	10.00	5.34	1.85	464.47	160.75
17年目	R 34	0.99015	0.99987	0.99167	0.99271	4%	0.3335	102.7	255.76	112.89	57.69	426.34	142.19	18.24	8.66	2.67	29.57	10.00	5.30	1.77	461.22	153.96
18年目	R 35	0.99006	0.99987	0.99160	0.99265	4%	0.3207	102.7	253.24	112.87	57.21	423.33	135.76	18.06	8.66	2.65	29.37	9.00	5.26	1.69	457.96	146.45
19年目	R 36	0.98996	0.99987	0.99153	0.99260	4%	0.3083	102.7	250.72	112.86	56.73	420.32	129.58	17.88	8.66	2.62	29.16	9.00	5.23	1.61	454.70	140.19
20年目	R 37	0.98985	0.99987	0.99146	0.99254	4%	0.2965	102.7	248.21	112.84	56.25	417.30	123.73	17.70	8.66	2.60	28.96	9.00	5.19	1.54	451.45	134.27
21年目	R 38	0.98975	0.99987	0.99138	0.99249	4%	0.2851	102.7	245.69	112.83	55.77	414.29	118.11	17.52	8.66	2.58	28.76	8.00	5.15	1.47	448.19	127.58
22年目	R 39	0.98964	0.99987	0.99131	0.99243	4%	0.2741	102.7	243.17	112.81	55.29	411.27	112.73	17.34	8.66	2.56	28.56	8.00	5.11	1.40	444.94	122.13
23年目	R 40	0.98953	0.99987	0.99123	0.99237	4%	0.2636	102.7	240.65	112.80	54.81	408.26	107.62	17.16	8.65	2.53	28.35	7.00	5.07	1.34	441.68	115.96
24年目	R 41	0.98942	0.99987	0.99115	0.99231	4%	0.2534	102.7	238.13	112.78	54.33	405.25	102.69	16.98	8.65	2.51	28.15	7.00	5.03	1.28	438.43	110.97
25年目	R 42	0.98932	0.99987	0.99108	0.99226	4																

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT							維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
							単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
							0.40		328.9		133.16	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)			
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価		
-67年目	S 43	4%	8.8180	39.8	0.31	7.06						
-66年目	S 44	4%	8.4788	42.0	5.59	115.79						
-65年目	S 45	4%	8.1527	44.9	21.63	403.55						
-64年目	S 46	4%	7.8391	47.0	105.06	1798.19						
-63年目	S 47	4%	7.5376	50.2	162.75	2508.79						
-62年目	S 48	4%	7.2477	57.8	71.33	918.09						
-61年目	S 49	4%	6.9689	69.0	50.58	524.91						
部分供用開始	S 50	4%	6.7009	72.9	7.17	67.65	8.82	83.17				
部分1年目	S 51	4%	6.4432	79.1	3.70	30.96	8.96	74.97				
部分2年目	S 52	4%	6.1954	83.8	4.65	35.29	9.08	68.91				
部分3年目	S 53	4%	5.9571	87.4	50.67	354.81	9.24	64.69				
部分4年目	S 54	4%	5.7280	89.6	82.62	542.18	9.37	61.47				
部分5年目	S 55	4%	5.5077	95.3	113.22	671.84	9.50	56.39				
部分6年目	S 56	4%	5.2959	97.8	142.30	791.76	9.66	53.75				
部分7年目	S 57	4%	5.0922	98.9	172.61	913.16	9.82	51.95				
部分8年目	S 58	4%	4.8963	99.8	286.77	1444.23	9.99	50.31				
部分9年目	S 59	4%	4.7080	101.8	154.19	732.11	13.01	61.79				
部分10年目	S 60	4%	4.5269	102.6	211.38	957.78	13.26	60.08				
部分11年目	S 61	4%	4.3528	104.4	228.70	979.55	13.52	57.92				
部分12年目	S 62	4%	4.1854	104.1	330.48	1363.94	13.84	57.12				
部分13年目	S 63	4%	4.0244	104.7	497.40	1963.47	14.67	57.93				
部分供用開始	H 1	4%	3.8696	107.5	498.55	1843.73	17.21	63.65				
部分供用開始	H 2	4%	3.7208	109.9	232.31	807.84	27.66	96.19				
部分16年目	H 3	4%	3.5777	112.5	319.99	1044.78	34.16	111.52				
部分供用開始	H 4	4%	3.4401	114.1	218.57	676.90	38.44	119.05				
部分18年目	H 5	4%	3.3078	114.4	269.08	798.95	49.56	147.16				
部分供用開始	H 6	4%	3.1806	114.3	89.21	254.95	61.10	174.61				
部分供用開始	H 7	4%	3.0583	113.7	104.91	289.80	38.45	106.22				
部分供用開始	H 8	4%	2.9407	113.2	55.19	147.25	59.96	159.96				
部分22年目	H 9	4%	2.8276	114.2	109.52	278.50	68.85	175.09				
部分23年目	H 10	4%	2.7188	113.6	233.27	573.37	68.27	167.80				
部分24年目	H 11	4%	2.6142	112.0	267.84	642.05	67.90	162.76				
部分25年目	H 12	4%	2.5137	110.7	283.54	661.23	67.76	158.01				
部分26年目	H 13	4%	2.4170	109.4	305.57	693.33	68.89	156.31				
部分27年目	H 14	4%	2.3240	107.6	302.57	671.14	66.17	146.78				
部分28年目	H 15	4%	2.2346	106.1	360.90	780.61	70.86	153.27				
部分供用開始	H 16	4%	2.1487	105.0	269.12	565.59	72.57	152.53				
部分30年目	H 17	4%	2.0661	103.7	304.21	622.46	74.44	152.31				
部分供用開始	H 18	4%	1.9866	103.0	386.48	765.55	79.99	158.44				
部分32年目	H 19	4%	1.9102	102.1	465.68	894.78	84.23	161.84				
部分供用開始	H 20	4%	1.8367	101.6	479.73	890.66	84.94	157.70				
部分供用開始	H 21	4%	1.7661	100.3	536.89	970.89	90.74	164.10				
部分35年目	H 22	4%	1.6982	98.6	531.62	940.34	94.00	166.27				
部分36年目	H 23	4%	1.6329	97.2	526.86	908.99	93.60	161.48				
部分供用開始	H 24	4%	1.5701	96.4	869.01	1453.60	96.91	162.10				
部分供用開始	H 25	4%	1.5097	96.4	607.78	977.54	101.69	163.56				
部分供用開始	H 26	4%	1.4516	98.7	500.01	755.23	108.57	163.98				
部分40年目	H 27	4%	1.3958	100.2	595.67	852.18	108.86	155.74				
部分供用開始	H 28	4%	1.3421	100.2	111.04	152.74	118.70	163.28				
部分42年目	H 29	4%	1.2905	100.5	196.30	258.87	119.09	157.05				
部分43年目	H 30	4%	1.2409	100.4	276.21	350.60	118.57	150.51				
部分44年目	R 1	4%	1.1932	101.2	487.88	590.76	120.07	145.39				
部分45年目	R 2	4%	1.1473	101.9	690.59	798.53	110.74	128.05				
部分46年目	R 3	4%	1.1032	101.8	874.37	973.13	111.98	124.63				
部分供用開始	R 4	4%	1.0608	102.7	359.17	381.01	113.08	119.96				
部分48年目	R 5	2%	1.0200	102.7	537.42	548.17	108.35	110.52				
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7	971.44	971.44	117.79	117.79	1042.75	1042.75		
部分供用開始	R 7	2%	0.9804	102.7	458.12	449.14	118.20	115.88				
部分51年目	R 8	2%	0.9612	102.7	586.66	563.89	118.20	113.62				
部分52年目	R 9	2%	0.9424	102.7	686.62	647.07	118.20	111.39				
部分供用開始	R 10	2%	0.9239	102.7	411.28	379.98	122.68	113.34				
部分供用開始	R 11	2%	0.9058	102.7	353.65	320.34	123.75	112.09				
部分供用開始	R 12	2%	0.8880	102.7	164.05	145.68	124.26	110.34				
部分供用開始	R 13	2%	0.8706	102.7	123.14	107.20	124.94	108.77				
部分供用開始	R 14	2%	0.8535	102.7	103.54	88.37	126.05	107.58				
部分58年目	R 15	2%	0.8368	102.7	97.59	81.66	125.81	105.28				
部分59年目	R 16	2%	0.8204	102.7	73.62	60.40	125.36	102.84	172.34	141.39		
供用開始年次	R 17	2%	0.8043	102.7			129.87	104.46				
1年目	R 18	2%	0.7885	102.7			130.07	102.56				
2年目	R 19	2%	0.7730	102.7			129.67	100.23				
3年目	R 20	2%	0.7578	102.7			129.36	98.03	133.38	101.07		
4年目	R 21	2%	0.7429	102.7			128.88	95.75	320.03	237.75		
5年目	R 22	2%	0.7283	102.7			128.49	93.58	314.49	229.04		
6年目	R 23	2%	0.7140	102.7			128.11	91.47	952.47	680.07		
7年目	R 24	2%	0.7000	102.7			127.70	89.39				
8年目	R 25	2%	0.6863	102.7			127.39	87.43	156.33	107.29		
9年目	R 26	2%	0.6728	102.7			126.90	85.38	180.03	121.12		
10年目	R 27	2%	0.6596	102.7			126.51	83.45				
11年目	R 28	2%	0.6467	102.7			126.12	81.56	117.66	76.09		
12年目	R 29	2%	0.6340	102.7			125.72	79.71				
13年目	R 30	2%	0.6216	102.7			125.41	77.96				
14年目	R 31	2%	0.6094	102.7			124.91	76.12				
15年目	R 32	2%	0.5975	102.7			124.51	74.40				
16年目	R 33	2%	0.5858	102.7			124.13	72.71				
17年目	R 34	2%	0.5743	102.7			123.83	71.12				
18年目	R 35	2%	0.5630	102.7			123.36	69.45	197.00	110.91		
19年目	R 36	2%	0.5520	102.7			122.96	67.88				
20年目	R 37	2%	0.5412	102.7			122.58	66.34				
21年目	R 38	2%	0.5306	102.7			122.19	64.84				
22年目	R 39	2%	0.5202	102.7			121.90	63.41	96.49	50.19		
23年目	R 40	2%	0.5100	102.7			121.42	61.93	157.85	80.50		
24年目	R 41	2%	0.5000	102.7			121.04	60.52	50.10	25.05		
25年目	R 42	2%	0.4902	102.7			120.65	59.14	141.14	69.18		
26年目	R 43	2%	0.4806	102.7			120.27	57.80	50.10	24.08		
27年目	R 44	2%	0.4712	102.7			119.96	56.53	50.10	23.61		
28年目	R 45	2%	0.4620	102.7			119.50	55.21	65.43	30.23		
29年目	R 46	2%	0.4529	102.7			119.11	53.95	77.31	35.02		
30年目	R 47	2%	0.4440	102.7			118.73	52.71	77.92	34.60		
31年目	R 48	2%	0.4353	102.7			118.34	51.51	444.82	193.63		
32年目	R 49	2%	0.4268	102.7			118.04	50.38	95.44	40.74		
33年目	R 50	2%	0.4184	102.7			117.57	49.19	58.85	24.62		
34年目	R 51	2%	0.4102	102.7			117.19	48.07	2.53	1.04		

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)
注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名 : 近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT								単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
								0.24		108.3		25.82	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)				
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値			
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7									
部分供用開始	R 7	2%	0.9804	102.7	458.12	449.14	5.21	5.11					
部分1年目	R 8	2%	0.9612	102.7	586.66	563.89	5.21	5.01					
部分2年目	R 9	2%	0.9424	102.7	686.62	647.07	5.21	4.91					
部分供用開始	R 10	2%	0.9239	102.7	411.28	379.98	9.62	8.89					
部分供用開始	R 11	2%	0.9058	102.7	353.65	320.34	10.79	9.77					
部分供用開始	R 12	2%	0.8880	102.7	164.05	145.68	11.15	9.91					
部分供用開始	R 13	2%	0.8706	102.7	123.14	107.20	17.40	15.15					
部分供用開始	R 14	2%	0.8535	102.7	103.54	88.37	18.77	16.02					
部分8年目	R 15	2%	0.8368	102.7	97.59	81.66	18.74	15.69					
部分9年目	R 16	2%	0.8204	102.7	73.62	60.40	18.72	15.36					
供用開始年次	R 17	2%	0.8043	102.7			23.57	18.95					
1年目	R 18	2%	0.7885	102.7			24.08	18.99					
2年目	R 19	2%	0.7730	102.7			24.06	18.60					
3年目	R 20	2%	0.7578	102.7			24.03	18.21					
4年目	R 21	2%	0.7429	102.7			24.01	17.83					
5年目	R 22	2%	0.7283	102.7			23.98	17.47					
6年目	R 23	2%	0.7140	102.7			23.96	17.10					
7年目	R 24	2%	0.7000	102.7			23.93	16.75					
8年目	R 25	2%	0.6863	102.7			23.90	16.40					
9年目	R 26	2%	0.6728	102.7			23.88	16.06					
10年目	R 27	2%	0.6596	102.7			23.85	15.73					
11年目	R 28	2%	0.6467	102.7			23.83	15.41					
12年目	R 29	2%	0.6340	102.7			23.80	15.09					
13年目	R 30	2%	0.6216	102.7			23.77	14.78					
14年目	R 31	2%	0.6094	102.7			23.75	14.47					
15年目	R 32	2%	0.5975	102.7			23.72	14.17					
16年目	R 33	2%	0.5858	102.7			23.70	13.88					
17年目	R 34	2%	0.5743	102.7			23.67	13.59					
18年目	R 35	2%	0.5630	102.7			23.65	13.31					
19年目	R 36	2%	0.5520	102.7			23.62	13.04					
20年目	R 37	2%	0.5412	102.7			23.60	12.77					
21年目	R 38	2%	0.5306	102.7			23.57	12.51					
22年目	R 39	2%	0.5202	102.7			23.55	12.25					
23年目	R 40	2%	0.5100	102.7			23.52	12.00					
24年目	R 41	2%	0.5000	102.7			23.50	11.75					
25年目	R 42	2%	0.4902	102.7			23.47	11.51					
26年目	R 43	2%	0.4806	102.7			23.45	11.27					
27年目	R 44	2%	0.4712	102.7			23.42	11.04					
28年目	R 45	2%	0.4620	102.7			23.40	10.81					
29年目	R 46	2%	0.4529	102.7			23.37	10.58					
30年目	R 47	2%	0.4440	102.7			23.35	10.37					
31年目	R 48	2%	0.4353	102.7			23.32	10.15					
32年目	R 49	2%	0.4268	102.7			23.30	9.94					
33年目	R 50	2%	0.4184	102.7			23.27	9.74					
34年目	R 51	2%	0.4102	102.7			23.25	9.54					
35年目	R 52	2%	0.4022	102.7			23.22	9.34					
36年目	R 53	2%	0.3943	102.7			23.20	9.15					
37年目	R 54	2%	0.3866	102.7			23.17	8.96					
38年目	R 55	2%	0.3790	102.7			23.15	8.77					
39年目	R 56	2%	0.3716	102.7			23.12	8.59					
40年目	R 57	2%	0.3643	102.7			23.10	8.41					
41年目	R 58	2%	0.3572	102.7			23.07	8.24					
42年目	R 59	2%	0.3502	102.7			23.05	8.07					
43年目	R 60	2%	0.3433	102.7			23.02	7.90					
44年目	R 61	2%	0.3366	102.7			23.00	7.74					
45年目	R 62	2%	0.3300	102.7			22.97	7.58					
46年目	R 63	2%	0.3235	102.7			22.95	7.42					
47年目	R 64	2%	0.3172	102.7			22.92	7.27	13.20	4.19			
48年目	R 65	2%	0.3110	102.7			22.90	7.12	13.20	4.10			
49年目	R 66	2%	0.3049	102.7			22.87	6.97	13.20	4.02			
合 計					2913.41	2799.57	1294.58	713.41	39.60	12.31			
単純事業費計					3058.26		1,294.58		39.60				

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（事業全体）

年次	年度 (※事業年)	総走行台40の年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)				社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	普通貨物	小型貨物	全 車				① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	④	現在価値 ④×(A)			
部分供用開始	S 50	1.05999	1.09710	1.03449	1.06983	4%	6.7009	72.9	154.07	39.20	88.67	281.93	2,659.94	13.61	4.31	5.20	23.13	218.20	3.80	35.86	308.86	2,914.00
部分1年目	S 51	1.06659	1.08851	1.07706	1.06527	4%	6.4432	79.1	163.31	43.00	96.07	302.38	2,530.34	14.43	4.73	5.64	24.80	207.50	4.07	34.03	331.24	2,771.87
部分2年目	S 52	1.06536	1.08131	1.07154	1.06127	4%	6.1954	83.8	172.55	46.81	103.48	322.83	2,449.75	15.25	5.15	6.07	26.47	200.83	4.33	32.87	353.63	2,683.45
部分3年目	S 53	1.05084	1.07520	1.06677	1.05773	4%	5.9571	87.4	181.79	50.61	110.88	343.28	2,403.78	16.06	5.57	6.51	28.14	197.02	4.60	32.19	376.02	2,632.99
部分4年目	S 54	1.04838	1.06994	1.06259	1.05458	4%	5.7280	89.6	191.03	54.42	118.28	363.73	2,386.95	16.88	5.99	6.94	29.81	195.59	4.86	31.91	398.40	2,614.45
部分5年目	S 55	1.01911	1.00944	1.04650	1.02558	4%	5.5077	95.3	200.28	58.23	125.68	384.19	2,279.72	17.70	6.40	7.38	31.48	186.77	5.13	30.43	420.79	2,496.92
部分6年目	S 56	1.03192	1.02144	1.04515	1.03450	4%	5.2959	97.8	204.10	58.77	131.53	394.41	2,194.50	18.03	6.46	7.72	32.22	179.25	5.26	29.26	431.88	2,403.01
部分7年目	S 57	1.01223	1.04438	1.05717	1.02838	4%	5.0922	98.9	210.62	60.03	137.47	408.12	2,159.10	18.61	6.60	8.07	33.28	176.06	5.44	28.78	448.84	2,363.94
部分8年目	S 58	1.01819	1.05867	1.04396	1.03007	4%	4.8963	99.8	213.20	62.70	145.33	421.22	2,121.36	18.84	6.90	8.53	34.26	172.55	5.60	28.18	461.08	2,322.09
部分9年目	S 59	1.03501	1.04879	1.05902	1.04362	4%	4.7080	101.8	217.07	66.38	151.71	435.17	2,066.21	19.18	7.30	8.90	35.38	168.00	5.76	27.37	476.31	2,261.58
部分10年目	S 60	1.03074	1.06110	1.06140	1.04331	4%	4.5269	102.6	224.67	69.62	160.67	454.96	2,061.45	19.85	7.66	9.43	36.94	167.36	6.01	27.25	497.91	2,256.06
部分11年目	S 61	1.03015	1.07318	1.07482	1.04864	4%	4.3528	104.4	231.58	73.87	170.53	475.98	2,038.70	20.46	8.12	10.01	38.59	165.30	6.28	26.88	520.85	2,230.88
部分12年目	S 62	1.04269	1.08593	1.05056	1.05017	4%	4.1854	104.1	238.56	79.28	183.29	501.13	2,068.24	21.08	8.72	10.76	40.55	167.37	6.58	27.16	548.27	2,262.77
部分13年目	S 63	1.06084	1.06255	1.00366	1.04319	4%	4.0244	104.7	248.75	86.09	192.56	527.39	2,081.87	21.98	9.47	11.30	42.75	168.74	6.91	27.28	577.05	2,277.89
部分供用開始	H 1	1.07018	1.05184	0.99938	1.04666	4%	3.8896	107.5	377.74	145.47	279.32	802.53	2,967.92	35.65	16.72	17.34	69.71	257.79	12.12	44.82	884.36	3,270.53
部分供用開始	H 2	1.04152	1.05938	0.98969	1.02885	4%	3.7208	109.9	472.70	178.67	328.90	980.27	3,408.82	46.19	20.52	21.08	87.79	305.29	16.50	57.37	1,084.56	3,771.48
部分15年目	H 3	1.02876	1.04535	0.97720	1.01663	4%	3.5777	112.5	492.32	189.28	325.51	1,007.11	3,288.25	48.11	21.74	20.86	90.71	296.18	16.97	55.42	1,114.79	3,639.85
部分供用開始	H 4	1.00496	1.02024	0.95419	0.99349	4%	3.4401	114.1	731.28	320.11	416.98	1,468.37	4,547.46	71.36	37.91	26.12	135.39	419.29	25.72	79.65	1,629.47	5,046.40
部分18年目	H 5	1.01268	1.02721	0.96103	1.00146	4%	3.3078	114.4	734.91	326.58	397.88	1,459.37	4,333.22	71.72	38.67	24.92	135.31	401.77	25.55	75.87	1,620.24	4,810.86
部分供用開始	H 6	1.03435	1.02456	0.99078	1.02235	4%	3.1806	114.3	889.30	399.03	457.63	1,745.96	4,988.63	86.72	47.56	29.38	163.65	467.69	31.00	88.60	1,940.62	5,545.92
部分供用開始	H 7	1.02159	1.01217	0.97820	1.01002	4%	3.0583	113.7	951.14	418.21	468.24	1,837.59	5,076.20	91.30	49.21	29.45	169.96	469.51	32.36	89.39	2,039.91	5,635.10
部分供用開始	H 8	1.00650	0.99744	0.96335	0.99535	4%	2.9407	113.2	1,177.05	489.17	563.98	2,230.20	5,950.03	109.80	57.79	36.16	203.75	543.58	35.91	95.81	2,469.86	6,589.42
部分22年目	H 9	0.99993	0.99115	0.95663	0.98910	4%	2.8276	114.2	1,184.70	487.92	543.31	2,215.93	5,634.79	110.51	57.64	34.83	202.99	516.17	35.74	90.89	2,454.65	6,241.85
部分23年目	H 10	1.02352	1.01475	0.97870	1.01268	4%	2.7188	113.6	1,184.62	483.60	519.75	2,187.97	5,377.87	110.51	57.19	33.32	200.96	493.94	35.35	86.90	2,424.28	5,958.71
部分24年目	H 11	0.99245	1.01196	0.98719	0.99407	4%	2.6142	112.0	1,212.48	490.74	508.68	2,211.90	5,302.20	113.11	57.97	32.61	203.69	488.27	35.80	85.82	2,451.39	5,876.29
部分25年目	H 12	0.99820	1.01822	0.99266	0.99988	4%	2.5137	110.7	1,203.33	496.61	502.16	2,202.10	5,135.38	112.25	58.67	32.19	203.11	473.67	35.59	83.00	2,440.80	5,592.05
部分26年目	H 13	0.97883	0.99887	0.97314	0.98055	4%	2.4170	109.4	1,201.16	505.65	498.47	2,205.29	5,003.74	112.05	59.74	31.96	203.74	462.29	35.59	80.74	2,444.62	5,546.77
部分27年目	H 14	0.98162	1.00214	0.97564	0.98341	4%	2.3240	107.6	1,175.73	505.08	485.08	2,165.90	4,804.32	109.68	59.67	31.10	200.44	444.62	34.89	77.40	2,401.24	5,326.34
部分28年目	H 15	0.96483	0.98543	0.95866	0.96666	4%	2.2346	106.1	1,154.12	506.16	473.27	2,133.55	4,614.86	107.66	59.80	30.34	197.80	427.84	34.31	74.22	2,365.67	5,116.92
部分供用開始	H 16	0.96201	0.98302	0.95555	0.96392	4%	2.1487	105.0	1,421.76	590.22	606.97	2,618.95	5,504.07	131.54	70.34	39.38	241.26	507.04	39.14	82.25	2,899.35	6,093.36
部分30年目	H 17	1.02388	1.00586	1.02774	1.02172	4%	2.0681	103.7	1,367.75	580.19	579.99	2,527.94	5,172.60	126.94	69.14	37.63	233.32	477.41	37.73	77.19	2,798.98	5,727.20
部分供用開始	H 18	1.03286	1.01544	0.99241	0.99747	4%	1.9886	103.0	1,579.97	640.32	642.14	2,862.44	5,669.96	141.34	75.80	40.02	257.15	509.37	40.40	80.03	3,159.99	6,229.36
部分32年目	H 19	1.00863	0.99215	1.01222	1.00687	4%	1.9102	102.1	1,631.88	650.21	665.73	2,947.83	5,664.03	145.98	76.97	41.49	264.44	508.09	41.85	80.03	3,253.92	6,252.15
部分供用開始	H 20	1.02992	1.01361	1.03341	1.02821	4%	1.8367	101.6	1,736.25	660.23	704.81	3,011.29	5,757.81	158.39	79.17	45.11	282.66	524.79	44.47	82.56	3,428.42	6,365.16
部分供用開始	H 21	1.02622	1.01044	1.02952	1.02458	4%	1.7661	100.3	1,872.51	707.16	753.41	3,333.08	6,027.41	169.39	84.25	47.72	301.36	544.96	46.94	84.88	3,681.38	6,657.25
部分35年目	H 22	0.98100	0.99560	0.96143	0.97913	4%	1.6982	98.6	1,921.60	714.55	775.65	3,411.80	6,034.84	173.83	85.13	49.13	308.09	544.95	48.09	85.07	3,767.98	6,664.86
部分36年目	H 23	1.00559	1.02074	0.98455	1.00361	4%	1.6329	97.2	1,885.10	711.41	745.74	3,342.24	5,766.36	170.53	84.75	47.24	302.51	521.93	47.09	81.24	3,691.84	6,369.53
部分供用開始	H 24	0.98363	0.99864	0.96203	0.98164	4%	1.5701	96.4	2,355.12	845.20	911.90	4,112.22	6,878.55	223.00	105.63	60.39	389.02	650.72	58.51	97.88	4,559.75	7,627.15
部分供用開始	H 25	0.97481	0.98988	0.95230	0.97277	4%	1.5097	96.4	2,357.78	863.90	886.78	4,108.46	6,607.89	224.09	108.90	59.01	392.00	630.48	58.77	94.53	4,559.23	7,332.90
部分40年目	H 26	0.98640	1.00184	0.98241	0.98427	4%	1.4516	98.7	2,361.89	886.22	885.09	4										

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
	乗用車類								普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値	
		R 6																				
部分供用開始	R 7	0.99857	1.00513	0.98275	0.99714	2%	0.9804	102.7	18.91	8.63	4.60	32.14	31.51	2.45	0.81	1.02	4.28	4.00	1.30	1.28	37.72	36.79
部分1年目	R 8	0.99857	1.00511	0.98245	0.99713	2%	0.9612	102.7	18.89	8.67	4.52	32.08	30.83	2.45	0.82	1.00	4.27	4.00	1.30	1.25	37.64	36.08
部分2年目	R 9	0.99856	1.00508	0.98214	0.99712	2%	0.9424	102.7	18.86	8.71	4.44	32.01	30.17	2.45	0.82	0.98	4.25	4.00	1.30	1.22	37.56	35.39
部分供用開始	R 10	0.99856	1.00506	0.98181	0.99711	2%	0.9239	102.7	41.21	14.76	8.44	64.41	59.51	5.94	1.65	1.32	8.91	8.00	2.45	2.27	75.76	69.78
部分供用開始	R 11	0.99856	1.00503	0.98147	0.99710	2%	0.9058	102.7	47.19	15.70	9.95	72.84	65.98	7.02	1.77	1.41	10.20	9.00	2.80	2.54	85.85	77.52
部分供用開始	R 12	0.99599	1.00372	0.98948	0.99639	2%	0.8880	102.7	54.02	18.91	10.85	83.77	74.39	7.14	1.71	1.38	10.23	9.00	2.85	2.53	96.85	85.92
部分供用開始	R 13	0.99597	1.00370	0.98937	0.99637	2%	0.8706	102.7	188.26	70.33	47.68	306.27	266.64	14.66	5.81	2.59	23.05	20.00	4.22	3.68	333.55	290.32
部分供用開始	R 14	0.99596	1.00369	0.98926	0.99636	2%	0.8535	102.7	208.51	79.81	52.63	340.94	291.00	15.67	6.34	2.69	24.70	21.00	4.39	3.75	370.04	315.75
部分8年目	R 15	0.99594	1.00368	0.98914	0.99635	2%	0.8368	102.7	207.67	80.10	52.06	339.83	284.37	15.61	6.36	2.66	24.63	21.00	4.37	3.66	368.84	309.03
部分9年目	R 16	0.99592	1.00366	0.98902	0.99633	2%	0.8204	102.7	206.83	80.40	51.49	338.72	277.88	15.55	6.39	2.63	24.56	20.00	4.36	3.58	367.64	301.46
供用開始年次	R 17	0.99591	1.00365	0.98890	0.99632	2%	0.8043	102.7	291.96	111.04	67.19	470.19	378.17	20.82	8.52	3.11	32.45	26.00	5.88	4.73	508.51	408.90
1年目	R 18	0.99589	1.00364	0.98877	0.99631	2%	0.7885	102.7	290.76	111.45	66.45	468.65	369.53	20.74	8.55	3.07	32.36	26.00	5.85	4.62	506.87	400.15
2年目	R 19	0.99587	1.00362	0.98865	0.99629	2%	0.7730	102.7	289.57	111.85	65.70	467.12	361.08	20.65	8.58	3.04	32.27	25.00	5.83	4.51	505.22	390.59
3年目	R 20	0.99586	1.00361	0.98852	0.99628	2%	0.7578	102.7	288.37	112.26	64.95	465.58	352.82	20.57	8.61	3.00	32.18	24.00	5.81	4.40	503.58	381.22
4年目	R 21	0.99584	1.00360	0.98838	0.99626	2%	0.7429	102.7	287.18	112.66	64.21	464.05	344.74	20.48	8.64	2.97	32.09	24.00	5.79	4.30	501.93	373.04
5年目	R 22	0.99119	0.99987	0.99243	0.99329	2%	0.7283	102.7	285.98	113.07	63.46	462.51	336.85	20.40	8.67	2.93	32.01	23.00	5.77	4.20	500.28	364.05
6年目	R 23	0.99112	0.99987	0.99237	0.99325	2%	0.7140	102.7	283.46	113.05	62.98	459.50	328.08	20.22	8.67	2.91	31.80	23.00	5.73	4.09	497.03	355.17
7年目	R 24	0.99104	0.99987	0.99231	0.99320	2%	0.7000	102.7	280.94	113.04	62.50	456.48	319.54	20.04	8.67	2.89	31.60	22.00	5.69	3.98	493.77	345.52
8年目	R 25	0.99095	0.99987	0.99225	0.99315	2%	0.6863	102.7	278.43	113.02	62.02	453.47	311.22	19.86	8.67	2.87	31.40	22.00	5.65	3.88	490.52	337.10
9年目	R 26	0.99087	0.99987	0.99219	0.99311	2%	0.6728	102.7	275.91	113.01	61.54	450.45	303.07	19.68	8.67	2.85	31.19	21.00	5.61	3.78	487.26	327.85
10年目	R 27	0.99079	0.99987	0.99213	0.99306	2%	0.6596	102.7	273.39	112.99	61.06	447.44	295.13	19.50	8.67	2.82	30.99	20.00	5.57	3.68	484.01	318.81
11年目	R 28	0.99070	0.99987	0.99207	0.99301	2%	0.6467	102.7	270.87	112.98	60.58	444.43	287.41	19.32	8.67	2.80	30.79	20.00	5.54	3.58	480.75	310.99
12年目	R 29	0.99062	0.99987	0.99200	0.99296	2%	0.6340	102.7	268.35	112.96	60.10	441.41	279.86	19.14	8.67	2.78	30.58	19.00	5.50	3.48	477.49	302.34
13年目	R 30	0.99053	0.99987	0.99194	0.99291	2%	0.6216	102.7	265.83	112.95	59.62	438.40	272.51	18.96	8.67	2.76	30.38	19.00	5.46	3.39	474.24	294.90
14年目	R 31	0.99044	0.99987	0.99187	0.99286	2%	0.6094	102.7	263.32	112.93	59.14	435.38	265.32	18.78	8.66	2.73	30.18	18.00	5.42	3.30	470.98	286.62
15年目	R 32	0.99034	0.99987	0.99181	0.99281	2%	0.5975	102.7	260.80	112.92	58.66	432.37	258.34	18.60	8.66	2.71	29.98	18.00	5.38	3.21	467.73	279.55
16年目	R 33	0.99025	0.99987	0.99174	0.99276	2%	0.5858	102.7	258.28	112.90	58.18	429.36	251.52	18.42	8.66	2.69	29.77	17.00	5.34	3.13	464.47	271.65
17年目	R 34	0.99015	0.99987	0.99167	0.99271	2%	0.5743	102.7	255.76	112.89	57.69	426.34	244.85	18.24	8.66	2.67	29.57	17.00	5.30	3.05	461.22	264.90
18年目	R 35	0.99006	0.99987	0.99160	0.99265	2%	0.5630	102.7	253.24	112.87	57.21	423.33	238.33	18.06	8.66	2.65	29.37	17.00	5.26	2.96	457.96	258.29
19年目	R 36	0.98996	0.99987	0.99153	0.99260	2%	0.5520	102.7	250.72	112.86	56.73	420.32	232.01	17.88	8.66	2.62	29.16	16.00	5.23	2.88	454.70	250.89
20年目	R 37	0.98985	0.99987	0.99146	0.99254	2%	0.5412	102.7	248.21	112.84	56.25	417.30	225.84	17.70	8.66	2.60	28.96	16.00	5.19	2.81	451.45	244.65
21年目	R 38	0.98975	0.99987	0.99138	0.99249	2%	0.5306	102.7	245.69	112.83	55.77	414.29	219.82	17.52	8.66	2.58	28.76	15.00	5.15	2.73	448.19	237.55
22年目	R 39	0.98964	0.99987	0.99131	0.99243	2%	0.5202	102.7	243.17	112.81	55.29	411.27	213.94	17.34	8.66	2.56	28.56	15.00	5.11	2.66	444.94	231.60
23年目	R 40	0.98953	0.99987	0.99123	0.99237	2%	0.5100	102.7	240.65	112.80	54.81	408.26	208.21	17.16	8.65	2.53	28.35	14.00	5.07	2.59	441.68	224.80
24年目	R 41	0.98942	0.99987	0.99115	0.99231	2%	0.5000	102.7	238.13	112.78	54.33	405.25	202.62	16.98	8.65	2.51	28.15	14.00	5.03	2.52	438.43	219.14
25年目	R 42	0.98932	0.99987	0.99108	0.992%</																	

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT							維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
							単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
							0.40		328.9		133.16	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)			
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値		
-67年目	S 43	4%	8.7339	39.8	0.31	6.99						
-66年目	S 44	4%	8.3980	42.0	5.59	114.69						
-65年目	S 45	4%	8.0750	44.9	21.63	399.70						
-64年目	S 46	4%	7.7644	47.0	105.06	1781.05						
-63年目	S 47	4%	7.4658	50.2	162.75	2484.89						
-62年目	S 48	4%	7.1787	57.8	71.33	909.35						
-61年目	S 49	4%	6.9026	69.0	50.58	519.92						
部分供用開始	S 50	4%	6.6371	72.9	7.17	67.00	8.82	82.38				
部分1年目	S 51	4%	6.3818	79.1	3.70	30.67	8.96	74.26				
部分2年目	S 52	4%	6.1363	83.8	4.65	34.95	9.08	68.25				
部分3年目	S 53	4%	5.9003	87.4	50.67	351.42	9.24	64.07				
部分4年目	S 54	4%	5.6734	89.6	82.62	537.01	9.37	60.89				
部分5年目	S 55	4%	5.4552	95.3	113.22	665.43	9.50	55.85				
部分6年目	S 56	4%	5.2454	97.8	142.30	784.21	9.66	53.24				
部分7年目	S 57	4%	5.0437	98.9	172.61	904.46	9.82	51.45				
部分8年目	S 58	4%	4.8497	99.8	286.77	1430.49	9.99	49.83				
部分9年目	S 59	4%	4.6632	101.8	154.19	725.14	13.01	61.20				
部分10年目	S 60	4%	4.4838	102.6	211.38	948.66	13.26	59.51				
部分11年目	S 61	4%	4.3113	104.4	228.70	970.21	13.52	57.37				
部分12年目	S 62	4%	4.1455	104.1	330.48	1350.93	13.84	56.58				
部分13年目	S 63	4%	3.9861	104.7	497.40	1944.79	14.67	57.37				
部分供用開始	H 1	4%	3.8328	107.5	498.55	1826.20	17.21	63.04				
部分供用開始	H 2	4%	3.6854	109.9	232.31	800.15	27.66	95.27				
部分16年目	H 3	4%	3.5437	112.5	319.99	1034.85	34.16	110.46				
部分供用開始	H 4	4%	3.4074	114.1	218.57	670.47	38.44	117.92				
部分18年目	H 5	4%	3.2763	114.4	269.08	791.35	49.56	145.76				
部分供用開始	H 6	4%	3.1503	114.3	89.21	252.52	61.10	172.95				
部分供用開始	H 7	4%	3.0291	113.7	104.91	287.03	38.45	105.20				
部分供用開始	H 8	4%	2.9126	113.2	55.19	145.84	59.96	158.44				
部分22年目	H 9	4%	2.8006	114.2	109.52	275.84	68.85	173.41				
部分23年目	H 10	4%	2.6929	113.6	233.27	567.91	68.27	166.21				
部分24年目	H 11	4%	2.5893	112.0	267.84	635.93	67.90	161.21				
部分25年目	H 12	4%	2.4897	110.7	283.54	654.92	67.76	156.50				
部分26年目	H 13	4%	2.3939	109.4	305.57	686.71	68.89	154.81				
部分27年目	H 14	4%	2.3018	107.6	302.57	664.73	66.17	145.38				
部分28年目	H 15	4%	2.2133	106.1	360.90	773.17	70.86	151.81				
部分供用開始	H 16	4%	2.1282	105.0	269.12	560.20	72.57	151.07				
部分30年目	H 17	4%	2.0463	103.7	304.21	616.50	74.44	150.85				
部分供用開始	H 18	4%	1.9676	103.0	386.48	758.23	79.99	156.93				
部分32年目	H 19	4%	1.8919	102.1	465.68	886.21	84.23	160.28				
部分供用開始	H 20	4%	1.8191	101.6	479.73	882.13	84.94	156.19				
部分供用開始	H 21	4%	1.7491	100.3	536.89	961.54	90.74	162.52				
部分35年目	H 22	4%	1.6818	98.6	531.62	931.25	94.00	164.67				
部分36年目	H 23	4%	1.6171	97.2	526.86	900.19	93.60	159.92				
部分供用開始	H 24	4%	1.5549	96.4	869.01	1439.53	96.91	160.53				
部分供用開始	H 25	4%	1.4951	96.4	607.78	968.08	101.69	161.98				
部分供用開始	H 26	4%	1.4376	98.7	500.01	747.95	108.57	162.40				
部分40年目	H 27	4%	1.3823	100.2	595.67	843.94	108.86	154.23				
部分供用開始	H 28	4%	1.3291	100.2	111.04	151.26	118.70	161.69				
部分42年目	H 29	4%	1.2780	100.5	196.30	256.37	119.09	155.53				
部分43年目	H 30	4%	1.2288	100.4	276.21	347.18	118.57	149.04				
部分44年目	R 1	4%	1.1815	101.2	487.88	584.97	120.07	143.97				
部分45年目	R 2	4%	1.1361	101.9	690.59	790.74	110.74	126.80				
部分46年目	R 3	4%	1.0924	101.8	874.37	963.61	111.98	123.41				
部分供用開始	R 4	4%	1.0504	102.7	359.17	377.27	113.08	118.78				
部分48年目	R 5	1%	1.0100	102.7	537.42	542.79	108.35	109.43				
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7	971.44	971.44	117.79	117.79	1042.75	1042.75		
部分供用開始	R 7	1%	0.9901	102.7	458.12	453.58	118.20	117.03				
部分51年目	R 8	1%	0.9803	102.7	586.66	575.10	118.20	115.87				
部分52年目	R 9	1%	0.9706	102.7	686.62	666.44	118.20	114.72				
部分供用開始	R 10	1%	0.9610	102.7	411.28	395.24	122.68	117.89				
部分供用開始	R 11	1%	0.9515	102.7	353.65	336.50	123.75	117.75				
部分供用開始	R 12	1%	0.9421	102.7	164.05	154.55	124.26	117.06				
部分供用開始	R 13	1%	0.9328	102.7	123.14	114.86	124.94	116.54				
部分供用開始	R 14	1%	0.9236	102.7	103.54	95.63	126.05	116.42				
部分58年目	R 15	1%	0.9145	102.7	97.59	89.25	125.81	115.05				
部分59年目	R 16	1%	0.9054	102.7	73.62	66.65	125.36	113.50	172.34	156.03		
供用開始年次	R 17	1%	0.8964	102.7			129.87	116.42				
1年目	R 18	1%	0.8875	102.7			130.07	115.44				
2年目	R 19	1%	0.8787	102.7			129.67	113.94				
3年目	R 20	1%	0.8700	102.7			129.36	112.54	133.38	116.04		
4年目	R 21	1%	0.8614	102.7			128.88	111.02	320.03	275.68		
5年目	R 22	1%	0.8529	102.7			128.49	109.59	314.49	268.23		
6年目	R 23	1%	0.8445	102.7			128.11	108.19	952.47	804.36		
7年目	R 24	1%	0.8361	102.7			127.70	106.77				
8年目	R 25	1%	0.8278	102.7			127.39	105.45	156.33	129.41		
9年目	R 26	1%	0.8196	102.7			126.90	104.01	180.03	147.55		
10年目	R 27	1%	0.8115	102.7			126.51	102.66				
11年目	R 28	1%	0.8035	102.7			126.12	101.34	117.66	94.54		
12年目	R 29	1%	0.7955	102.7			125.72	100.01				
13年目	R 30	1%	0.7876	102.7			125.41	98.78				
14年目	R 31	1%	0.7798	102.7			124.91	97.41				
15年目	R 32	1%	0.7721	102.7			124.51	96.14				
16年目	R 33	1%	0.7645	102.7			124.13	94.90				
17年目	R 34	1%	0.7569	102.7			123.83	93.73				
18年目	R 35	1%	0.7494	102.7			123.36	92.44	197.00	147.63		
19年目	R 36	1%	0.7420	102.7			122.96	91.24				
20年目	R 37	1%	0.7347	102.7			122.58	90.06				
21年目	R 38	1%	0.7274	102.7			122.19	88.88				
22年目	R 39	1%	0.7202	102.7			121.90	87.79	96.49	69.49		
23年目	R 40	1%	0.7131	102.7			121.42	86.59	157.85	112.56		
24年目	R 41	1%	0.7060	102.7			121.04	85.45	50.10	35.37		
25年目	R 42	1%	0.6990	102.7			120.65	84.34	141.14	98.65		
26年目	R 43	1%	0.6921	102.7			120.27	83.24	50.10	34.67		
27年目	R 44	1%	0.6852	102.7			119.96	82.20	50.10	34.33		
28年目	R 45	1%	0.6784	102.7			119.50	81.07	65.43	44.39		
29年目	R 46	1%	0.6717	102.7			119.11	80.01	77.31	51.93		
30年目	R 47	1%	0.6650	102.7			118.73	78.95	77.92	51.82		
31年目	R 48	1%	0.6584	102.7			118.34	77.92	444.82	292.87		
32年目	R 49	1%	0.6519	102.7			118.04	76.95	95.			

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT							単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
							0.24		108.3		25.82	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)			
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値		
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7								
部分供用開始	R 7	1%	0.9901	102.7	458.12	453.58	5.21	5.16				
部分1年目	R 8	1%	0.9803	102.7	586.66	575.10	5.21	5.11				
部分2年目	R 9	1%	0.9706	102.7	686.62	666.44	5.21	5.06				
部分供用開始	R 10	1%	0.9610	102.7	411.28	395.24	9.62	9.24				
部分供用開始	R 11	1%	0.9515	102.7	353.65	336.50	10.79	10.27				
部分供用開始	R 12	1%	0.9421	102.7	164.05	154.55	11.15	10.51				
部分供用開始	R 13	1%	0.9328	102.7	123.14	114.86	17.40	16.23				
部分供用開始	R 14	1%	0.9236	102.7	103.54	95.63	18.77	17.34				
部分8年目	R 15	1%	0.9145	102.7	97.59	89.25	18.74	17.14				
部分9年目	R 16	1%	0.9054	102.7	73.62	66.65	18.72	16.95				
供用開始年次	R 17	1%	0.8964	102.7			23.57	21.12				
1年目	R 18	1%	0.8875	102.7			24.08	21.38				
2年目	R 19	1%	0.8787	102.7			24.06	21.14				
3年目	R 20	1%	0.8700	102.7			24.03	20.91				
4年目	R 21	1%	0.8614	102.7			24.01	20.68				
5年目	R 22	1%	0.8529	102.7			23.98	20.45				
6年目	R 23	1%	0.8445	102.7			23.96	20.23				
7年目	R 24	1%	0.8361	102.7			23.93	20.01				
8年目	R 25	1%	0.8278	102.7			23.90	19.79				
9年目	R 26	1%	0.8196	102.7			23.88	19.57				
10年目	R 27	1%	0.8115	102.7			23.85	19.36				
11年目	R 28	1%	0.8035	102.7			23.83	19.14				
12年目	R 29	1%	0.7955	102.7			23.80	18.93				
13年目	R 30	1%	0.7876	102.7			23.77	18.72				
14年目	R 31	1%	0.7798	102.7			23.75	18.52				
15年目	R 32	1%	0.7721	102.7			23.72	18.32				
16年目	R 33	1%	0.7645	102.7			23.70	18.12				
17年目	R 34	1%	0.7569	102.7			23.67	17.92				
18年目	R 35	1%	0.7494	102.7			23.65	17.72				
19年目	R 36	1%	0.7420	102.7			23.62	17.53				
20年目	R 37	1%	0.7347	102.7			23.60	17.34				
21年目	R 38	1%	0.7274	102.7			23.57	17.15				
22年目	R 39	1%	0.7202	102.7			23.55	16.96				
23年目	R 40	1%	0.7131	102.7			23.52	16.77				
24年目	R 41	1%	0.7060	102.7			23.50	16.59				
25年目	R 42	1%	0.6990	102.7			23.47	16.41				
26年目	R 43	1%	0.6921	102.7			23.45	16.23				
27年目	R 44	1%	0.6852	102.7			23.42	16.05				
28年目	R 45	1%	0.6784	102.7			23.40	15.87				
29年目	R 46	1%	0.6717	102.7			23.37	15.70				
30年目	R 47	1%	0.6650	102.7			23.35	15.53				
31年目	R 48	1%	0.6584	102.7			23.32	15.35				
32年目	R 49	1%	0.6519	102.7			23.30	15.19				
33年目	R 50	1%	0.6454	102.7			23.27	15.02				
34年目	R 51	1%	0.6390	102.7			23.25	14.85				
35年目	R 52	1%	0.6327	102.7			23.22	14.69				
36年目	R 53	1%	0.6264	102.7			23.20	14.53				
37年目	R 54	1%	0.6202	102.7			23.17	14.37				
38年目	R 55	1%	0.6141	102.7			23.15	14.21				
39年目	R 56	1%	0.6080	102.7			23.12	14.06				
40年目	R 57	1%	0.6020	102.7			23.10	13.90				
41年目	R 58	1%	0.5960	102.7			23.07	13.75				
42年目	R 59	1%	0.5901	102.7			23.05	13.60				
43年目	R 60	1%	0.5843	102.7			23.02	13.45				
44年目	R 61	1%	0.5785	102.7			23.00	13.30				
45年目	R 62	1%	0.5728	102.7			22.97	13.16				
46年目	R 63	1%	0.5671	102.7			22.95	13.01				
47年目	R 64	1%	0.5615	102.7			22.92	12.87	13.20	7.41		
48年目	R 65	1%	0.5559	102.7			22.90	12.73	13.20	7.34		
49年目	R 66	1%	0.5504	102.7			22.87	12.59	13.20	7.26		
合 計					2913.41	2868.08	1294.58	947.80	39.60	22.01		
単純事業費計					3058.26		1,294.58		39.60			

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表（事業全体）

年次		総走行台40の年次別伸び率 (※機動部ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT		走行時間便益 (億円)		走行経費便益 (億円)		事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)					
年度 (事業年)	R 6	乗用車類	普通貨物	小型貨物	全 車				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
部分供用開始	S 50	1.05999	1.09710	1.08349	1.06983	4%	6.6371	72.9	154.07	39.20	88.67	281.93	2,634.61	13.61	4.31	5.20	23.13	216.12	3.80	35.52	308.86	2,886.25
部分1年目	S 51	1.05659	1.08851	1.07706	1.06527	4%	6.3818	79.1	163.31	43.00	96.07	302.38	2,506.23	14.43	4.73	5.64	24.80	205.52	4.07	33.71	331.24	2,745.46
部分2年目	S 52	1.05356	1.08131	1.07154	1.06127	4%	6.1363	83.8	172.55	46.81	103.48	322.83	2,426.38	15.25	5.15	6.07	26.47	198.92	4.33	32.56	353.63	2,657.86
部分3年目	S 53	1.05084	1.07520	1.06677	1.05773	4%	5.9003	87.4	181.79	50.61	110.88	343.28	2,380.86	16.06	5.57	6.51	28.14	195.14	4.60	31.89	376.02	2,607.89
部分4年目	S 54	1.04838	1.06994	1.06259	1.05458	4%	5.6734	89.6	191.03	54.42	118.28	363.73	2,364.20	16.88	5.99	6.94	29.81	193.73	4.86	31.61	398.40	2,589.54
部分5年目	S 55	1.01911	1.00944	1.04650	1.02558	4%	5.4552	95.3	200.28	58.23	125.68	384.19	2,257.99	17.70	6.40	7.38	31.48	184.99	5.13	30.14	420.79	2,473.12
部分6年目	S 56	1.03192	1.02144	1.04515	1.03450	4%	5.2454	97.8	204.10	58.77	131.53	394.41	2,173.58	18.03	6.46	7.72	32.22	177.55	5.28	28.98	431.88	2,380.11
部分7年目	S 57	1.01223	1.04338	1.05717	1.02938	4%	5.0437	98.9	210.62	60.03	137.47	408.12	2,138.53	18.61	6.80	8.07	33.28	174.38	5.44	28.51	448.84	2,341.42
部分8年目	S 58	1.01819	1.05867	1.04396	1.03007	4%	4.8497	99.8	213.20	62.70	145.33	421.22	2,101.17	18.84	6.90	8.53	34.26	170.90	5.60	27.91	461.08	2,299.98
部分9年目	S 59	1.03501	1.04879	1.05902	1.04362	4%	4.6632	101.8	217.07	66.38	151.71	435.17	2,046.55	19.18	7.30	8.90	35.38	166.40	5.76	27.11	476.31	2,240.06
部分10年目	S 60	1.03074	1.06110	1.06140	1.04331	4%	4.4838	102.6	224.67	69.62	160.67	454.96	2,041.83	19.85	7.66	9.43	36.94	165.77	6.01	26.99	497.91	2,234.59
部分11年目	S 61	1.03015	1.07318	1.07482	1.04864	4%	4.3113	104.4	231.58	73.87	170.53	475.98	2,019.26	20.46	8.12	10.01	38.59	163.72	6.28	26.62	520.85	2,209.60
部分12年目	S 62	1.04269	1.08593	1.05056	1.05017	4%	4.1455	104.1	238.56	79.28	183.29	501.13	2,048.52	21.08	8.72	10.76	40.55	165.77	6.58	26.90	548.27	2,241.19
部分13年目	S 63	1.06084	1.06255	1.00366	1.04319	4%	3.9861	104.7	248.75	86.09	192.56	527.39	2,062.06	21.98	9.47	11.30	42.75	167.13	6.91	27.02	577.05	2,256.21
部分供用開始	H 1	1.07018	1.05184	0.99938	1.04666	4%	3.8328	107.5	377.74	145.47	279.32	802.53	2,839.70	35.85	16.72	17.34	69.71	255.34	12.12	44.40	884.38	3,239.44
部分供用開始	H 2	1.04152	1.05938	0.98969	1.02895	4%	3.6854	109.9	472.70	178.67	328.90	980.27	3,378.39	46.19	20.52	21.08	87.79	302.39	16.50	58.82	1,084.55	3,755.80
部分15年目	H 3	1.02876	1.04535	0.97720	1.01683	4%	3.5437	112.5	492.32	189.28	325.51	1,007.11	3,257.00	48.11	21.74	20.86	90.71	293.36	16.97	54.89	1,114.79	3,605.25
部分供用開始	H 4	1.00496	1.02024	0.95419	0.99349	4%	3.4074	114.1	731.28	320.11	416.98	1,468.37	4,504.23	71.36	37.91	26.12	135.39	415.30	25.72	78.90	1,629.47	4,998.43
部分18年目	H 5	1.01268	1.02721	0.96103	1.00146	4%	3.2763	114.4	734.91	326.58	397.88	1,459.37	4,291.96	71.72	38.67	24.92	135.31	397.95	25.55	75.15	1,620.24	4,765.06
部分供用開始	H 6	1.03435	1.02456	0.99078	1.02235	4%	3.1503	114.3	889.30	399.03	457.63	1,745.96	4,942.10	86.72	47.56	29.38	163.65	463.24	31.00	87.76	1,940.62	5,493.10
部分供用開始	H 7	1.02159	1.01217	0.97820	1.01002	4%	3.0291	113.7	951.14	418.21	468.24	1,837.59	5,027.74	91.30	49.21	29.45	169.96	465.03	32.36	88.53	2,039.91	5,581.30
部分供用開始	H 8	1.00650	0.99744	0.96335	0.99535	4%	2.9126	113.2	1,177.05	489.17	563.98	2,230.20	5,893.18	109.80	57.79	36.16	203.75	538.39	35.91	94.89	2,469.86	6,526.46
部分22年目	H 9	0.99993	0.99115	0.95663	0.98910	4%	2.8006	114.2	1,184.70	487.92	543.31	2,215.93	5,580.98	110.51	57.64	34.83	202.99	511.24	35.74	90.02	2,454.65	6,182.24
部分23年目	H 10	1.02352	1.01475	0.97870	1.01268	4%	2.6929	113.6	1,184.62	483.60	519.75	2,187.97	5,328.64	110.51	57.13	33.32	200.96	489.24	35.35	86.07	2,424.28	5,901.95
部分24年目	H 11	0.99245	1.01196	0.98719	0.99407	4%	2.5893	112.0	1,212.48	490.74	508.68	2,211.90	5,251.69	113.11	57.37	32.61	203.69	483.62	35.80	85.00	2,451.39	5,820.31
部分25年目	H 12	0.99820	1.01822	0.99266	0.99988	4%	2.4897	110.7	1,203.33	496.61	502.16	2,202.10	5,086.35	112.25	58.67	32.19	203.11	469.14	35.59	82.20	2,440.80	5,637.69
部分26年目	H 13	0.97883	0.99887	0.97314	0.98055	4%	2.3939	109.4	1,201.16	505.65	498.47	2,205.29	4,955.92	112.05	59.74	31.96	203.74	457.87	35.59	79.97	2,444.62	5,493.76
部分27年目	H 14	0.98162	1.00214	0.97564	0.98341	4%	2.3018	107.6	1,175.73	505.08	485.08	2,165.90	4,758.43	109.68	59.67	31.10	200.44	440.37	34.89	76.66	2,401.24	5,275.46
部分28年目	H 15	0.96483	0.98543	0.95866	0.96666	4%	2.2133	106.1	1,154.12	506.16	473.27	2,133.55	4,570.87	107.66	59.80	30.34	197.80	423.76	34.31	73.51	2,365.67	5,068.14
部分供用開始	H 16	0.96201	0.98302	0.95555	0.96392	4%	2.1282	105.0	1,421.76	590.22	606.97	2,618.95	5,451.56	131.54	70.34	39.38	241.26	502.20	39.14	81.47	2,899.35	6,035.23
部分30年目	H 17	1.02388	1.00586	1.02774	1.02172	4%	2.0463	103.7	1,367.75	590.19	579.99	2,527.94	5,123.03	126.94	69.14	37.63	233.32	472.83	37.73	78.45	2,798.98	5,672.31
部分供用開始	H 18	1.03286	1.01544	1.03067	1.03067	4%	1.9676	103.0	1,579.97	642.32	642.14	3,612.73	4,615.73	141.26	75.80	40.02	282.44	504.26	37.15	80.06	3,158.99	6,189.49
部分22年目	H 19	1.00863	0.99215	1.01222	1.00887	4%	1.8919	102.1	1,631.88	650.21	685.73	2,947.83	5,609.77	145.98	76.97	41.49	284.44	503.23	41.85	79.27	3,253.97	6,192.27
部分供用開始	H 20	1.02992	1.01361	1.03341	1.02821	4%	1.8191	101.6	1,736.25	660.23	704.81	3,011.29	5,702.64	158.39	79.17	45.11	282.66	519.76	44.47	81.76	3,428.42	6,304.16
部分供用開始	H 21	1.02622	1.01044	1.02952	1.02458	4%	1.7491	100.3	1,872.51	707.16	753.41	3,333.08	5,969.39	169.39	84.25	47.72	301.36	539.72	46.94	84.06	3,681.38	6,593.17
部分35年目	H 22	0.98100	0.99560	0.96143	0.97913	4%	1.6818	98.6	1,921.60	714.55	775.65	3,411.80	5,976.56	173.83	85.13	49.13	308.09	539.68	48.09	84.24	3,767.98	6,600.48
部分36年目	H 23	1.00559	1.02074	0.98455	1.00361	4%	1.6171	97.2	1,885.10	711.41	745.74	3,342.24	5,710.56	170.53	84.75	47.24	302.51	516.88	47.09	80.46	3,691.84	6,307.90
部分供用開始	H 24	0.98363	0.99864	0.96203	0.98164	4%	1.5549	96.4	2,355.12	845.20	911.90	4,112.22	6,811.96	223.00	105.63	60.39	389.02	644.42	58.51	96.93	4,559.75	7,553.31
部分供用開始	H 25	0.97481	0.98988	0.95230	0.97277	4%	1.4951	96.4	2,357.78	863.90	886.78	4,108.46	6,543.99	224.09	108.90	59.01	392.00	624.39	58.77	93.61	4,559.23	7,261.99
部分供用開始	H 26	0.98640	1.00184	0.96241	0.98427	4%	1.4376	98.7	2,361.89	886.22	885.09	4,113.19	6,152.76	225.62	112.99	57.84	396.56	593.19	59.56	88.08	4,366.31	6,835.04
部分40年目	H 27	0.98859	1.00541	0.98529	0.99721	4%	1.3823	102.7	2,329.77	897.65	932.57	4,050.19	5,738.26	222.55	113.20	55.77	391.52	554.70	61.04	83.08	4,503.03	6,768.02
部分供用開始	H 28	0.98859	1.00538	0.98507	0.99721	4%	1.3291	100.2	2,495.67	932.87	885.49	4,314.03	5,876.83	235.20	116.63	57.25	408.08	557.27	61.38	83.62	4,784.49	6,517.72
部分42年目	H 29	0.98858	1.00535	0.98484	0.99720	4%	1.2780	100.5	2,492.14	937.89	872.27	4,302.30	5,618.70	234.67	117.25	56.40	408.52	533.52	61.21	79.94	4,772.03	6,232.16
部分43年目	H 30	0.98858	1.00532	0.98461	0.99719	4%	1.2288	100.4	2,488.61	942.91	859.05	4,290.57	5,393.03	234.53	117.88	55.55	407.96	512.79	61.04	76.72	4,759.57	5,982.54
部分44年目	R 1	0.98858	1.00530	0.98437	0.99718	4%	1.1815	101.2	2,485.08	947.93	845.83	4,278.84	5,130.38	234.20	118.51	54.69	407.40	488.48	60.87	72.98	4,747.11	5,691.84
部分45年目	R 2	0.98858	1.00527	0.98412	0.99718	4%	1.1361	101.9	2,481.55	952.95	832.61	4,267.11	4,885.93	233.87	119.14	53.84	406.84	465.84	60.69	69.50	4,734.65	5,421.27
部分46年目	R 3	0.98858	1.00524	0.98387	0.99717	4%	1.0924	101.8	2,478.02	957.87	819.39	4,255.38	4,689.68	233.54	119.76	52.98	406.28					

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：近畿自動車道紀勢線 松原JCT～勢和多気JCT

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率 (近畿臨海ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間便益 (億円)					走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
	乗用車類								普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値	
		(基準年) R 6																				
部分供用開始	R 7	0.99857	0.98275	1.00513	0.99714	1%	0.9901	102.7	18.91	8.63	4.60	32.14	31.82	2.45	0.81	1.02	4.28	4.00	1.30	1.29	37.72	37.11
部分1年目	R 8	0.99857	0.98245	1.00511	0.99713	1%	0.9803	102.7	18.89	8.67	4.52	32.08	31.44	2.45	0.82	1.00	4.27	4.00	1.30	1.27	37.64	36.71
部分2年目	R 9	0.99856	0.98214	1.00508	0.99712	1%	0.9706	102.7	18.86	8.71	4.44	32.01	31.07	2.45	0.82	0.98	4.25	4.00	1.30	1.26	37.56	36.33
部分供用開始	R 10	0.99856	0.98181	1.00506	0.99711	1%	0.9610	102.7	41.21	14.76	8.44	64.41	61.90	5.94	1.65	1.32	8.91	9.00	2.45	2.36	75.76	73.26
部分供用開始	R 11	0.99856	0.98147	1.00503	0.99710	1%	0.9515	102.7	47.19	15.70	9.95	72.84	69.31	7.02	1.77	1.41	10.20	10.00	2.80	2.66	85.85	81.97
部分供用開始	R 12	0.99599	0.98948	1.00372	0.99639	1%	0.9421	102.7	54.02	18.91	10.85	83.77	78.92	7.14	1.71	1.38	10.23	10.00	2.85	2.69	96.85	91.61
部分供用開始	R 13	0.99597	0.98937	1.00370	0.99637	1%	0.9328	102.7	188.26	70.33	47.68	306.27	285.69	14.66	5.81	2.59	23.05	22.00	4.22	3.94	333.55	311.63
部分供用開始	R 14	0.99596	0.98926	1.00369	0.99636	1%	0.9236	102.7	208.51	79.81	52.63	340.94	314.90	15.67	6.34	2.69	24.70	23.00	4.39	4.05	370.04	341.95
部分8年目	R 15	0.99594	0.98914	1.00368	0.99635	1%	0.9145	102.7	207.67	80.10	52.06	339.83	310.78	15.61	6.36	2.66	24.63	23.00	4.37	4.00	368.84	337.78
部分9年目	R 16	0.99592	0.98902	1.00366	0.99633	1%	0.9054	102.7	206.83	80.40	51.49	338.72	306.67	15.55	6.39	2.63	24.56	22.00	4.36	3.95	367.64	332.62
供用開始年次	R 17	0.99591	0.98890	1.00365	0.99632	1%	0.8964	102.7	291.96	111.04	67.19	470.19	421.48	20.82	8.52	3.11	32.45	29.00	5.88	5.27	508.51	455.75
1年目	R 18	0.99589	0.98877	1.00364	0.99631	1%	0.8875	102.7	290.76	111.45	66.45	468.65	415.93	20.74	8.55	3.07	32.36	29.00	5.85	5.20	506.87	450.13
2年目	R 19	0.99587	0.98865	1.00362	0.99629	1%	0.8787	102.7	289.57	111.85	65.70	467.12	410.46	20.65	8.58	3.04	32.27	28.00	5.83	5.12	505.22	443.58
3年目	R 20	0.99586	0.98852	1.00361	0.99628	1%	0.8700	102.7	288.37	112.26	64.95	465.58	405.06	20.57	8.61	3.00	32.18	28.00	5.81	5.06	503.58	438.12
4年目	R 21	0.99584	0.98838	1.00360	0.99626	1%	0.8614	102.7	287.18	112.66	64.21	464.05	399.73	20.48	8.64	2.97	32.09	28.00	5.79	4.99	501.93	432.72
5年目	R 22	0.99119	0.99243	0.99987	0.99329	1%	0.8529	102.7	285.98	113.07	63.46	462.51	394.48	20.40	8.67	2.93	32.01	27.00	5.77	4.92	500.28	426.40
6年目	R 23	0.99112	0.99237	0.99987	0.99325	1%	0.8445	102.7	283.46	113.05	62.98	459.50	388.04	20.22	8.67	2.91	31.80	27.00	5.73	4.84	497.03	419.88
7年目	R 24	0.99104	0.99231	0.99987	0.99320	1%	0.8361	102.7	280.94	113.04	62.50	456.48	381.67	20.04	8.67	2.89	31.60	26.00	5.69	4.76	493.77	412.43
8年目	R 25	0.99095	0.99225	0.99987	0.99315	1%	0.8278	102.7	278.43	113.02	62.02	453.47	375.38	19.86	8.67	2.87	31.40	26.00	5.65	4.68	490.52	406.06
9年目	R 26	0.99087	0.99219	0.99987	0.99311	1%	0.8196	102.7	275.91	113.01	61.54	450.45	369.19	19.68	8.67	2.85	31.19	26.00	5.61	4.60	487.26	399.79
10年目	R 27	0.99079	0.99213	0.99987	0.99306	1%	0.8115	102.7	273.39	112.99	61.06	447.44	363.10	19.50	8.67	2.82	30.99	25.00	5.57	4.52	484.01	392.62
11年目	R 28	0.99070	0.99207	0.99987	0.99301	1%	0.8035	102.7	270.87	112.98	60.58	444.43	357.10	19.32	8.67	2.80	30.79	25.00	5.54	4.45	480.75	386.55
12年目	R 29	0.99062	0.99200	0.99987	0.99296	1%	0.7955	102.7	268.35	112.96	60.10	441.41	351.14	19.14	8.67	2.78	30.58	24.00	5.50	4.37	477.49	379.51
13年目	R 30	0.99053	0.99194	0.99987	0.99291	1%	0.7876	102.7	265.83	112.95	59.62	438.40	345.28	18.96	8.67	2.76	30.38	24.00	5.46	4.30	474.24	373.58
14年目	R 31	0.99044	0.99187	0.99987	0.99286	1%	0.7798	102.7	263.32	112.93	59.14	435.38	339.51	18.78	8.66	2.73	30.18	24.00	5.42	4.23	470.98	367.74
15年目	R 32	0.99034	0.99181	0.99987	0.99281	1%	0.7721	102.7	260.80	112.92	58.66	432.37	333.83	18.60	8.66	2.71	29.98	23.00	5.38	4.15	467.73	360.98
16年目	R 33	0.99025	0.99174	0.99987	0.99276	1%	0.7645	102.7	258.28	112.90	58.18	429.36	328.24	18.42	8.66	2.69	29.77	23.00	5.34	4.08	464.47	355.32
17年目	R 34	0.99015	0.99167	0.99987	0.99271	1%	0.7569	102.7	255.76	112.89	57.69	426.34	322.70	18.24	8.66	2.67	29.57	22.00	5.30	4.01	461.22	348.71
18年目	R 35	0.99006	0.99160	0.99987	0.99265	1%	0.7494	102.7	253.24	112.87	57.21	423.33	317.24	18.06	8.66	2.65	29.37	22.00	5.26	3.95	457.96	343.19
19年目	R 36	0.98996	0.99153	0.99987	0.99260	1%	0.7420	102.7	250.72	112.86	56.73	420.32	311.87	17.88	8.66	2.62	29.16	22.00	5.23	3.88	454.70	337.75
20年目	R 37	0.98985	0.99146	0.99987	0.99254	1%	0.7347	102.7	248.21	112.84	56.25	417.30	306.59	17.70	8.66	2.60	28.96	21.00	5.19	3.81	451.45	331.40
21年目	R 38	0.98975	0.99138	0.99987	0.99249	1%	0.7274	102.7	245.69	112.83	55.77	414.29	301.35	17.52	8.66	2.58	28.76	21.00	5.15	3.74	448.19	326.09
22年目	R 39	0.98964	0.99131	0.99987	0.99243	1%	0.7202	102.7	243.17	112.81	55.29	411.27	296.20	17.34	8.66	2.56	28.56	21.00	5.11	3.68	444.94	320.88
23年目	R 40	0.98953	0.99123	0.99987	0.99237	1%	0.7131	102.7	240.65	112.80	54.81	408.26	291.13	17.16	8.65	2.53	28.35	20.00	5.07	3.62	441.68	314.75
24年目	R 41	0.98942	0.99115	0.99987	0.99231	1%	0.7060	102.7	238.13	112.78	54.33	405.25	286.10	16.98	8.65	2.51	28.15	20.00	5.03	3.55	438.43	309.65
25年目	R 42	0.98932	0.99108	0.99987																		

再評価結果(令和7年度事業継続箇所)(原案)

担当課:

担当課長名:

事業名	一般国道42号(近畿自動車道紀勢線) 熊野道路			事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 中部地方整備局
起終点	自:三重県熊野市大泊町 至:三重県熊野市久生屋町					延長	6.7km
事業概要							
一般国道42号熊野道路は、三重県熊野市大泊町から熊野市久生屋町に至る延長6.7kmの自動車専用道路で、近畿自動車道紀勢線と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 並行する一般国道42号では、南海トラフ巨大地震等の大規模地震における緊急輸送道路の確保、高次救急医療機関へのアクセス等に課題があり、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援等を目的に整備を進めている。							
H26年度事業化		都市計画決定対象外		H28年度用地着手		R1年度工事着手	
全体事業費		438億円		事業進捗率(令和6年3月末時点)		約53% 供用済延長 0.0km	
計画交通量		6,800台/日					
費用対効果分析	B/C	EIRR	総費用		(残事業)/(事業全体)		総便益
	(事業全体)	(事業全体)	3,079/57,869億円		(残事業)/(事業全体)		8,037/357,443億円
	6.2(0.7)	27.3%	事業費: 2,639/46,191億円		走行時間短縮便益: 7,404/323,196億円		基準年 令和6年
	6.9(1.1) [2%]		維持管理費: 436/ 9,006億円		走行経費減少便益: 534/ 29,582億円		
	7.5(1.4) [1%]		更新費: 3.9/ 2,672億円		交通事故減少便益: 100/ 4,664億円		
	(残事業)	(残事業)	感度分析	(事業全体)		(残事業)	
2.6(1.5)	11.5%	交通量		B/C=5.6~6.8(±10%)	交通量	B/C=2.3~2.9(±10%)	
3.7(2.2) [2%]	事業費	B/C=6.2~6.2(±10%)		事業費	B/C=2.4~2.9(±10%)		
(参考)	4.5(2.7) [1%]	事業期間	B/C=6.2~6.2(±20%)	事業期間	B/C=2.5~2.9(±20%)		
事業の効果等							
①円滑なモビリティの確保 ・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 ・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する。(三重交通:熊野新宮線等)							
②物流効率化の支援 ・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。							
③国土・地域ネットワークの構築 ・高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり。							
④個性ある地域の形成 ・拠点開発プロジェクト(おわせSEAモデル)を支援する。 ・主要な観光地(世界遺産熊野古道)へのアクセス向上が期待される。							
⑤安全で安心できる暮らしの確保 ・三次医療機関(伊勢赤十字病院)へのアクセス向上が見込まれる。							
⑥災害への備え ・近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1~2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する。 ・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 ・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間(立石南~熊野大泊IC交差点間)の代替路線を形成する。 ・高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)として位置づけられている。							
⑦地球環境の保全 ・CO2排出量の削減が見込まれる。							
⑧生活環境の改善・保全 ・NO2排出量の削減が見込まれる。 ・SPM排出量の削減が見込まれる。							

⑨他のプロジェクトとの関係

・関連する大規模道路事業(近畿自動車道紀勢線)と一体的に整備する必要あり。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等:

熊野尾鷲道路建設促進既成同盟会、近畿自動車道紀勢線(熊野市～新宮市間)建設促進既成同盟会等より近畿自動車道紀勢線の全線早期完成の要望を受けている。

三重県知事の見解:

- ・対応方針(原案)のとおり、事業の継続について異存ありません。
- ・一般国道42号熊野道路は、広域的な交流・連携の促進を支えるとともに、近年頻発化・激甚化する台風・豪雨災害や、発生が危惧される南海トラフ地震による津波発生時において、現道(国道42号)とのダブルネットワークを形成し、災害時の救助・救急、医療活動を支える「命の道」となる重要な道路です。
- ・特に、第二次救急医療機関である尾鷲総合病院への搬送時間短縮により救急医療活動を支える極めて重要な道路となります。
- ・今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、一日も早く供用されることを求めます。
- ・なお、事業実施にあたっては、全体事業費が大幅に増となっていることから、最新の技術の活用も含め徹底したコスト縮減に努められたい。

事業評価監視委員会の意見

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・高速道路ネットワークの整備により、愛知県や関東方面からの観光客が増加。
- ・平成28年度は、「熊野トレイルランニングレース」が世界選手権代表選考大会に指定されたことで東海・近畿地域からの参加者が増加傾向。
- ・また、平成31年度には紀勢線が全線事業化。

事業の進捗状況、残事業の内容等

- ・事業進捗率は約53%、用地取得率は100%。(令和6年3月末時点)

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

- ・平成26年度より事業着手しており、早期開通に向けて用地買収および工事を推進。

施設の構造や工法の変更等

- ・地盤改良工では、ICT地盤改良工に取り組み、地盤改良機械の位置や施工状況を活用し、改良箇所、改良範囲に関わる施工履歴データを活用することにより施工管理、出来高、出来形管理の効率化を図る。
- ・今後も、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。

対応方針(原案)

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図



※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率(4%)を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。〔 〕内は社会的割引率の値)

※B/Cの値は、松原JCT～勢和多気JCTを対象とした場合、()書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道42号 熊野道路
事業区分	一般国道（高規格A'）
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

	指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている	費用便益比（B／C）＝0.7 （経済的純現在価値（B－C）＝-131億円、経済的内部収益率（E I R R）＝2.4％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	
	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：474.8万人・時間/年 渋滞損失削減時間：51.5万人・時間/年（276.7万人・時間/年⇒225.2万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：（該当区間名） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：11.4万人・時間/年（国道42号） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約7割削減（国道42号）
	□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上での踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	

1. 活力	円滑なモビリティの確保	☒ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	三重交通：熊野新宮線（29本/平日） 三重交通：名古屋南紀高速線（10本/日） 三重交通・西武バス：高速南紀東京大宮線（南紀勝浦線）（3本/日）
		☐ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		☐ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	☐ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		☒ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	近畿自動車道紀勢線との一体整備により農林水産物の大都市への輸送時間短縮、みかん：中京市場へ60%、県内へ21%、大阪市場へ7%出荷
		☐ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	☐ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		☐ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		☐ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		☐ 中心市街地内で行う事業である	
		☐ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		☐ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		☐ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	☒ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	並行する高速道路路線：近畿自動車道紀勢線
		☐ 地域高規格道路の位置づけあり	
		☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		☐ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		☐ 現道等における交通不能区間を解消する	
		☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		☐ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	

1. 活力	個性ある地域の形成	
	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	おわせSEAモデル
	■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	世界遺産熊野古道（R4 年間観光客入り込み数 約29万人/年）（勢和多気JCT～熊野速玉大社：85分⇒82分）
	☐ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	
	☐ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
	☐ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	
	☐ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	☐ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	
	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	伊勢赤十字病院（3次救急医療機関）へのアクセスが向上（御浜町役場、101分 ⇒ 97分）
3. 安全	安全な生活環境の確保	
	☐ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	☐ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	
	■ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	鬼ヶ城トンネル
	対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	三重県緊急輸送道路ネットワーク計画：第一次緊急輸送道路
	■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道42号（鬼ヶ城トンネル区間）が通行止め時の代替路（立石南～熊野大泊IC交差点間）
	■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	並行する高速道路路線：近畿自動車道紀勢線
	☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
	☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	

4. 環境		
	地球環境の保全	
	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：約2.1千/t
	生活環境の改善・保全	
	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別 NO2について環境基準を達成している測定局数の実績 (推計結果) 評価対象区間(現道／並行区間等)：(国道42号) 排出削減量：約10.4t／年、排出削減率：約6.6割削減 (バイパス事業の場合)バイパス等についてNOx排出増加量：約8.9t／年 NO2について環境基準を達成が見込まれる測定局数(推計を行っている場合)
	● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別 SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績 (推計結果) 評価対象区間(現道／並行区間等)：(国道42号) 排出削減量：約0.3t／年、排出削減率：約5.1割削減 (バイパス事業の場合)バイパス等についてSPM排出増加量：約0.4t／年 SPMについて最寄りの一般局と差があり、かつ環境基準を超過している自排局または常観局のうち道路寄与分の半減が見込まれる測定局数 (推計を行っている場合)
	☐ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
☐ その他、環境や景観上の効果が期待される		
5. その他		
	他のプロジェクトとの関係	
	■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	近畿自動車道紀勢線
	☐ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道42号	熊野道路	L=5.3km	高規格A'	ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
6,800	2	中部地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和6年度			
単純合計	400億円	70億円	0億円	470億円
うち残事業分	190億円	70億円	0億円	260億円
基準年における 現在価値 (C)	397億円	23億円	0億円	420億円
うち残事業分	165億円	23億円	0億円	188億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和6年度			
供 用 年	令和14年度			
単年便益 (初年便益)	17億円	1.5億円	0.23億円	19億円
基準年における 現在価値 (B)	262億円	24億円	3.5億円	289億円
うち残事業分	262億円	24億円	3.5億円	289億円

③ 結 果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	0.7 [4%]	[参考] 1.1 [2%]	[参考] 1.4 [1%]
経済的純現在価値（B－C）	-131億円 [4%]	[参考] 36億円 [2%]	[参考] 177億円 [1%]
経済的内部収益率（EIRR）	2.4%		

※〔 〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	1.5 [4%]	[参考] 2.2 [2%]	[参考] 2.7 [1%]
経済的純現在価値（B－C）	101億円 [4%]	[参考] 261億円 [2%]	[参考] 397億円 [1%]
経済的内部収益率（EIRR）	6.7%		

※〔 〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	6,800	±10%	0.6～0.8
事業費	400億円	±10%	0.7～0.7
事業期間	18年	±20%	0.6～0.7

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	6,800	±10%	1.4～1.7
事業費	190億円	±10%	1.4～1.7
事業期間	7年	±20%	1.4～1.6

交通状況の変化

様式－3①

事業名：一般国道42号 熊野道路（事業全体・残事業）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 熊野道路 5.3km		交通量※ ¹	[台/日]	－	6,800
		走行時間※ ²	[分]	－	4
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	－	5.61
②主な周 辺道路※ ⁴	国道42号 4.6km	交通量	[台/日]	13,000	7,300
		走行時間	[分]	9	7
		走行時間費用	[億円/年]	23.24	10.16
	鵜殿熊野 線 2.2km	交通量	[台/日]	5,800	3,800
		走行時間	[分]	5	4
		走行時間費用	[億円/年]	5.07	3.13
	③その他道路合計 329.4km		走行時間費用	[億円/年]	176.07

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：341.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	204.38	187.47	16.91

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名: 一般国道42号 熊野道路(事業全体・残事業)

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のため参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和6年度		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)	
		複数時点での推計	☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
		開発交通量の考慮	無	☒
	有		☐	
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日	
	考慮した理由を記載			
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	☐	
		転換率式を用いた配分	☐	
		Q-V式と転換率式の併用による配分	☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	☐	
		簡易手法	☐	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
			その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
その他()	☐			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	☒		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmax~Qmin)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	☐		
	採用理由を記載			
その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)	☐			

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	☐
			対象路線のみ考慮	☐
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	☐
	冬期交通の影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	☒		
	その他 ()	☐		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	☐		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	☐		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	☐		
	中央分離帯の有無を考慮しない	☒		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	☒		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	☐		
その他				

事業名: 一般国道42号 熊野道路(事業全体・残事業)

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定 算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☐	
		標準投資パターンを採用	☒	
		その他()	☐	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価(実績値)を使用		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☐	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		☒
		考慮する		☐
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	☐
維持管理費を考慮			☐	
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)				
その他				
4. その他 上記のほか、B/Cの算定にあたっての問題点があれば、記述。 				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純価値の算出（消費税相当額含む）

箇所名：一般国道42号 熊野道路(事業全体)

年次	年度 (基準年：R0)	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
							単価(億円) 0.29	延長(km) 5.3	単純価値(億円) 1.54	
-18年目	H 26	4%	1.4802	98.7	0.93	1.43				
-17年目	H 27	4%	1.4233	100.2	0.93	1.35				
-16年目	H 28	4%	1.3686	100.3	0.93	1.30				
-15年目	H 29	4%	1.3159	100.5	2.41	3.24				
-14年目	H 30	4%	1.2653	100.4	6.53	8.46				
-13年目	R 1	4%	1.2167	101.2	21.58	26.65				
-12年目	R 2	4%	1.1699	101.9	38.20	45.05				
-11年目	R 3	4%	1.1249	101.8	30.68	34.82				
-10年目	R 4	4%	1.0816	102.7	29.18	31.56				
-9年目	R 5	4%	1.0400	102.7	39.00	40.56				
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7	39.41	39.41				
-7年目	R 7	4%	0.9615	102.7	29.00	27.88				
-6年目	R 8	4%	0.9246	102.7	29.35	27.14				
-5年目	R 9	4%	0.8890	102.7	30.99	27.55				
-4年目	R 10	4%	0.8548	102.7	32.29	27.60				
-3年目	R 11	4%	0.8219	102.7	30.25	24.86				
-2年目	R 12	4%	0.7903	102.7	23.84	18.84				
-1年目	R 13	4%	0.7599	102.7	14.28	10.85				
供用開始年次	R 14	4%	0.7307	102.7			1.40	1.02		
1年目	R 15	4%	0.7026	102.7			1.40	0.98		
2年目	R 16	4%	0.6756	102.7			1.40	0.95		
3年目	R 17	4%	0.6496	102.7			1.40	0.91		
4年目	R 18	4%	0.6246	102.7			1.40	0.87		
5年目	R 19	4%	0.6006	102.7			1.40	0.84		
6年目	R 20	4%	0.5775	102.7			1.40	0.81		
7年目	R 21	4%	0.5553	102.7			1.40	0.78		
8年目	R 22	4%	0.5339	102.7			1.40	0.75		
9年目	R 23	4%	0.5134	102.7			1.40	0.72		
10年目	R 24	4%	0.4936	102.7			1.40	0.69		
11年目	R 25	4%	0.4746	102.7			1.40	0.66		
12年目	R 26	4%	0.4564	102.7			1.40	0.64		
13年目	R 27	4%	0.4388	102.7			1.40	0.61		
14年目	R 28	4%	0.4220	102.7			1.40	0.59		
15年目	R 29	4%	0.4057	102.7			1.40	0.57		
16年目	R 30	4%	0.3901	102.7			1.40	0.55		
17年目	R 31	4%	0.3751	102.7			1.40	0.53		
18年目	R 32	4%	0.3607	102.7			1.40	0.50		
19年目	R 33	4%	0.3468	102.7			1.40	0.49		
20年目	R 34	4%	0.3335	102.7			1.40	0.47		
21年目	R 35	4%	0.3207	102.7			1.40	0.45		
22年目	R 36	4%	0.3083	102.7			1.40	0.43		
23年目	R 37	4%	0.2965	102.7			1.40	0.42		
24年目	R 38	4%	0.2851	102.7			1.40	0.40		
25年目	R 39	4%	0.2741	102.7			1.40	0.38		
26年目	R 40	4%	0.2636	102.7			1.40	0.37		
27年目	R 41	4%	0.2534	102.7			1.40	0.35		
28年目	R 42	4%	0.2437	102.7			1.40	0.34		
29年目	R 43	4%	0.2343	102.7			1.40	0.33		
30年目	R 44	4%	0.2253	102.7			1.40	0.32		
31年目	R 45	4%	0.2166	102.7			1.40	0.30		
32年目	R 46	4%	0.2083	102.7			1.40	0.29		
33年目	R 47	4%	0.2003	102.7			1.40	0.28		
34年目	R 48	4%	0.1926	102.7			1.40	0.27		
35年目	R 49	4%	0.1852	102.7			1.40	0.26		
36年目	R 50	4%	0.1780	102.7			1.40	0.25		
37年目	R 51	4%	0.1712	102.7			1.40	0.24		
38年目	R 52	4%	0.1646	102.7			1.40	0.23		
39年目	R 53	4%	0.1583	102.7			1.40	0.22		
40年目	R 54	4%	0.1522	102.7			1.40	0.21		
41年目	R 55	4%	0.1463	102.7			1.40	0.20		
42年目	R 56	4%	0.1407	102.7			1.40	0.20		
43年目	R 57	4%	0.1353	102.7			1.40	0.19		
44年目	R 58	4%	0.1301	102.7			1.40	0.18		
45年目	R 59	4%	0.1251	102.7			1.40	0.18		
46年目	R 60	4%	0.1203	102.7			1.40	0.17		
47年目	R 61	4%	0.1157	102.7			1.40	0.16		
48年目	R 62	4%	0.1112	102.7			1.40	0.16		
49年目	R 63	4%	0.1069	102.7	-15.37	-1.64	1.40	0.15		
合計					384.41	396.91	70.00	22.86	0.00	0.00
単純事業費計					399.78		70.00		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 熊野道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度 (基準年：R6)	社会的 割引率	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7						
-7年目	R 7	4%	0.9615	102.7	29.00	27.88				
-6年目	R 8	4%	0.9246	102.7	29.35	27.14				
-5年目	R 9	4%	0.8890	102.7	30.99	27.55				
-4年目	R 10	4%	0.8548	102.7	32.29	27.60				
-3年目	R 11	4%	0.8219	102.7	30.25	24.86				
-2年目	R 12	4%	0.7903	102.7	23.84	18.84				
-1年目	R 13	4%	0.7599	102.7	14.28	10.85				
供用開始年次	R 14	4%	0.7307	102.7			1.40	1.02		
1年目	R 15	4%	0.7026	102.7			1.40	0.98		
2年目	R 16	4%	0.6756	102.7			1.40	0.95		
3年目	R 17	4%	0.6496	102.7			1.40	0.91		
4年目	R 18	4%	0.6246	102.7			1.40	0.87		
5年目	R 19	4%	0.6006	102.7			1.40	0.84		
6年目	R 20	4%	0.5775	102.7			1.40	0.81		
7年目	R 21	4%	0.5553	102.7			1.40	0.78		
8年目	R 22	4%	0.5339	102.7			1.40	0.75		
9年目	R 23	4%	0.5134	102.7			1.40	0.72		
10年目	R 24	4%	0.4936	102.7			1.40	0.69		
11年目	R 25	4%	0.4746	102.7			1.40	0.66		
12年目	R 26	4%	0.4564	102.7			1.40	0.64		
13年目	R 27	4%	0.4388	102.7			1.40	0.61		
14年目	R 28	4%	0.4220	102.7			1.40	0.59		
15年目	R 29	4%	0.4057	102.7			1.40	0.57		
16年目	R 30	4%	0.3901	102.7			1.40	0.55		
17年目	R 31	4%	0.3751	102.7			1.40	0.53		
18年目	R 32	4%	0.3607	102.7			1.40	0.50		
19年目	R 33	4%	0.3468	102.7			1.40	0.49		
20年目	R 34	4%	0.3335	102.7			1.40	0.47		
21年目	R 35	4%	0.3207	102.7			1.40	0.45		
22年目	R 36	4%	0.3083	102.7			1.40	0.43		
23年目	R 37	4%	0.2965	102.7			1.40	0.42		
24年目	R 38	4%	0.2851	102.7			1.40	0.40		
25年目	R 39	4%	0.2741	102.7			1.40	0.38		
26年目	R 40	4%	0.2636	102.7			1.40	0.37		
27年目	R 41	4%	0.2534	102.7			1.40	0.35		
28年目	R 42	4%	0.2437	102.7			1.40	0.34		
29年目	R 43	4%	0.2343	102.7			1.40	0.33		
30年目	R 44	4%	0.2253	102.7			1.40	0.32		
31年目	R 45	4%	0.2166	102.7			1.40	0.30		
32年目	R 46	4%	0.2083	102.7			1.40	0.29		
33年目	R 47	4%	0.2003	102.7			1.40	0.28		
34年目	R 48	4%	0.1926	102.7			1.40	0.27		
35年目	R 49	4%	0.1852	102.7			1.40	0.26		
36年目	R 50	4%	0.1780	102.7			1.40	0.25		
37年目	R 51	4%	0.1712	102.7			1.40	0.24		
38年目	R 52	4%	0.1646	102.7			1.40	0.23		
39年目	R 53	4%	0.1583	102.7			1.40	0.22		
40年目	R 54	4%	0.1522	102.7			1.40	0.21		
41年目	R 55	4%	0.1463	102.7			1.40	0.20		
42年目	R 56	4%	0.1407	102.7			1.40	0.20		
43年目	R 57	4%	0.1353	102.7			1.40	0.19		
44年目	R 58	4%	0.1301	102.7			1.40	0.18		
45年目	R 59	4%	0.1251	102.7			1.40	0.18		
46年目	R 60	4%	0.1203	102.7			1.40	0.17		
47年目	R 61	4%	0.1157	102.7			1.40	0.16		
48年目	R 62	4%	0.1112	102.7			1.40	0.16		
49年目	R 63	4%	0.1069	102.7			1.40	0.15		
合計					190.00	164.72	70.00	22.86	0.00	0.00
単純事業費計					190.00		70.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

箇所名:一般国道42号 能野道路(事業全体・残事業)

41

費用の現在価値算定表

箇所名: 一般国道42号 熊野道路(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度 (基準年: R6)	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
									0.29	5.3
									1.54	
-18年目	H 26	4%	1.4516	98.7	0.93	1.40				
-17年目	H 27	4%	1.3958	100.2	0.93	1.32				
-16年目	H 28	4%	1.3421	100.3	0.93	1.28				
-15年目	H 29	4%	1.2905	100.5	2.41	3.17				
-14年目	H 30	4%	1.2409	100.4	6.53	8.29				
-13年目	R 1	4%	1.1932	101.2	21.58	26.14				
-12年目	R 2	4%	1.1473	101.9	38.20	44.18				
-11年目	R 3	4%	1.1032	101.8	30.68	34.14				
-10年目	R 4	4%	1.0608	102.7	27.36	29.03				
-9年目	R 5	2%	1.0200	102.7	39.00	39.78				
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7	39.41	39.41				
-7年目	R 7	2%	0.9804	102.7	29.00	28.43				
-6年目	R 8	2%	0.9612	102.7	29.35	28.22				
-5年目	R 9	2%	0.9423	102.7	31.35	29.55				
-4年目	R 10	2%	0.9238	102.7	32.65	30.17				
-3年目	R 11	2%	0.9057	102.7	30.61	27.72				
-2年目	R 12	2%	0.8880	102.7	24.20	21.49				
-1年目	R 13	2%	0.8706	102.7	14.65	12.75				
供用開始年次	R 14	2%	0.8535	102.7			1.40	1.19		
1年目	R 15	2%	0.8368	102.7			1.40	1.17		
2年目	R 16	2%	0.8203	102.7			1.40	1.15		
3年目	R 17	2%	0.8043	102.7			1.40	1.13		
4年目	R 18	2%	0.7885	102.7			1.40	1.10		
5年目	R 19	2%	0.7730	102.7			1.40	1.08		
6年目	R 20	2%	0.7579	102.7			1.40	1.06		
7年目	R 21	2%	0.7430	102.7			1.40	1.04		
8年目	R 22	2%	0.7284	102.7			1.40	1.02		
9年目	R 23	2%	0.7142	102.7			1.40	1.00		
10年目	R 24	2%	0.7002	102.7			1.40	0.98		
11年目	R 25	2%	0.6864	102.7			1.40	0.96		
12年目	R 26	2%	0.6730	102.7			1.40	0.94		
13年目	R 27	2%	0.6598	102.7			1.40	0.92		
14年目	R 28	2%	0.6468	102.7			1.40	0.91		
15年目	R 29	2%	0.6342	102.7			1.40	0.89		
16年目	R 30	2%	0.6217	102.7			1.40	0.87		
17年目	R 31	2%	0.6095	102.7			1.40	0.85		
18年目	R 32	2%	0.5976	102.7			1.40	0.84		
19年目	R 33	2%	0.5859	102.7			1.40	0.82		
20年目	R 34	2%	0.5744	102.7			1.40	0.80		
21年目	R 35	2%	0.5631	102.7			1.40	0.79		
22年目	R 36	2%	0.5521	102.7			1.40	0.77		
23年目	R 37	2%	0.5412	102.7			1.40	0.76		
24年目	R 38	2%	0.5306	102.7			1.40	0.74		
25年目	R 39	2%	0.5202	102.7			1.40	0.73		
26年目	R 40	2%	0.5100	102.7			1.40	0.71		
27年目	R 41	2%	0.5000	102.7			1.40	0.70		
28年目	R 42	2%	0.4902	102.7			1.40	0.69		
29年目	R 43	2%	0.4806	102.7			1.40	0.67		
30年目	R 44	2%	0.4712	102.7			1.40	0.66		
31年目	R 45	2%	0.4619	102.7			1.40	0.65		
32年目	R 46	2%	0.4529	102.7			1.40	0.63		
33年目	R 47	2%	0.4440	102.7			1.40	0.62		
34年目	R 48	2%	0.4353	102.7			1.40	0.61		
35年目	R 49	2%	0.4268	102.7			1.40	0.60		
36年目	R 50	2%	0.4184	102.7			1.40	0.59		
37年目	R 51	2%	0.4102	102.7			1.40	0.57		
38年目	R 52	2%	0.4022	102.7			1.40	0.56		
39年目	R 53	2%	0.3943	102.7			1.40	0.55		
40年目	R 54	2%	0.3865	102.7			1.40	0.54		
41年目	R 55	2%	0.3790	102.7			1.40	0.53		
42年目	R 56	2%	0.3715	102.7			1.40	0.52		
43年目	R 57	2%	0.3642	102.7			1.40	0.51		
44年目	R 58	2%	0.3571	102.7			1.40	0.50		
45年目	R 59	2%	0.3501	102.7			1.40	0.49		
46年目	R 60	2%	0.3432	102.7			1.40	0.48		
47年目	R 61	2%	0.3365	102.7			1.40	0.47		
48年目	R 62	2%	0.3299	102.7			1.40	0.46		
49年目	R 63	2%	0.3234	102.7	-15.37	-4.97	1.40	0.45		
合計					384.41	401.50	70.00	38.30	0.00	0.00
単純事業費計					399.78		70.00		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 熊野道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道42号 熊野道路(残事業)					単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
					0.29		5.3		1.54	
年次	年度 (基準年：R6)	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-7年目	R 7	2%	0.9804	102.7	29.00	28.43				
-6年目	R 8	2%	0.9612	102.7	29.35	28.22				
-5年目	R 9	2%	0.9423	102.7	30.99	29.20				
-4年目	R 10	2%	0.9238	102.7	32.29	29.83				
-3年目	R 11	2%	0.9057	102.7	30.25	27.39				
-2年目	R 12	2%	0.8880	102.7	23.84	21.17				
-1年目	R 13	2%	0.8706	102.7	14.28	12.43				
供用開始年次	R 14	2%	0.8535	102.7			1.40	1.19		
1年目	R 15	2%	0.8368	102.7			1.40	1.17		
2年目	R 16	2%	0.8203	102.7			1.40	1.15		
3年目	R 17	2%	0.8043	102.7			1.40	1.13		
4年目	R 18	2%	0.7885	102.7			1.40	1.10		
5年目	R 19	2%	0.7730	102.7			1.40	1.08		
6年目	R 20	2%	0.7579	102.7			1.40	1.06		
7年目	R 21	2%	0.7430	102.7			1.40	1.04		
8年目	R 22	2%	0.7284	102.7			1.40	1.02		
9年目	R 23	2%	0.7142	102.7			1.40	1.00		
10年目	R 24	2%	0.7002	102.7			1.40	0.98		
11年目	R 25	2%	0.6864	102.7			1.40	0.96		
12年目	R 26	2%	0.6730	102.7			1.40	0.94		
13年目	R 27	2%	0.6598	102.7			1.40	0.92		
14年目	R 28	2%	0.6468	102.7			1.40	0.91		
15年目	R 29	2%	0.6342	102.7			1.40	0.89		
16年目	R 30	2%	0.6217	102.7			1.40	0.87		
17年目	R 31	2%	0.6095	102.7			1.40	0.85		
18年目	R 32	2%	0.5976	102.7			1.40	0.84		
19年目	R 33	2%	0.5859	102.7			1.40	0.82		
20年目	R 34	2%	0.5744	102.7			1.40	0.80		
21年目	R 35	2%	0.5631	102.7			1.40	0.79		
22年目	R 36	2%	0.5521	102.7			1.40	0.77		
23年目	R 37	2%	0.5412	102.7			1.40	0.76		
24年目	R 38	2%	0.5306	102.7			1.40	0.74		
25年目	R 39	2%	0.5202	102.7			1.40	0.73		
26年目	R 40	2%	0.5100	102.7			1.40	0.71		
27年目	R 41	2%	0.5000	102.7			1.40	0.70		
28年目	R 42	2%	0.4902	102.7			1.40	0.69		
29年目	R 43	2%	0.4806	102.7			1.40	0.67		
30年目	R 44	2%	0.4712	102.7			1.40	0.66		
31年目	R 45	2%	0.4619	102.7			1.40	0.65		
32年目	R 46	2%	0.4529	102.7			1.40	0.63		
33年目	R 47	2%	0.4440	102.7			1.40	0.62		
34年目	R 48	2%	0.4353	102.7			1.40	0.61		
35年目	R 49	2%	0.4268	102.7			1.40	0.60		
36年目	R 50	2%	0.4184	102.7			1.40	0.59		
37年目	R 51	2%	0.4102	102.7			1.40	0.57		
38年目	R 52	2%	0.4022	102.7			1.40	0.56		
39年目	R 53	2%	0.3943	102.7			1.40	0.55		
40年目	R 54	2%	0.3865	102.7			1.40	0.54		
41年目	R 55	2%	0.3790	102.7			1.40	0.53		
42年目	R 56	2%	0.3715	102.7			1.40	0.52		
43年目	R 57	2%	0.3642	102.7			1.40	0.51		
44年目	R 58	2%	0.3571	102.7			1.40	0.50		
45年目	R 59	2%	0.3501	102.7			1.40	0.49		
46年目	R 60	2%	0.3432	102.7			1.40	0.48		
47年目	R 61	2%	0.3365	102.7			1.40	0.47		
48年目	R 62	2%	0.3299	102.7			1.40	0.46		
49年目	R 63	2%	0.3234	102.7			1.40	0.45		
合計					190.00	176.67	70.00	38.30	0.00	0.00
単純事業費計					190.00		70.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

箇所名:一般国道42号 熊野道路(事業全体・残事業)

44

費用の現在価値算定表

箇所名: 一般国道42号 熊野道路(事業全体)

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度 (基準年: R6)	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
									0.29	5.3
									1.54	
-18年目	H 26	4%	1.4376	98.7	0.93	1.39				
-17年目	H 27	4%	1.3823	100.2	0.93	1.31				
-16年目	H 28	4%	1.3291	100.3	0.93	1.26				
-15年目	H 29	4%	1.2780	100.5	2.41	3.14				
-14年目	H 30	4%	1.2288	100.4	6.53	8.21				
-13年目	R 1	4%	1.1815	101.2	21.58	25.88				
-12年目	R 2	4%	1.1361	101.9	38.20	43.74				
-11年目	R 3	4%	1.0924	101.8	30.68	33.81				
-10年目	R 4	4%	1.0504	102.7	27.36	28.74				
-9年目	R 5	1%	1.0100	102.7	39.00	39.39				
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7	39.41	39.41				
-7年目	R 7	1%	0.9901	102.7	29.00	28.71				
-6年目	R 8	1%	0.9803	102.7	29.35	28.78				
-5年目	R 9	1%	0.9706	102.7	31.35	30.43				
-4年目	R 10	1%	0.9610	102.7	32.65	31.38				
-3年目	R 11	1%	0.9515	102.7	30.61	29.12				
-2年目	R 12	1%	0.9420	102.7	24.20	22.80				
-1年目	R 13	1%	0.9327	102.7	14.65	13.66				
供用開始年次	R 14	1%	0.9235	102.7			1.40	1.29		
1年目	R 15	1%	0.9143	102.7			1.40	1.28		
2年目	R 16	1%	0.9053	102.7			1.40	1.27		
3年目	R 17	1%	0.8963	102.7			1.40	1.25		
4年目	R 18	1%	0.8874	102.7			1.40	1.24		
5年目	R 19	1%	0.8787	102.7			1.40	1.23		
6年目	R 20	1%	0.8700	102.7			1.40	1.22		
7年目	R 21	1%	0.8613	102.7			1.40	1.21		
8年目	R 22	1%	0.8528	102.7			1.40	1.19		
9年目	R 23	1%	0.8444	102.7			1.40	1.18		
10年目	R 24	1%	0.8360	102.7			1.40	1.17		
11年目	R 25	1%	0.8277	102.7			1.40	1.16		
12年目	R 26	1%	0.8195	102.7			1.40	1.15		
13年目	R 27	1%	0.8114	102.7			1.40	1.14		
14年目	R 28	1%	0.8034	102.7			1.40	1.12		
15年目	R 29	1%	0.7954	102.7			1.40	1.11		
16年目	R 30	1%	0.7876	102.7			1.40	1.10		
17年目	R 31	1%	0.7798	102.7			1.40	1.09		
18年目	R 32	1%	0.7720	102.7			1.40	1.08		
19年目	R 33	1%	0.7644	102.7			1.40	1.07		
20年目	R 34	1%	0.7568	102.7			1.40	1.06		
21年目	R 35	1%	0.7493	102.7			1.40	1.05		
22年目	R 36	1%	0.7419	102.7			1.40	1.04		
23年目	R 37	1%	0.7346	102.7			1.40	1.03		
24年目	R 38	1%	0.7273	102.7			1.40	1.02		
25年目	R 39	1%	0.7201	102.7			1.40	1.01		
26年目	R 40	1%	0.7130	102.7			1.40	1.00		
27年目	R 41	1%	0.7059	102.7			1.40	0.99		
28年目	R 42	1%	0.6989	102.7			1.40	0.98		
29年目	R 43	1%	0.6920	102.7			1.40	0.97		
30年目	R 44	1%	0.6852	102.7			1.40	0.96		
31年目	R 45	1%	0.6784	102.7			1.40	0.95		
32年目	R 46	1%	0.6717	102.7			1.40	0.94		
33年目	R 47	1%	0.6650	102.7			1.40	0.93		
34年目	R 48	1%	0.6584	102.7			1.40	0.92		
35年目	R 49	1%	0.6519	102.7			1.40	0.91		
36年目	R 50	1%	0.6454	102.7			1.40	0.90		
37年目	R 51	1%	0.6391	102.7			1.40	0.89		
38年目	R 52	1%	0.6327	102.7			1.40	0.89		
39年目	R 53	1%	0.6265	102.7			1.40	0.88		
40年目	R 54	1%	0.6203	102.7			1.40	0.87		
41年目	R 55	1%	0.6141	102.7			1.40	0.86		
42年目	R 56	1%	0.6080	102.7			1.40	0.85		
43年目	R 57	1%	0.6020	102.7			1.40	0.84		
44年目	R 58	1%	0.5961	102.7			1.40	0.83		
45年目	R 59	1%	0.5902	102.7			1.40	0.83		
46年目	R 60	1%	0.5843	102.7			1.40	0.82		
47年目	R 61	1%	0.5785	102.7			1.40	0.81		
48年目	R 62	1%	0.5728	102.7			1.40	0.80		
49年目	R 63	1%	0.5671	102.7	-15.37	-8.72	1.40	0.79		
合計					384.41	402.44	70.00	51.18	0.00	0.00
単純事業費計					399.78		70.00		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 熊野道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.29		5.3		1.54	
年次	年度 (基準年：R6)	社会的 割引率	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-7年目	R 7	1%	0.9901	102.7	29.00	28.71				
-6年目	R 8	1%	0.9803	102.7	29.35	28.78				
-5年目	R 9	1%	0.9706	102.7	30.99	30.08				
-4年目	R 10	1%	0.9610	102.7	32.29	31.03				
-3年目	R 11	1%	0.9515	102.7	30.25	28.78				
-2年目	R 12	1%	0.9420	102.7	23.84	22.45				
-1年目	R 13	1%	0.9327	102.7	14.28	13.32				
供用開始年次	R 14	1%	0.9235	102.7			1.40	1.29		
1年目	R 15	1%	0.9143	102.7			1.40	1.28		
2年目	R 16	1%	0.9053	102.7			1.40	1.27		
3年目	R 17	1%	0.8963	102.7			1.40	1.25		
4年目	R 18	1%	0.8874	102.7			1.40	1.24		
5年目	R 19	1%	0.8787	102.7			1.40	1.23		
6年目	R 20	1%	0.8700	102.7			1.40	1.22		
7年目	R 21	1%	0.8613	102.7			1.40	1.21		
8年目	R 22	1%	0.8528	102.7			1.40	1.19		
9年目	R 23	1%	0.8444	102.7			1.40	1.18		
10年目	R 24	1%	0.8360	102.7			1.40	1.17		
11年目	R 25	1%	0.8277	102.7			1.40	1.16		
12年目	R 26	1%	0.8195	102.7			1.40	1.15		
13年目	R 27	1%	0.8114	102.7			1.40	1.14		
14年目	R 28	1%	0.8034	102.7			1.40	1.12		
15年目	R 29	1%	0.7954	102.7			1.40	1.11		
16年目	R 30	1%	0.7876	102.7			1.40	1.10		
17年目	R 31	1%	0.7798	102.7			1.40	1.09		
18年目	R 32	1%	0.7720	102.7			1.40	1.08		
19年目	R 33	1%	0.7644	102.7			1.40	1.07		
20年目	R 34	1%	0.7568	102.7			1.40	1.06		
21年目	R 35	1%	0.7493	102.7			1.40	1.05		
22年目	R 36	1%	0.7419	102.7			1.40	1.04		
23年目	R 37	1%	0.7346	102.7			1.40	1.03		
24年目	R 38	1%	0.7273	102.7			1.40	1.02		
25年目	R 39	1%	0.7201	102.7			1.40	1.01		
26年目	R 40	1%	0.7130	102.7			1.40	1.00		
27年目	R 41	1%	0.7059	102.7			1.40	0.99		
28年目	R 42	1%	0.6989	102.7			1.40	0.98		
29年目	R 43	1%	0.6920	102.7			1.40	0.97		
30年目	R 44	1%	0.6852	102.7			1.40	0.96		
31年目	R 45	1%	0.6784	102.7			1.40	0.95		
32年目	R 46	1%	0.6717	102.7			1.40	0.94		
33年目	R 47	1%	0.6650	102.7			1.40	0.93		
34年目	R 48	1%	0.6584	102.7			1.40	0.92		
35年目	R 49	1%	0.6519	102.7			1.40	0.91		
36年目	R 50	1%	0.6454	102.7			1.40	0.90		
37年目	R 51	1%	0.6391	102.7			1.40	0.89		
38年目	R 52	1%	0.6327	102.7			1.40	0.89		
39年目	R 53	1%	0.6265	102.7			1.40	0.88		
40年目	R 54	1%	0.6203	102.7			1.40	0.87		
41年目	R 55	1%	0.6141	102.7			1.40	0.86		
42年目	R 56	1%	0.6080	102.7			1.40	0.85		
43年目	R 57	1%	0.6020	102.7			1.40	0.84		
44年目	R 58	1%	0.5961	102.7			1.40	0.83		
45年目	R 59	1%	0.5902	102.7			1.40	0.83		
46年目	R 60	1%	0.5843	102.7			1.40	0.82		
47年目	R 61	1%	0.5785	102.7			1.40	0.81		
48年目	R 62	1%	0.5728	102.7			1.40	0.80		
49年目	R 63	1%	0.5671	102.7			1.40	0.79		
合計					190.00	183.15	70.00	51.18	0.00	0.00
単純事業費計					190.00		70.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 熊野道路(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R6年	総走行台別の年次別伸び率 東海ブロック				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 14	0.99896	1.00665	0.99097	0.99897	1%	0.9235	102.7	9.11	5.14	2.66	16.91	15.62	0.87	0.52	0.13	1.52	1.41	0.23	0.21	18.66	17.23
1年目	R 15	0.99896	1.00660	0.99089	0.99897	1%	0.9143	102.7	9.10	5.17	2.64	16.91	15.46	0.87	0.53	0.13	1.52	1.39	0.23	0.21	18.66	17.06
2年目	R 16	0.99896	1.00656	0.99080	0.99897	1%	0.9053	102.7	9.09	5.21	2.61	16.91	15.31	0.86	0.53	0.13	1.52	1.38	0.23	0.21	18.67	16.90
3年目	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	1%	0.8963	102.7	9.08	5.24	2.59	16.91	15.16	0.86	0.54	0.13	1.53	1.37	0.23	0.21	18.67	16.73
4年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	1%	0.8874	102.7	9.07	5.28	2.56	16.91	15.01	0.86	0.54	0.13	1.53	1.36	0.23	0.20	18.67	16.57
5年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	1%	0.8787	102.7	9.06	5.31	2.54	16.91	14.86	0.86	0.54	0.13	1.53	1.34	0.23	0.20	18.67	16.41
6年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	1%	0.8700	102.7	9.05	5.34	2.52	16.91	14.71	0.86	0.55	0.12	1.53	1.33	0.23	0.20	18.67	16.24
7年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	1%	0.8613	102.7	9.04	5.38	2.49	16.91	14.57	0.86	0.55	0.12	1.53	1.32	0.23	0.20	18.67	16.08
8年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	1%	0.8528	102.7	9.03	5.41	2.47	16.91	14.42	0.86	0.55	0.12	1.53	1.31	0.23	0.20	18.68	15.93
9年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	1%	0.8444	102.7	8.97	5.41	2.45	16.83	14.21	0.85	0.55	0.12	1.53	1.29	0.23	0.19	18.58	15.69
10年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	1%	0.8360	102.7	8.90	5.41	2.43	16.74	13.99	0.85	0.55	0.12	1.52	1.27	0.23	0.19	18.48	15.45
11年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	1%	0.8277	102.7	8.83	5.41	2.41	16.65	13.78	0.84	0.55	0.12	1.51	1.25	0.22	0.19	18.39	15.22
12年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	1%	0.8195	102.7	8.76	5.41	2.39	16.57	13.58	0.83	0.55	0.12	1.50	1.23	0.22	0.18	18.29	14.99
13年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	1%	0.8114	102.7	8.70	5.41	2.38	16.48	13.37	0.83	0.55	0.12	1.50	1.21	0.22	0.18	18.20	14.77
14年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	1%	0.8034	102.7	8.63	5.41	2.36	16.39	13.17	0.82	0.55	0.12	1.49	1.20	0.22	0.18	18.10	14.54
15年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	1%	0.7954	102.7	8.56	5.41	2.34	16.31	12.97	0.81	0.55	0.12	1.48	1.18	0.22	0.17	18.01	14.32
16年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	1%	0.7876	102.7	8.49	5.41	2.32	16.22	12.78	0.81	0.55	0.11	1.47	1.16	0.22	0.17	17.91	14.11
17年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	1%	0.7798	102.7	8.43	5.40	2.30	16.13	12.58	0.80	0.55	0.11	1.47	1.14	0.22	0.17	17.82	13.89
18年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	1%	0.7720	102.7	8.36	5.40	2.28	16.05	12.39	0.80	0.55	0.11	1.46	1.13	0.22	0.17	17.72	13.68
19年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	1%	0.7644	102.7	8.29	5.40	2.27	15.96	12.20	0.79	0.55	0.11	1.45	1.11	0.21	0.16	17.63	13.47
20年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	1%	0.7568	102.7	8.22	5.40	2.25	15.87	12.01	0.78	0.55	0.11	1.44	1.09	0.21	0.16	17.53	13.27
21年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	1%	0.7493	102.7	8.16	5.40	2.23	15.79	11.83	0.78	0.55	0.11	1.44	1.08	0.21	0.16	17.43	13.06
22年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	1%	0.7419	102.7	8.09	5.40	2.21	15.70	11.65	0.77	0.55	0.11	1.43	1.06	0.21	0.16	17.34	12.86
23年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	1%	0.7346	102.7	8.02	5.40	2.19	15.61	11.47	0.76	0.55	0.11	1.42	1.04	0.21	0.15	17.24	12.67
24年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	1%	0.7273	102.7	7.95	5.40	2.17	15.53	11.29	0.76	0.55	0.11	1.41	1.03	0.21	0.15	17.15	12.47
25年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	1%	0.7201	102.7	7.89	5.40	2.16	15.44	11.12	0.75	0.55	0.11	1.41	1.01	0.21	0.15	17.05	12.28
26年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	1%	0.7130	102.7	7.82	5.40	2.14	15.35	10.95	0.74	0.55	0.11	1.40	1.00	0.20	0.15	16.96	12.09
27年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	1%	0.7059	102.7	7.75	5.40	2.12	15.27	10.78	0.74	0.55	0.10	1.39	0.98	0.20	0.14	16.86	11.90
28年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99127	0.99311	1%	0.6989	102.7	7.68	5.40	2.10	15.18	10.61	0.73	0.55	0.10	1.39	0.97	0.20	0.14	16.77	11.72
29年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	1%	0.6920	102.7	7.62	5.39	2.08	15.09	10.44	0.72	0.55	0.10	1.38	0.95	0.20	0.14	16.67	11.54
30年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	1%	0.6852	102.7	7.55	5.39	2.06	15.01	10.28	0.72	0.55	0.10	1.37	0.94	0.20	0.14	16.58	11.36
31年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	1%	0.6784	102.7	7.48	5.39	2.05	14.92	10.12	0.71	0.55	0.10	1.36	0.92	0.20	0.13	16.48	11.18
32年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	1%	0.6717	102.7	7.41	5.39	2.03	14.83	9.96	0.71	0.55	0.10	1.36	0.91	0.20	0.13	16.38	11.01
33年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	1%	0.6650	102.7	7.35	5.39	2.01	14.75	9.81	0.70	0.55	0.10	1.35	0.90	0.19	0.13	16.29	10.83
34年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99079	0.99281	1%	0.6584	102.7	7.28	5.39	1.99	14.66	9.65	0.69	0.55	0.10	1.34	0.88	0.19	0.13	16.19	10.66
35年目	R 49	0.99065	0.99984	0.99070	0.99276	1%	0.6519	102.7	7.21	5.39	1.97	14.57	9.50	0.69	0.55	0.10	1.33	0.87	0.19	0.12	16.10	10.49
36年目	R 50	0.99056	0.99984	0.99061	0.99270	1%	0.6454	102.7	7.14	5.39	1.95	14.49	9.35	0.68	0.55	0.10	1.33	0.86	0.19	0.12	16.00	10.33
37年目	R 51	0.99047	0.99984	0.99052	0.99265	1%	0.6391	102.7	7.08	5.39	1.94	14.40	9.20	0.67	0.55	0.10	1.32	0.84	0.19	0.12	15.91	10.17
38年目	R 52	0.99038	0.99984	0.99043	0.99260	1%	0.6327	102.7	7.01	5.39	1.92	14.31	9.06	0.67	0.55	0.09	1.31	0.83	0.19	0.12	15.81	10.00
39年目	R 53	0.99028	0.99984	0.99034	0.99254	1%	0.6265	102.7	6.94	5.39	1.90	14.23	8.91	0.66	0.55	0.09	1.30	0.82	0.19	0.12	15.72	9.85
40年目	R 54	0.99019	0.99984	0.99025	0.99248	1%	0.6203	102.7	6.87	5.38	1.88	14.14	8.77	0.65	0.55	0.09	1.30	0.80	0.18	0.11	15.62	9.69
41年目	R 55	0.99009	0.99984	0.99015	0.99243	1%	0.6141	102.7	6.81	5.38	1.86	14.05	8.63	0.65	0.55	0.09	1.29	0.79	0.18	0.11	15.53	9.53
42年目	R 56	0.98999	0.99984	0.99005	0.99237	1%	0.6080	102.7	7.01	5.39	1.92	14.31	8.70	0.67	0.55	0.09	1.31	0.80	0.19	0.11	15.81	9.61
43年目	R 57	0.98989	0.99984	0.98995	0.99231	1%	0.6020	102.7	6.94	5.39	1.90	14.22	8.56	0.66	0.55	0.09	1.30	0.78	0.19	0.11	15.71	9.46
44年目	R 58	0.98979	0.99984	0.98985	0.99225	1%	0.5961	102.7	6.87	5.38	1.88	14.13	8.42									

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道42号	熊野道路	2	6.7km

■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					37,301	
	改良費				5,733	
		土工	m ³	786,000	1,901	
		軟弱地盤改良工	m ³	480,000	2,300	
		法面工	m ²	50,000	110	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1		
		管渠工	m			
		函渠工	m	77	71	
		排水工	m	3,037	141	
		中央分離帯工	m	6,700	74	
		雑工	式	1	1,136	機能補償道路(W=5.0m),工事用道路,雑工事等
	橋梁費				9,772	
		100m以上	m	1,192	8,703	
		100m未満	m	99	1,069	
	トンネル費				20,022	
		NATM	m	3,954	20,022	
		シールド	m			
	IC・JCT費				1,174	
		IC	箇所	2	1,174	ダイヤモンドIC
		JCT	箇所			
	舗装費				319	
		車道舗装	m ²	55,650	319	
		その他舗装	m ²			
	付帯施設費				281	
		交通管理施設工	式	1	281	防護柵工等
		遮音壁	m			
②用地及補償費					2,615	
	用地費			m ²	197,000	1,537
		宅地	m ²	20,000	300	
		田畑	m ²	120,000	1,140	
		山林・原野	m ²	53,000	50	
		その他	m ²	4,000	47	
	補償費	式		1	1,078	
③間接経費			式	1	3,884	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					43,800	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道42号	熊野道路	2	6.7km

■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					20,155	
	改良費				1,135	
		土工	m ³	786,000	155	
		軟弱地盤改良工	m ³	480,000	395	
		法面工	m ²	50,000	60	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1		
		管渠工	m			
		函渠工	m	77	71	
		排水工	m	3,037	71	
		中央分離帯工	m	6,700	74	
		雑工	式	1	309	機能補償道路(W=5.0m),工事用道路,雑工事等
	橋梁費				6,486	
		100m以上	m	1,192	5,417	
		100m未満	m	99	1,069	
	トンネル費				10,856	
		NATM	m	3,954	10,856	
		シールド	m			
	IC・JCT費				1,113	
		IC	箇所	2	1,113	ダイヤモンドIC
		JCT	箇所			
	舗装費				319	
		車道舗装	m ²	55,650	319	
		その他舗装	m ²			
	付帯施設費				246	
		交通管理施設工	式	1	246	防護柵工等
		遮音壁	m			
②用地及補償費					332	
	用地費			m ²	82,979	
		宅地	m ²	8,420		
		田畑	m ²	50,516		
		山林・原野	m ²	22,366		
		その他	m ²	1,677		
	補償費	式	1		332	
③間接経費			式	1	413	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					20,900	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業 / 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道42号	熊野道路	2	5.3km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	5.3	1,800	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	5,900	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			7,700	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式			構造物の更新
更新費合計				

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

再評価結果(令和7年度事業継続箇所)(原案)

担当課:

担当課長名:

事業名	一般国道42号(近畿自動車道紀勢線) 紀宝熊野道路			事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 中部地方整備局
起終点	自:三重県熊野市久生屋町 至:三重県南牟婁郡紀宝町神内					延長	15.6km
事業概要							
一般国道42号紀宝熊野道路は、熊野市久生屋町から南牟婁郡紀宝町神内に至る延長15.6kmの自動車専用道路で、近畿自動車道紀勢線と一体となり高速道路ネットワークを形成する道路である。 並行する一般国道42号では、南海トラフ巨大地震等の大規模地震における緊急輸送道路の確保、高次救急医療機関へのアクセス等に課題があり、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援等を目的に整備を進めている。							
H31年度事業化		都市計画決定対象外		令和2年度用地着手		工事未着手	
全体事業費		849億円		事業進捗率(令和6年3月末時点)	約4%	供用済延長	0.0km
計画交通量		9,300台/日					
費用対効果分析	B/C	EIRR	総費用		総便益		基準年
	(事業全体)	(事業全体)	(残事業)/(事業全体)		(残事業)/(事業全体)		
	6.2(0.7)		3,079/57,869億円		8,037/357,443億円		
	参考 6.9(1.1) [2%]	27.3%	事業費:2,639/46,191億円		走行時間短縮便益:7,404/323,196億円		令和6年
	7.5(1.4) [1%]		維持管理費:436/9,006億円		走行経費減少便益:534/29,582億円		
	(残事業)	(残事業)	更新費:3.9/2,672億円		交通事故減少便益:100/4,664億円		
感度分析	2.6(0.8)	11.5%	(事業全体)		(残事業)		
	参考 3.7(1.2) [2%]		交通量	B/C=5.6~6.8(±10%)	交通量	B/C=2.3~2.9(±10%)	
	4.5(1.4) [1%]		事業費	B/C=6.2~6.2(±10%)	事業費	B/C=2.4~2.9(±10%)	
			事業期間	B/C=6.2~6.2(±20%)	事業期間	B/C=2.5~2.9(±20%)	
事業の効果等							
①円滑なモビリティの確保							
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。							
・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する。(三重交通:熊野新宮線等)							
②物流効率化の支援							
・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。							
③国土・地域ネットワークの構築							
・高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり。							
・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡するルートを構成する。							
・日常都市圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。							
④個性ある地域の形成							
・拠点開発プロジェクト(おわせSEAモデル)を支援する。							
・主要な観光地(世界遺産熊野古道)へのアクセス向上が期待される。							
⑤安全で安心できるくらしの確保							
・三次医療施設(伊勢赤十字病院)へのアクセス向上が見込まれる。							
⑥災害への備え							
・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。							
・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間(立石南～熊野大泊IC交差点間)の代替路線を形成する。							
・高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり							
⑦地球環境の保全							
・CO2排出量の削減が見込まれる。							
⑧生活環境の改善・保全							
・NO2排出量の削減が見込まれる。							
・SPM排出量の削減が見込まれる。							

⑨他のプロジェクトとの関係

・関連する大規模道路事業（近畿自動車道紀勢線）と一体的に整備する必要あり。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

熊野尾鷲道路建設促進既成同盟会、近畿自動車道紀勢線（熊野市～新宮市間）建設促進既成同盟会等より近畿自動車道紀勢線の全線早期完成の要望を受けている。

三重県知事の意見：

- ・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。
- ・一般国道42号紀宝熊野道路は、広域的な交流・連携の促進を支えるとともに、近年頻発化・激甚化する台風・豪雨災害や、発生が危惧される南海トラフ地震による津波発生時において、現道（国道42号）とのダブルネットワークを形成し、災害時の救助・救急、医療活動を支える「命の道」となる重要な道路です。
- ・特に、第二次救急医療機関である紀南病院への搬送時間短縮により救急医療活動を支える極めて重要な道路となります。
- ・また、当県としても、円滑な事業環境の確保のため、近畿道紀勢線推進プロジェクトチームを設置し、用地取得や事業調整に取り組んでいるところです。
- ・今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、一日も早く供用されることを求めます。

事業評価監視委員会の意見

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・高速道路ネットワークの整備により、愛知県や関東方面からの観光客が増加。
- ・また、平成31年度には紀勢線が全線事業化。

事業の進捗状況、残事業の内容等

- ・事業進捗は約4%、用地取得率は約15%。（令和6年3月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

- ・平成31年度より事業着手しており、早期開通に向けて調査設計及び用地買収を推進。

施設の構造や工法の変更等


- ・今後も、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。

対応方針（原案）

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

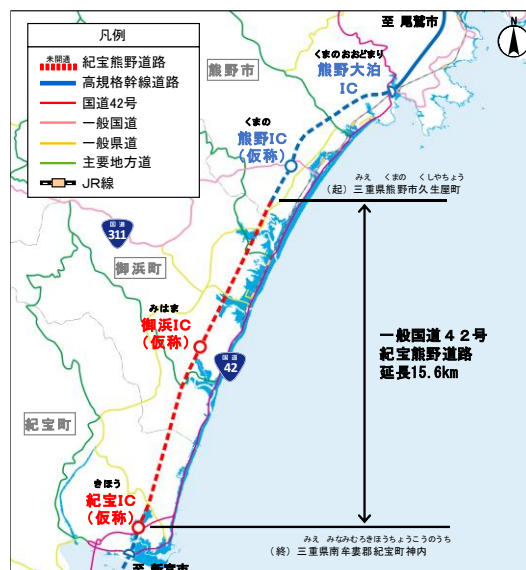

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価格に社会的割引率（4%）を用いて基準年の価値に換算し集計したもの。

※B/Cの値は、社会的割引率4%を用いて計算した場合の費用便益分析結果。また、比較のために参考とすべき値として1%及び2%を設定し、それに対応する費用便益分析結果を参考として併記している。（〔 〕内は社会的割引率の値）

※B/Cの値は、松原JCT～勢和多気JCTを対象とした場合、（）書きの値は事業化区間を対象にした場合の費用便益分析結果。

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道42号 紀宝熊野道路
事業区分	一般国道（高規格A'）
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

	指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている	費用便益比（B／C）＝0.7 （経済的純現在価値（B－C）＝-172億円、経済的内部収益率（E I R R）＝2.5％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	
	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：474.8万人・時間/年 渋滞損失削減時間：81.0万人・時間/年（306.2万人・時間/年⇒225.2万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：（該当区間名） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：17.2万人・時間/年（国道42号） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約9割削減（国道42号）
	☐ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	☐ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	

1. 活力	円滑なモビリティの確保	☒ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	三重交通：熊野新宮線（29本/平日） 三重交通：名古屋南紀高速線（10本/日） 三重交通・西武バス：高速南紀東京大宮線（南紀勝浦線）（3本/日）
		☐ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		☐ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
		物流効率化の支援	
		☐ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		☒ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	近畿自動車道紀勢線との一体整備により農林水産物の大都市への輸送時間短縮、みかん：中京市場へ60%、県内へ21%、大阪市場へ7%出荷
		☐ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生		
		☐ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		☐ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		☐ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		☐ 中心市街地内で行う事業である	
		☐ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		☐ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		☐ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築			
	☒ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	並行する高速道路路線：近畿自動車道紀勢線	
	☐ 地域高規格道路の位置づけあり		
	☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）		
	☒ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	熊野市⇔新宮市	
	☐ 現道等における交通不能区間を解消する		
	☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する		
	☒ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	熊野市	

1. 活力	個性ある地域の形成	
	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	おわせSEAモデル
	■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	世界遺産熊野古道（R4 年間観光客入り込み数 約29万人/年）（勢和多気JCT～熊野速玉大社：93分⇒82分）
	☐ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	
	☐ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
	☐ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	
	☐ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	☐ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	
	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	伊勢赤十字病院（3次救急医療機関）へのアクセスが向上（紀宝町役場、117分 ⇒ 109分）
3. 安全	安全な生活環境の確保	
	☐ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	☐ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	
	☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
	■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	三重県緊急輸送道路ネットワーク計画：第一次緊急輸送道路
	■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道42号（鬼ヶ城トンネル区間）が通行止め時の代替路（立石南～熊野大泊IC交差点間）
	■ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	並行する高速道路路線：近畿自動車道紀勢線
	☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
	☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	

4. 環境	地球環境の保全	
	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：約3.1千/t
	生活環境の改善・保全	
	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別 NO2について環境基準を達成している測定局数の実績 (推計結果) 評価対象区間(現道／並行区間等)：(国道42号) 排出削減量：約30.3t／年、排出削減率：約7.6割削減 (バイパス事業の場合)バイパス等についてNOx排出増加量：約24.6t／年 NO2について環境基準を達成が見込まれる測定局数(推計を行っている場合)
	● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別 SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績 (推計結果) 評価対象区間(現道／並行区間等)：(国道42号) 排出削減量：約0.8t／年、排出削減率：約6割削減 (バイパス事業の場合)バイパス等についてSPM排出増加量：約1.2t／年 SPMについて最寄りの一般局と差があり、かつ環境基準を超過している自排局または常観局のうち道路寄与分の半減が見込まれる測定局数 (推計を行っている場合)
	☐ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
	☐ その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	
	■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	近畿自動車道紀勢線
	☐ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道42号	紀宝熊野道路	L=17.0km	高規格A'	ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
9,300	2	中部地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和6年度			
単純合計	775億円	225億円	0億円	1,000億円
うち残事業分	735億円	225億円	0億円	960億円
基準年における 現在価値 (C)	617億円	65億円	0億円	683億円
うち残事業分	576億円	65億円	0億円	641億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和6年度			
供 用 年	令和17年度			
単年便益 (初年便益)	33億円	4.7億円	0.85億円	38億円
基準年における 現在価値 (B)	437億円	63億円	11億円	511億円
うち残事業分	437億円	63億円	11億円	511億円

③ 結 果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	0.7 [4%]	[参考] 1.1 [2%]	[参考] 1.4 [1%]
経済的純現在価値（B－C）	-172億円 [4%]	[参考] 89億円 [2%]	[参考] 332億円 [1%]
経済的内部収益率（EIRR）	2.5%		

※〔 〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	0.8 [4%]	[参考] 1.2 [2%]	[参考] 1.4 [1%]
経済的純現在価値（B－C）	-131億円 [4%]	[参考] 126億円 [2%]	[参考] 364億円 [1%]
経済的内部収益率（EIRR）	2.8%		

※〔 〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	9,300	±10%	0.7～0.8
事業費	775億円	±10%	0.7～0.8
事業期間	16年	±20%	0.7～0.8

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	9,300	±10%	0.7～0.9
事業費	735億円	±10%	0.7～0.9
事業期間	10年	±20%	0.7～0.9

交通状況の変化

様式－3①

事業名：一般国道42号 紀宝熊野道路（事業全体・残事業）

（推計時点 R22年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 紀宝熊野道路 17.0km		交通量※ ¹	[台/日]	—	9,300
		走行時間※ ²	[分]	—	14
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	—	24.42
②主な周辺道路※ ⁴	国道42号 16.9km	交通量	[台/日]	12,600	4,200
		走行時間	[分]	31	25
		走行時間費用	[億円/年]	75.72	20.04
	鵜殿熊野線 23.2km	交通量	[台/日]	1,800	1,700
		走行時間	[分]	52	52
		走行時間費用	[億円/年]	16.16	15.09
③その他道路合計 284.4km		走行時間費用	[億円/年]	128.03	127.92

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：341.5km	走行時間短縮便益	[億円/年]	219.91	187.47	32.44

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名: 一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体・残事業)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒	
	その他	☐	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	比較のため参考とすべき値	2%、1%	
	基準年次	令和6年度	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)
		複数時点での推計	☐
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐
		その他()	☐
		開発交通量の考慮	無
	有		☐
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) () 台トリップ/日 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	☐
		転換率式を用いた配分	☐
		Q-V式と転換率式の併用による配分	☒
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐	
簡易手法		☐	
簡易手法の採択理由		小規模事業である	☐
		山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	☒	
	採用理由を記載	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmax~Qmin)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度	☐	
	採用理由を記載		
	その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)	☐	

便益の算定

項目			チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		☒
		考慮する		☐
		考慮する場合のみ	面的に考慮	☐
			対象路線のみ考慮	☐
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		☒
		考慮する		☐
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	☐
	冬期交通の影響	考慮しない		☒
		考慮する		☐
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		☒
		その他 ()		☐
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		☒
独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること		☐		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		☒	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること		☐	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		☐	
	中央分離帯の有無を考慮しない		☒	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		☒	
	考慮する		☐	
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

事業名: 一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体・残事業)

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☐	
		標準投資パターンを採用	☒	
		その他()	☐	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価(実績値)を使用		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☐	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		☒
		考慮する		☐
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	☐
維持管理費を考慮			☐	
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)				
その他				
4. その他 上記のほか、B/Cの算定にあたっての問題点があれば、記述。 				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体)

年次	年度 (基準年:R0)	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値
					0.29		17.0		4.96	
-16年目	R 1	4%	1.2167	101.2	0.91	1.12				
-15年目	R 2	4%	1.1699	101.9	5.82	6.86				
-14年目	R 3	4%	1.1249	101.8	7.43	8.43				
-13年目	R 4	4%	1.0816	102.7	8.15	8.81				
-12年目	R 5	4%	1.0400	102.7	8.56	8.90				
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7	9.07	9.07				
-10年目	R 7	4%	0.9615	102.7	12.36	11.88				
-9年目	R 8	4%	0.9246	102.7	56.42	52.17				
-8年目	R 9	4%	0.8890	102.7	69.20	61.52				
-7年目	R 10	4%	0.8548	102.7	64.84	55.42				
-6年目	R 11	4%	0.8219	102.7	71.68	58.92				
-5年目	R 12	4%	0.7903	102.7	76.84	60.72				
-4年目	R 13	4%	0.7599	102.7	108.85	82.72				
-3年目	R 14	4%	0.7307	102.7	103.54	75.65				
-2年目	R 15	4%	0.7026	102.7	97.59	68.57				
-1年目	R 16	4%	0.6756	102.7	73.62	49.74				
供用開始年次	R 17	4%	0.6496	102.7			4.51	2.93		
1年目	R 18	4%	0.6246	102.7			4.51	2.82		
2年目	R 19	4%	0.6006	102.7			4.51	2.71		
3年目	R 20	4%	0.5775	102.7			4.51	2.60		
4年目	R 21	4%	0.5553	102.7			4.51	2.50		
5年目	R 22	4%	0.5339	102.7			4.51	2.41		
6年目	R 23	4%	0.5134	102.7			4.51	2.31		
7年目	R 24	4%	0.4936	102.7			4.51	2.23		
8年目	R 25	4%	0.4746	102.7			4.51	2.14		
9年目	R 26	4%	0.4564	102.7			4.51	2.06		
10年目	R 27	4%	0.4388	102.7			4.51	1.98		
11年目	R 28	4%	0.4220	102.7			4.51	1.90		
12年目	R 29	4%	0.4057	102.7			4.51	1.83		
13年目	R 30	4%	0.3901	102.7			4.51	1.76		
14年目	R 31	4%	0.3751	102.7			4.51	1.69		
15年目	R 32	4%	0.3607	102.7			4.51	1.63		
16年目	R 33	4%	0.3468	102.7			4.51	1.56		
17年目	R 34	4%	0.3335	102.7			4.51	1.50		
18年目	R 35	4%	0.3207	102.7			4.51	1.45		
19年目	R 36	4%	0.3083	102.7			4.51	1.39		
20年目	R 37	4%	0.2965	102.7			4.51	1.34		
21年目	R 38	4%	0.2851	102.7			4.51	1.29		
22年目	R 39	4%	0.2741	102.7			4.51	1.24		
23年目	R 40	4%	0.2636	102.7			4.51	1.19		
24年目	R 41	4%	0.2534	102.7			4.51	1.14		
25年目	R 42	4%	0.2437	102.7			4.51	1.10		
26年目	R 43	4%	0.2343	102.7			4.51	1.06		
27年目	R 44	4%	0.2253	102.7			4.51	1.02		
28年目	R 45	4%	0.2166	102.7			4.51	0.98		
29年目	R 46	4%	0.2083	102.7			4.51	0.94		
30年目	R 47	4%	0.2003	102.7			4.51	0.90		
31年目	R 48	4%	0.1926	102.7			4.51	0.87		
32年目	R 49	4%	0.1852	102.7			4.51	0.84		
33年目	R 50	4%	0.1780	102.7			4.51	0.80		
34年目	R 51	4%	0.1712	102.7			4.51	0.77		
35年目	R 52	4%	0.1646	102.7			4.51	0.74		
36年目	R 53	4%	0.1583	102.7			4.51	0.71		
37年目	R 54	4%	0.1522	102.7			4.51	0.69		
38年目	R 55	4%	0.1463	102.7			4.51	0.66		
39年目	R 56	4%	0.1407	102.7			4.51	0.63		
40年目	R 57	4%	0.1353	102.7			4.51	0.61		
41年目	R 58	4%	0.1301	102.7			4.51	0.59		
42年目	R 59	4%	0.1251	102.7			4.51	0.56		
43年目	R 60	4%	0.1203	102.7			4.51	0.54		
44年目	R 61	4%	0.1157	102.7			4.51	0.52		
45年目	R 62	4%	0.1112	102.7			4.51	0.50		
46年目	R 63	4%	0.1069	102.7			4.51	0.48		
47年目	R 64	4%	0.1028	102.7			4.51	0.46		
48年目	R 65	4%	0.0989	102.7			4.51	0.45		
49年目	R 66	4%	0.0951	102.7	-33.61	-3.20	4.51	0.43		
合計					741.26	617.30	225.45	65.44	0.00	0.00
単純事業費計					774.87		225.45		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 紀宝熊野道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

						単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
						0.29	17.0	4.96
年次	年度 (基準年：R6)	社会的 割引率	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)	維持管理費(億円)		更新費(億円)
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
基準年	R 6	4%	1.0000	102.7				
-10年目	R 7	4%	0.9615	102.7	12.36	11.88		
-9年目	R 8	4%	0.9246	102.7	56.42	52.17		
-8年目	R 9	4%	0.8890	102.7	69.20	61.52		
-7年目	R 10	4%	0.8548	102.7	64.84	55.42		
-6年目	R 11	4%	0.8219	102.7	71.68	58.92		
-5年目	R 12	4%	0.7903	102.7	76.84	60.72		
-4年目	R 13	4%	0.7599	102.7	108.85	82.72		
-3年目	R 14	4%	0.7307	102.7	103.54	75.65		
-2年目	R 15	4%	0.7026	102.7	97.59	68.57		
-1年目	R 16	4%	0.6756	102.7	73.62	49.74		
供用開始年次	R 17	4%	0.6496	102.7			4.51	2.93
1年目	R 18	4%	0.6246	102.7			4.51	2.82
2年目	R 19	4%	0.6006	102.7			4.51	2.71
3年目	R 20	4%	0.5775	102.7			4.51	2.60
4年目	R 21	4%	0.5553	102.7			4.51	2.50
5年目	R 22	4%	0.5339	102.7			4.51	2.41
6年目	R 23	4%	0.5134	102.7			4.51	2.31
7年目	R 24	4%	0.4936	102.7			4.51	2.23
8年目	R 25	4%	0.4746	102.7			4.51	2.14
9年目	R 26	4%	0.4564	102.7			4.51	2.06
10年目	R 27	4%	0.4388	102.7			4.51	1.98
11年目	R 28	4%	0.4220	102.7			4.51	1.90
12年目	R 29	4%	0.4057	102.7			4.51	1.83
13年目	R 30	4%	0.3901	102.7			4.51	1.76
14年目	R 31	4%	0.3751	102.7			4.51	1.69
15年目	R 32	4%	0.3607	102.7			4.51	1.63
16年目	R 33	4%	0.3468	102.7			4.51	1.56
17年目	R 34	4%	0.3335	102.7			4.51	1.50
18年目	R 35	4%	0.3207	102.7			4.51	1.45
19年目	R 36	4%	0.3083	102.7			4.51	1.39
20年目	R 37	4%	0.2965	102.7			4.51	1.34
21年目	R 38	4%	0.2851	102.7			4.51	1.29
22年目	R 39	4%	0.2741	102.7			4.51	1.24
23年目	R 40	4%	0.2636	102.7			4.51	1.19
24年目	R 41	4%	0.2534	102.7			4.51	1.14
25年目	R 42	4%	0.2437	102.7			4.51	1.10
26年目	R 43	4%	0.2343	102.7			4.51	1.06
27年目	R 44	4%	0.2253	102.7			4.51	1.02
28年目	R 45	4%	0.2166	102.7			4.51	0.98
29年目	R 46	4%	0.2083	102.7			4.51	0.94
30年目	R 47	4%	0.2003	102.7			4.51	0.90
31年目	R 48	4%	0.1926	102.7			4.51	0.87
32年目	R 49	4%	0.1852	102.7			4.51	0.84
33年目	R 50	4%	0.1780	102.7			4.51	0.80
34年目	R 51	4%	0.1712	102.7			4.51	0.77
35年目	R 52	4%	0.1646	102.7			4.51	0.74
36年目	R 53	4%	0.1583	102.7			4.51	0.71
37年目	R 54	4%	0.1522	102.7			4.51	0.69
38年目	R 55	4%	0.1463	102.7			4.51	0.66
39年目	R 56	4%	0.1407	102.7			4.51	0.63
40年目	R 57	4%	0.1353	102.7			4.51	0.61
41年目	R 58	4%	0.1301	102.7			4.51	0.59
42年目	R 59	4%	0.1251	102.7			4.51	0.56
43年目	R 60	4%	0.1203	102.7			4.51	0.54
44年目	R 61	4%	0.1157	102.7			4.51	0.52
45年目	R 62	4%	0.1112	102.7			4.51	0.50
46年目	R 63	4%	0.1069	102.7			4.51	0.48
47年目	R 64	4%	0.1028	102.7			4.51	0.46
48年目	R 65	4%	0.0989	102.7			4.51	0.45
49年目	R 66	4%	0.0951	102.7	-14.41	-1.37	4.51	0.43
合計					720.53	575.94	225.45	65.44
単純事業費計					734.94		225.45	0.00

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名:一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体・残事業)

年度 (基準年) R6年	総走行台和の年次別伸び率 東海ブロック				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合 計 (億円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車	普通貨物	小型貨物	① 計 ①×(A)	現在価値	乗用車	普通貨物	小型貨物	② 計 (A)×(2)	現在価値 ③×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
年次	供用開始年次	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30	R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50	R 51	R 52	R 53	R 54	R 55	R 56	R 57	R 58	R 59	R 60	R 61	R 62	R 63	R 64	R 65	R 66	合 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		0.99895	0.99895	0.99895	0.99895	0.99895	0.99253	0.99248	0.99242	0.99236	0.99230	0.99224	0.99218	0.99212	0.99206	0.99199	0.99193	0.99186	0.99180	0.99173	0.99166	0.99159	0.99152	0.99145	0.99137	0.99130	0.99122	0.99114	0.99106	0.99098	0.99090	0.99082	0.99073	0.99065	0.99056	0.99047	0.99038	0.99028	0.99019	0.99009	0.98999	0.98989	0.98979	0.98968	0.98957	0.98946	0.98935	0.98924	0.98912	0.98900	0.98888																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1.00652	1.00648	1.00643	1.00639	1.00635	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984	0.99984																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		0.99072	0.99063	0.99054	0.99045	0.99036	0.99257	0.99251	0.99246	0.99240	0.99234	0.99228	0.99222	0.99216	0.99210	0.99203	0.99197	0.99191	0.99184	0.99177	0.99170	0.99163	0.99156	0.99149	0.99142	0.99135	0.99127	0.99119	0.99111	0.99103	0.99095	0.99087	0.99079	0.99070	0.99061	0.99052	0.99043	0.99034	0.99025	0.99015	0.99005	0.99000	0.98995	0.98985	0.98975	0.98965	0.98955	0.98945	0.98935	0.98925	0.98915	0.98905	0.98895																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		0.99896	0.99896	0.99896	0.99896	0.99896	0.99394	0.99391	0.99387	0.99383	0.99379	0.99375	0.99371	0.99367	0.99363	0.99359	0.99355	0.99351	0.99347	0.99342	0.99338	0.99334	0.99329	0.99325	0.99320	0.99315	0.99311	0.99306	0.99301	0.99296	0.99291	0.99286	0.99281	0.99276	0.99270	0.99265	0.99260	0.99254	0.99248	0.99243	0.99237	0.99231	0.99225	0.99219	0.99213	0.99207	0.99201	0.99195	0.99189	0.99183	0.99177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7	102.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		18.88	18.86	18.84	18.82	18.80	18.78	18.64	18.50	18.36	18.22	18.08	17.94	17.80	17.66	17.52	17.38	17.24	17.10	16.96	16.82	16.68	16.54	16.39	16.25	16.11	15.97	15.83	15.69	15.55	15.41	15.27	15.13	14.99	14.85	14.71	14.57	14.43	14.29	14.15	14.01	13.87	13.73	13.59	13.45	13.31	13.17	13.03	12.89	12.75	12.61	12.47	12.33	12.19	12.05	11.91	11.77	11.63	11.49	11.35	11.21	11.07	10.93	10.79	10.65	10.51	10.37	10.23	10.09	9.95	9.81	9.67	9.53	9.39	9.25	9.11	8.97	8.83	8.69	8.55	8.41	8.27	8.13	7.99	7.85	7.71	7.57	7.43	7.29	7.15	7.01	6.87	6.73	6.59	6.45	6.31	6.17	6.03	5.89	5.75	5.61	5.47	5.33	5.19	5.05	4.91	4.77	4.63	4.49	4.35	4.21	4.07	3.93	3.79	3.65	3.51	3.37	3.23	3.09	2.95	2.81	2.67	2.53	2.39	2.25	2.11	1.97	1.83	1.69	1.55	1.41	1.27	1.13	1.00	0.86	0.72	0.58	0.44	0.30	0.16	0.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体)

年次	年度 (基準年:R0)	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-16年目	R 1	4%	1.1932	101.2	0.91	1.10				
-15年目	R 2	4%	1.1473	101.9	5.82	6.73				
-14年目	R 3	4%	1.1032	101.8	7.43	8.27				
-13年目	R 4	4%	1.0608	102.7	8.15	8.64				
-12年目	R 5	2%	1.0200	102.7	8.56	8.73				
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7	9.07	9.07				
-10年目	R 7	2%	0.9804	102.7	12.36	12.12				
-9年目	R 8	2%	0.9612	102.7	56.42	54.23				
-8年目	R 9	2%	0.9423	102.7	69.20	65.21				
-7年目	R 10	2%	0.9238	102.7	64.84	59.90				
-6年目	R 11	2%	0.9057	102.7	71.68	64.92				
-5年目	R 12	2%	0.8880	102.7	76.84	68.23				
-4年目	R 13	2%	0.8706	102.7	108.85	94.77				
-3年目	R 14	2%	0.8535	102.7	103.54	88.37				
-2年目	R 15	2%	0.8368	102.7	97.59	81.66				
-1年目	R 16	2%	0.8203	102.7	73.62	60.39				
供用開始年次	R 17	2%	0.8043	102.7			4.51	3.63		
1年目	R 18	2%	0.7885	102.7			4.51	3.56		
2年目	R 19	2%	0.7730	102.7			4.51	3.49		
3年目	R 20	2%	0.7579	102.7			4.51	3.42		
4年目	R 21	2%	0.7430	102.7			4.51	3.35		
5年目	R 22	2%	0.7284	102.7			4.51	3.28		
6年目	R 23	2%	0.7142	102.7			4.51	3.22		
7年目	R 24	2%	0.7002	102.7			4.51	3.16		
8年目	R 25	2%	0.6864	102.7			4.51	3.10		
9年目	R 26	2%	0.6730	102.7			4.51	3.03		
10年目	R 27	2%	0.6598	102.7			4.51	2.98		
11年目	R 28	2%	0.6468	102.7			4.51	2.92		
12年目	R 29	2%	0.6342	102.7			4.51	2.86		
13年目	R 30	2%	0.6217	102.7			4.51	2.80		
14年目	R 31	2%	0.6095	102.7			4.51	2.75		
15年目	R 32	2%	0.5976	102.7			4.51	2.69		
16年目	R 33	2%	0.5859	102.7			4.51	2.64		
17年目	R 34	2%	0.5744	102.7			4.51	2.59		
18年目	R 35	2%	0.5631	102.7			4.51	2.54		
19年目	R 36	2%	0.5521	102.7			4.51	2.49		
20年目	R 37	2%	0.5412	102.7			4.51	2.44		
21年目	R 38	2%	0.5306	102.7			4.51	2.39		
22年目	R 39	2%	0.5202	102.7			4.51	2.35		
23年目	R 40	2%	0.5100	102.7			4.51	2.30		
24年目	R 41	2%	0.5000	102.7			4.51	2.25		
25年目	R 42	2%	0.4902	102.7			4.51	2.21		
26年目	R 43	2%	0.4806	102.7			4.51	2.17		
27年目	R 44	2%	0.4712	102.7			4.51	2.12		
28年目	R 45	2%	0.4619	102.7			4.51	2.08		
29年目	R 46	2%	0.4529	102.7			4.51	2.04		
30年目	R 47	2%	0.4440	102.7			4.51	2.00		
31年目	R 48	2%	0.4353	102.7			4.51	1.96		
32年目	R 49	2%	0.4268	102.7			4.51	1.92		
33年目	R 50	2%	0.4184	102.7			4.51	1.89		
34年目	R 51	2%	0.4102	102.7			4.51	1.85		
35年目	R 52	2%	0.4022	102.7			4.51	1.81		
36年目	R 53	2%	0.3943	102.7			4.51	1.78		
37年目	R 54	2%	0.3865	102.7			4.51	1.74		
38年目	R 55	2%	0.3790	102.7			4.51	1.71		
39年目	R 56	2%	0.3715	102.7			4.51	1.68		
40年目	R 57	2%	0.3642	102.7			4.51	1.64		
41年目	R 58	2%	0.3571	102.7			4.51	1.61		
42年目	R 59	2%	0.3501	102.7			4.51	1.58		
43年目	R 60	2%	0.3432	102.7			4.51	1.55		
44年目	R 61	2%	0.3365	102.7			4.51	1.52		
45年目	R 62	2%	0.3299	102.7			4.51	1.49		
46年目	R 63	2%	0.3234	102.7			4.51	1.46		
47年目	R 64	2%	0.3171	102.7			4.51	1.43		
48年目	R 65	2%	0.3109	102.7			4.51	1.40		
49年目	R 66	2%	0.3048	102.7	-33.61	-10.24	4.51	1.37		
合計					741.26	682.10	225.45	116.24	0.00	0.00
単純事業費計					774.87		225.45		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 紀宝熊野道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.29		17.0		4.96	
年次	年度 (基準年：R6)	社会的 割引率	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
基準年	R 6	2%	1.0000	102.7						
-10年目	R 7	2%	0.9804	102.7	12.36	12.12				
-9年目	R 8	2%	0.9612	102.7	56.42	54.23				
-8年目	R 9	2%	0.9423	102.7	69.20	65.21				
-7年目	R 10	2%	0.9238	102.7	64.84	59.90				
-6年目	R 11	2%	0.9057	102.7	71.68	64.92				
-5年目	R 12	2%	0.8880	102.7	76.84	68.23				
-4年目	R 13	2%	0.8706	102.7	108.85	94.77				
-3年目	R 14	2%	0.8535	102.7	103.54	88.37				
-2年目	R 15	2%	0.8368	102.7	97.59	81.66				
-1年目	R 16	2%	0.8203	102.7	73.62	60.39				
供用開始年次	R 17	2%	0.8043	102.7			4.51	3.63		
1年目	R 18	2%	0.7885	102.7			4.51	3.56		
2年目	R 19	2%	0.7730	102.7			4.51	3.49		
3年目	R 20	2%	0.7579	102.7			4.51	3.42		
4年目	R 21	2%	0.7430	102.7			4.51	3.35		
5年目	R 22	2%	0.7284	102.7			4.51	3.28		
6年目	R 23	2%	0.7142	102.7			4.51	3.22		
7年目	R 24	2%	0.7002	102.7			4.51	3.16		
8年目	R 25	2%	0.6864	102.7			4.51	3.10		
9年目	R 26	2%	0.6730	102.7			4.51	3.03		
10年目	R 27	2%	0.6598	102.7			4.51	2.98		
11年目	R 28	2%	0.6468	102.7			4.51	2.92		
12年目	R 29	2%	0.6342	102.7			4.51	2.86		
13年目	R 30	2%	0.6217	102.7			4.51	2.80		
14年目	R 31	2%	0.6095	102.7			4.51	2.75		
15年目	R 32	2%	0.5976	102.7			4.51	2.69		
16年目	R 33	2%	0.5859	102.7			4.51	2.64		
17年目	R 34	2%	0.5744	102.7			4.51	2.59		
18年目	R 35	2%	0.5631	102.7			4.51	2.54		
19年目	R 36	2%	0.5521	102.7			4.51	2.49		
20年目	R 37	2%	0.5412	102.7			4.51	2.44		
21年目	R 38	2%	0.5306	102.7			4.51	2.39		
22年目	R 39	2%	0.5202	102.7			4.51	2.35		
23年目	R 40	2%	0.5100	102.7			4.51	2.30		
24年目	R 41	2%	0.5000	102.7			4.51	2.25		
25年目	R 42	2%	0.4902	102.7			4.51	2.21		
26年目	R 43	2%	0.4806	102.7			4.51	2.17		
27年目	R 44	2%	0.4712	102.7			4.51	2.12		
28年目	R 45	2%	0.4619	102.7			4.51	2.08		
29年目	R 46	2%	0.4529	102.7			4.51	2.04		
30年目	R 47	2%	0.4440	102.7			4.51	2.00		
31年目	R 48	2%	0.4353	102.7			4.51	1.96		
32年目	R 49	2%	0.4268	102.7			4.51	1.92		
33年目	R 50	2%	0.4184	102.7			4.51	1.89		
34年目	R 51	2%	0.4102	102.7			4.51	1.85		
35年目	R 52	2%	0.4022	102.7			4.51	1.81		
36年目	R 53	2%	0.3943	102.7			4.51	1.78		
37年目	R 54	2%	0.3865	102.7			4.51	1.74		
38年目	R 55	2%	0.3790	102.7			4.51	1.71		
39年目	R 56	2%	0.3715	102.7			4.51	1.68		
40年目	R 57	2%	0.3642	102.7			4.51	1.64		
41年目	R 58	2%	0.3571	102.7			4.51	1.61		
42年目	R 59	2%	0.3501	102.7			4.51	1.58		
43年目	R 60	2%	0.3432	102.7			4.51	1.55		
44年目	R 61	2%	0.3365	102.7			4.51	1.52		
45年目	R 62	2%	0.3299	102.7			4.51	1.49		
46年目	R 63	2%	0.3234	102.7			4.51	1.46		
47年目	R 64	2%	0.3171	102.7			4.51	1.43		
48年目	R 65	2%	0.3109	102.7			4.51	1.40		
49年目	R 66	2%	0.3048	102.7	-14.41	-4.39	4.51	1.37		
合計					720.53	645.41	225.45	116.24	0.00	0.00
単純事業費計					734.94		225.45		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R6年	総走行台の年次別伸び率 東海ブロック				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレート	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	割引率4%	
供用開始年次	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	2%	0.8043	102.7	18.88	7.00	6.74	32.62	26.24	3.06	0.98	0.62	4.67	3.75	0.85	0.68	38.13	30.67	
1年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	2%	0.7885	102.7	18.86	7.05	6.68	32.59	25.69	3.06	0.99	0.61	4.66	3.68	0.85	0.67	38.09	30.04	
2年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	2%	0.7730	102.7	18.84	7.09	6.62	32.55	25.16	3.06	0.99	0.61	4.66	3.60	0.84	0.65	38.05	29.42	
3年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	2%	0.7579	102.7	18.82	7.14	6.56	32.51	24.64	3.05	1.00	0.60	4.66	3.53	0.84	0.64	38.01	28.81	
4年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	2%	0.7430	102.7	18.80	7.18	6.49	32.47	24.13	3.05	1.01	0.60	4.66	3.46	0.84	0.63	37.97	28.21	
5年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	2%	0.7284	102.7	18.78	7.23	6.43	32.44	23.63	3.05	1.01	0.59	4.65	3.39	0.84	0.61	37.93	27.63	
6年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	2%	0.7142	102.7	18.64	7.23	6.38	32.25	23.03	3.02	1.01	0.59	4.63	3.30	0.84	0.60	37.71	26.93	
7年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	2%	0.7002	102.7	18.50	7.23	6.34	32.06	22.45	3.00	1.01	0.58	4.60	3.22	0.83	0.58	37.49	26.25	
8年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	2%	0.6864	102.7	18.36	7.22	6.29	31.87	21.88	2.98	1.01	0.58	4.57	3.14	0.83	0.57	37.27	25.58	
9年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	2%	0.6730	102.7	18.22	7.22	6.24	31.68	21.32	2.96	1.01	0.57	4.54	3.06	0.82	0.55	37.05	24.93	
10年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	2%	0.6598	102.7	18.08	7.22	6.19	31.49	20.78	2.93	1.01	0.57	4.52	2.98	0.82	0.54	36.82	24.30	
11年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	2%	0.6468	102.7	17.94	7.22	6.14	31.30	20.25	2.91	1.01	0.57	4.49	2.90	0.81	0.52	36.60	23.67	
12年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	2%	0.6342	102.7	17.80	7.22	6.10	31.11	19.73	2.89	1.01	0.56	4.46	2.83	0.81	0.51	36.38	23.07	
13年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	2%	0.6217	102.7	17.66	7.22	6.05	30.92	19.23	2.87	1.01	0.56	4.43	2.76	0.80	0.50	36.16	22.48	
14年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	2%	0.6095	102.7	17.52	7.22	6.00	30.74	18.73	2.84	1.01	0.55	4.41	2.69	0.80	0.49	35.94	21.90	
15年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	2%	0.5976	102.7	17.38	7.22	5.95	30.55	18.25	2.82	1.01	0.55	4.38	2.62	0.79	0.47	35.72	21.34	
16年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	2%	0.5859	102.7	17.24	7.22	5.90	30.36	17.79	2.80	1.01	0.54	4.35	2.55	0.79	0.46	35.49	20.80	
17年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	2%	0.5744	102.7	17.10	7.21	5.86	30.17	17.33	2.77	1.01	0.54	4.32	2.48	0.78	0.45	35.27	20.26	
18年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	2%	0.5631	102.7	16.96	7.21	5.81	29.98	16.88	2.75	1.01	0.53	4.30	2.42	0.78	0.44	35.05	19.74	
19年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	2%	0.5521	102.7	16.82	7.21	5.76	29.79	16.45	2.73	1.01	0.53	4.27	2.36	0.77	0.43	34.83	19.23	
20年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	2%	0.5412	102.7	16.68	7.21	5.71	29.60	16.02	2.71	1.01	0.53	4.24	2.30	0.77	0.41	34.61	18.73	
21年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	2%	0.5306	102.7	16.54	7.21	5.67	29.41	15.61	2.68	1.01	0.52	4.22	2.24	0.76	0.40	34.39	18.25	
22年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	2%	0.5202	102.7	16.39	7.21	5.62	29.22	15.20	2.66	1.01	0.52	4.19	2.18	0.76	0.39	34.17	17.77	
23年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	2%	0.5100	102.7	16.25	7.21	5.57	29.03	14.81	2.64	1.01	0.51	4.16	2.12	0.75	0.38	33.94	17.31	
24年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	2%	0.5000	102.7	16.11	7.21	5.52	28.84	14.42	2.62	1.01	0.51	4.13	2.07	0.74	0.37	33.72	16.86	
25年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99127	0.99311	2%	0.4902	102.7	15.97	7.21	5.47	28.65	14.05	2.59	1.01	0.50	4.11	2.01	0.74	0.36	33.50	16.42	
26年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	2%	0.4806	102.7	15.83	7.20	5.43	28.46	13.68	2.57	1.01	0.50	4.08	1.96	0.73	0.35	33.28	15.99	
27年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	2%	0.4712	102.7	15.69	7.20	5.38	28.28	13.32	2.55	1.01	0.49	4.05	1.91	0.73	0.34	33.06	15.58	
28年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	2%	0.4619	102.7	15.55	7.20	5.33	28.09	12.97	2.52	1.01	0.49	4.02	1.86	0.72	0.33	32.84	15.17	
29年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	2%	0.4529	102.7	15.41	7.20	5.28	27.90	12.63	2.50	1.01	0.49	4.00	1.81	0.72	0.33	32.61	14.77	
30年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	2%	0.4440	102.7	15.27	7.20	5.24	27.71	12.30	2.48	1.01	0.48	3.97	1.76	0.71	0.32	32.39	14.38	
31年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99079	0.99281	2%	0.4353	102.7	15.13	7.20	5.19	27.52	11.98	2.46	1.01	0.48	3.94	1.72	0.71	0.31	32.17	14.00	
32年目	R 49	0.99065	0.99984	0.99070	0.99276	2%	0.4268	102.7	14.99	7.20	5.14	27.33	11.66	2.43	1.01	0.47	3.92	1.67	0.70	0.30	31.95	13.64	
33年目	R 50	0.99056	0.99984	0.99061	0.99270	2%	0.4184	102.7	14.85	7.20	5.09	27.14	11.36	2.41	1.01	0.47	3.89	1.63	0.70	0.29	31.73	13.27	
34年目	R 51	0.99047	0.99984	0.99052	0.99265	2%	0.4102	102.7	14.71	7.19	5.04	26.95	11.06	2.39	1.01	0.46	3.86	1.58	0.69	0.28	31.51	12.92	
35年目	R 52	0.99038	0.99984	0.99043	0.99260	2%	0.4022	102.7	14.57	7.19	5.00	26.76	10.76	2.36	1.01	0.46	3.83	1.54	0.69	0.28	31.28	12.58	
36年目	R 53	0.99028	0.99984	0.99034	0.99254	2%	0.3943	102.7	14.43	7.19	4.95	26.57	10.48	2.34	1.01	0.46	3.81	1.50	0.68	0.27	31.06	12.25	
37年目	R 54	0.99019	0.99984	0.99025	0.99248	2%	0.3865	102.7	14.29	7.19	4.90	26.38	10.20	2.32	1.01	0.45	3.78	1.46	0.68	0.26	30.84	11.92	
38年目	R 55	0.99009	0.99984	0.99015	0.99243	2%	0.3790	102.7	14.15	7.19	4.85	26.19	9.93	2.30	1.01	0.45	3.75	1.42	0.67	0.26	30.62	11.60	
39年目	R 56	0.98999	0.99984	0.99005	0.99237	2%	0.3715	102.7	14.01	7.19	4.81	26.01	9.66	2.27	1.01	0.44	3.72	1.38	0.67	0.25	30.40	11.29	
40年目	R 57	0.98989	0.99984	0.98995	0.99231	2%	0.3642	102.7	13.87	7.19	4.76	25.82	9.40	2.25	1.01	0.44	3.70	1.35	0.66	0.24	30.18	10.99	
41年目	R 58	0.98979	0.99984	0.98985	0.99225	2%	0.3571	102.7	13.73	7.19	4.71	25.63	9.15	2.23	1.01	0.43	3.67	1.31	0.66	0.24	29.95	10.70	
42年目	R 59	0.98968	0.99984	0.98975	0.99219	2%	0.3501	102.7	13.59	7.19	4.66	25.44	8.91	2.21	1.01	0.43	3.64	1.28	0.65	0.23	29.73	10.41	
43年目	R 60	0.98957	0.99984	0.98964	0.99213	2%	0.3432	102.7	13.45	7.18	4.61	25.25	8.67	2.18	1.01	0.42	3.61	1.24	0.65	0.22	29.51	10.13	
44年目	R 61	0.98946	0.99984	0.98953	0.99207	2%	0.3365	102.7	13.31	7.18	4.57	25.06	8.43	2.16	1.01	0.42	3.59	1.21	0.64	0.22	29.29	9.86	
45年目	R 62	0.98935																					

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体)

年次	年度 (基準年:R6)	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
							0.29	17.0	4.96	
-16年目	R 1	4%	1.1815	101.2	0.91	1.09				
-15年目	R 2	4%	1.1361	101.9	5.82	6.66				
-14年目	R 3	4%	1.0924	101.8	7.43	8.19				
-13年目	R 4	4%	1.0504	102.7	8.15	8.56				
-12年目	R 5	1%	1.0100	102.7	8.56	8.64				
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7	9.07	9.07				
-10年目	R 7	1%	0.9901	102.7	12.36	12.24				
-9年目	R 8	1%	0.9803	102.7	56.42	55.31				
-8年目	R 9	1%	0.9706	102.7	69.20	67.17				
-7年目	R 10	1%	0.9610	102.7	64.84	62.31				
-6年目	R 11	1%	0.9515	102.7	71.68	68.21				
-5年目	R 12	1%	0.9420	102.7	76.84	72.38				
-4年目	R 13	1%	0.9327	102.7	108.85	101.53				
-3年目	R 14	1%	0.9235	102.7	103.54	95.62				
-2年目	R 15	1%	0.9143	102.7	97.59	89.23				
-1年目	R 16	1%	0.9053	102.7	73.62	66.65				
供用開始年次	R 17	1%	0.8963	102.7			4.51	4.04		
1年目	R 18	1%	0.8874	102.7			4.51	4.00		
2年目	R 19	1%	0.8787	102.7			4.51	3.96		
3年目	R 20	1%	0.8700	102.7			4.51	3.92		
4年目	R 21	1%	0.8613	102.7			4.51	3.88		
5年目	R 22	1%	0.8528	102.7			4.51	3.85		
6年目	R 23	1%	0.8444	102.7			4.51	3.81		
7年目	R 24	1%	0.8360	102.7			4.51	3.77		
8年目	R 25	1%	0.8277	102.7			4.51	3.73		
9年目	R 26	1%	0.8195	102.7			4.51	3.70		
10年目	R 27	1%	0.8114	102.7			4.51	3.66		
11年目	R 28	1%	0.8034	102.7			4.51	3.62		
12年目	R 29	1%	0.7954	102.7			4.51	3.59		
13年目	R 30	1%	0.7876	102.7			4.51	3.55		
14年目	R 31	1%	0.7798	102.7			4.51	3.52		
15年目	R 32	1%	0.7720	102.7			4.51	3.48		
16年目	R 33	1%	0.7644	102.7			4.51	3.45		
17年目	R 34	1%	0.7568	102.7			4.51	3.41		
18年目	R 35	1%	0.7493	102.7			4.51	3.38		
19年目	R 36	1%	0.7419	102.7			4.51	3.35		
20年目	R 37	1%	0.7346	102.7			4.51	3.31		
21年目	R 38	1%	0.7273	102.7			4.51	3.28		
22年目	R 39	1%	0.7201	102.7			4.51	3.25		
23年目	R 40	1%	0.7130	102.7			4.51	3.21		
24年目	R 41	1%	0.7059	102.7			4.51	3.18		
25年目	R 42	1%	0.6989	102.7			4.51	3.15		
26年目	R 43	1%	0.6920	102.7			4.51	3.12		
27年目	R 44	1%	0.6852	102.7			4.51	3.09		
28年目	R 45	1%	0.6784	102.7			4.51	3.06		
29年目	R 46	1%	0.6717	102.7			4.51	3.03		
30年目	R 47	1%	0.6650	102.7			4.51	3.00		
31年目	R 48	1%	0.6584	102.7			4.51	2.97		
32年目	R 49	1%	0.6519	102.7			4.51	2.94		
33年目	R 50	1%	0.6454	102.7			4.51	2.91		
34年目	R 51	1%	0.6391	102.7			4.51	2.88		
35年目	R 52	1%	0.6327	102.7			4.51	2.85		
36年目	R 53	1%	0.6265	102.7			4.51	2.82		
37年目	R 54	1%	0.6203	102.7			4.51	2.80		
38年目	R 55	1%	0.6141	102.7			4.51	2.77		
39年目	R 56	1%	0.6080	102.7			4.51	2.74		
40年目	R 57	1%	0.6020	102.7			4.51	2.71		
41年目	R 58	1%	0.5961	102.7			4.51	2.69		
42年目	R 59	1%	0.5902	102.7			4.51	2.66		
43年目	R 60	1%	0.5843	102.7			4.51	2.63		
44年目	R 61	1%	0.5785	102.7			4.51	2.61		
45年目	R 62	1%	0.5728	102.7			4.51	2.58		
46年目	R 63	1%	0.5671	102.7			4.51	2.56		
47年目	R 64	1%	0.5615	102.7			4.51	2.53		
48年目	R 65	1%	0.5560	102.7			4.51	2.51		
49年目	R 66	1%	0.5504	102.7	-33.61	-18.50	4.51	2.48		
合計					741.26	714.36	225.45	160.00	0.00	0.00
単純事業費計					774.87		225.45		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 紀宝熊野道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

						単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
						0.29	17.0	4.96
年次	年度 (基準年：R6)	社会的 割引率	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)	維持管理費(億円)		更新費(億円)
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
基準年	R 6	1%	1.0000	102.7				
-10年目	R 7	1%	0.9901	102.7	12.36	12.24		
-9年目	R 8	1%	0.9803	102.7	56.42	55.31		
-8年目	R 9	1%	0.9706	102.7	69.20	67.17		
-7年目	R 10	1%	0.9610	102.7	64.84	62.31		
-6年目	R 11	1%	0.9515	102.7	71.68	68.21		
-5年目	R 12	1%	0.9420	102.7	76.84	72.38		
-4年目	R 13	1%	0.9327	102.7	108.85	101.53		
-3年目	R 14	1%	0.9235	102.7	103.54	95.62		
-2年目	R 15	1%	0.9143	102.7	97.59	89.23		
-1年目	R 16	1%	0.9053	102.7	73.62	66.65		
供用開始年次	R 17	1%	0.8963	102.7			4.51	4.04
1年目	R 18	1%	0.8874	102.7			4.51	4.00
2年目	R 19	1%	0.8787	102.7			4.51	3.96
3年目	R 20	1%	0.8700	102.7			4.51	3.92
4年目	R 21	1%	0.8613	102.7			4.51	3.88
5年目	R 22	1%	0.8528	102.7			4.51	3.85
6年目	R 23	1%	0.8444	102.7			4.51	3.81
7年目	R 24	1%	0.8360	102.7			4.51	3.77
8年目	R 25	1%	0.8277	102.7			4.51	3.73
9年目	R 26	1%	0.8195	102.7			4.51	3.70
10年目	R 27	1%	0.8114	102.7			4.51	3.66
11年目	R 28	1%	0.8034	102.7			4.51	3.62
12年目	R 29	1%	0.7954	102.7			4.51	3.59
13年目	R 30	1%	0.7876	102.7			4.51	3.55
14年目	R 31	1%	0.7798	102.7			4.51	3.52
15年目	R 32	1%	0.7720	102.7			4.51	3.48
16年目	R 33	1%	0.7644	102.7			4.51	3.45
17年目	R 34	1%	0.7568	102.7			4.51	3.41
18年目	R 35	1%	0.7493	102.7			4.51	3.38
19年目	R 36	1%	0.7419	102.7			4.51	3.35
20年目	R 37	1%	0.7346	102.7			4.51	3.31
21年目	R 38	1%	0.7273	102.7			4.51	3.28
22年目	R 39	1%	0.7201	102.7			4.51	3.25
23年目	R 40	1%	0.7130	102.7			4.51	3.21
24年目	R 41	1%	0.7059	102.7			4.51	3.18
25年目	R 42	1%	0.6989	102.7			4.51	3.15
26年目	R 43	1%	0.6920	102.7			4.51	3.12
27年目	R 44	1%	0.6852	102.7			4.51	3.09
28年目	R 45	1%	0.6784	102.7			4.51	3.06
29年目	R 46	1%	0.6717	102.7			4.51	3.03
30年目	R 47	1%	0.6650	102.7			4.51	3.00
31年目	R 48	1%	0.6584	102.7			4.51	2.97
32年目	R 49	1%	0.6519	102.7			4.51	2.94
33年目	R 50	1%	0.6454	102.7			4.51	2.91
34年目	R 51	1%	0.6391	102.7			4.51	2.88
35年目	R 52	1%	0.6327	102.7			4.51	2.85
36年目	R 53	1%	0.6265	102.7			4.51	2.82
37年目	R 54	1%	0.6203	102.7			4.51	2.80
38年目	R 55	1%	0.6141	102.7			4.51	2.77
39年目	R 56	1%	0.6080	102.7			4.51	2.74
40年目	R 57	1%	0.6020	102.7			4.51	2.71
41年目	R 58	1%	0.5961	102.7			4.51	2.69
42年目	R 59	1%	0.5902	102.7			4.51	2.66
43年目	R 60	1%	0.5843	102.7			4.51	2.63
44年目	R 61	1%	0.5785	102.7			4.51	2.61
45年目	R 62	1%	0.5728	102.7			4.51	2.58
46年目	R 63	1%	0.5671	102.7			4.51	2.56
47年目	R 64	1%	0.5615	102.7			4.51	2.53
48年目	R 65	1%	0.5560	102.7			4.51	2.51
49年目	R 66	1%	0.5504	102.7	-14.41	-7.93	4.51	2.48
合計					720.53	682.72	225.45	160.00
単純事業費計					734.94		225.45	0.00

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道42号 紀宝熊野道路(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R6年	総走行台の年次別伸び率 東海ブロック				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車	普通貨物車	小型貨物車	合計				乗用車類	普通貨物	小型貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	普通貨物	小型貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 17	0.99895	1.00652	0.99072	0.99896	1%	0.8963	102.7	18.88	7.00	6.74	32.62	29.24	3.06	0.98	0.62	4.67	4.18	0.85	0.76	38.13	34.18
1年目	R 18	0.99895	1.00648	0.99063	0.99896	1%	0.8874	102.7	18.86	7.05	6.68	32.59	28.92	3.06	0.99	0.61	4.66	4.14	0.85	0.75	38.09	33.80
2年目	R 19	0.99895	1.00643	0.99054	0.99896	1%	0.8787	102.7	18.84	7.09	6.62	32.55	28.60	3.06	0.99	0.61	4.66	4.10	0.84	0.74	38.05	33.44
3年目	R 20	0.99895	1.00639	0.99045	0.99896	1%	0.8700	102.7	18.82	7.14	6.56	32.51	28.28	3.05	1.00	0.60	4.66	4.05	0.84	0.73	38.01	33.07
4年目	R 21	0.99895	1.00635	0.99036	0.99896	1%	0.8613	102.7	18.80	7.18	6.49	32.47	27.97	3.05	1.01	0.60	4.66	4.01	0.84	0.73	37.97	32.71
5年目	R 22	0.99253	0.99984	0.99257	0.99394	1%	0.8528	102.7	18.78	7.23	6.43	32.44	27.66	3.05	1.01	0.59	4.65	3.97	0.84	0.72	37.93	32.35
6年目	R 23	0.99248	0.99984	0.99251	0.99391	1%	0.8444	102.7	18.64	7.23	6.38	32.25	27.23	3.02	1.01	0.59	4.63	3.91	0.84	0.71	37.71	31.84
7年目	R 24	0.99242	0.99984	0.99246	0.99387	1%	0.8360	102.7	18.50	7.23	6.34	32.06	26.80	3.00	1.01	0.58	4.60	3.84	0.83	0.70	37.49	31.34
8年目	R 25	0.99236	0.99984	0.99240	0.99383	1%	0.8277	102.7	18.36	7.22	6.29	31.87	26.38	2.98	1.01	0.58	4.57	3.78	0.83	0.68	37.27	30.85
9年目	R 26	0.99230	0.99984	0.99234	0.99379	1%	0.8195	102.7	18.22	7.22	6.24	31.68	25.96	2.96	1.01	0.57	4.54	3.72	0.82	0.67	37.05	30.36
10年目	R 27	0.99224	0.99984	0.99228	0.99375	1%	0.8114	102.7	18.08	7.22	6.19	31.49	25.55	2.93	1.01	0.57	4.52	3.66	0.82	0.66	36.82	29.88
11年目	R 28	0.99218	0.99984	0.99222	0.99371	1%	0.8034	102.7	17.94	7.22	6.14	31.30	25.15	2.91	1.01	0.57	4.49	3.61	0.81	0.65	36.60	29.41
12年目	R 29	0.99212	0.99984	0.99216	0.99367	1%	0.7954	102.7	17.80	7.22	6.10	31.11	24.75	2.89	1.01	0.56	4.46	3.55	0.81	0.64	36.38	28.94
13年目	R 30	0.99206	0.99984	0.99210	0.99363	1%	0.7876	102.7	17.66	7.22	6.05	30.92	24.36	2.87	1.01	0.56	4.43	3.49	0.80	0.63	36.16	28.48
14年目	R 31	0.99199	0.99984	0.99203	0.99359	1%	0.7798	102.7	17.52	7.22	6.00	30.74	23.97	2.84	1.01	0.55	4.41	3.44	0.80	0.62	35.94	28.02
15年目	R 32	0.99193	0.99984	0.99197	0.99355	1%	0.7720	102.7	17.38	7.22	5.95	30.55	23.58	2.82	1.01	0.55	4.38	3.38	0.79	0.61	35.72	27.57
16年目	R 33	0.99186	0.99984	0.99191	0.99351	1%	0.7644	102.7	17.24	7.22	5.90	30.36	23.20	2.80	1.01	0.54	4.35	3.33	0.79	0.60	35.49	27.13
17年目	R 34	0.99180	0.99984	0.99184	0.99347	1%	0.7568	102.7	17.10	7.21	5.86	30.17	22.83	2.77	1.01	0.54	4.32	3.27	0.78	0.59	35.27	26.69
18年目	R 35	0.99173	0.99984	0.99177	0.99342	1%	0.7493	102.7	16.96	7.21	5.81	29.98	22.46	2.75	1.01	0.53	4.30	3.22	0.78	0.58	35.05	26.26
19年目	R 36	0.99166	0.99984	0.99170	0.99338	1%	0.7419	102.7	16.82	7.21	5.76	29.79	22.10	2.73	1.01	0.53	4.27	3.17	0.77	0.57	34.83	25.84
20年目	R 37	0.99159	0.99984	0.99163	0.99334	1%	0.7346	102.7	16.68	7.21	5.71	29.60	21.74	2.71	1.01	0.53	4.24	3.12	0.77	0.56	34.61	25.42
21年目	R 38	0.99152	0.99984	0.99156	0.99329	1%	0.7273	102.7	16.54	7.21	5.67	29.41	21.39	2.68	1.01	0.52	4.22	3.07	0.76	0.55	34.39	25.01
22年目	R 39	0.99145	0.99984	0.99149	0.99325	1%	0.7201	102.7	16.39	7.21	5.62	29.22	21.04	2.66	1.01	0.52	4.19	3.02	0.76	0.54	34.17	24.60
23年目	R 40	0.99137	0.99984	0.99142	0.99320	1%	0.7130	102.7	16.25	7.21	5.57	29.03	20.70	2.64	1.01	0.51	4.16	2.97	0.75	0.53	33.94	24.20
24年目	R 41	0.99130	0.99984	0.99135	0.99315	1%	0.7059	102.7	16.11	7.21	5.52	28.84	20.36	2.62	1.01	0.51	4.13	2.92	0.74	0.53	33.72	23.80
25年目	R 42	0.99122	0.99984	0.99127	0.99311	1%	0.6989	102.7	15.97	7.21	5.47	28.65	20.03	2.59	1.01	0.50	4.11	2.87	0.74	0.52	33.50	23.41
26年目	R 43	0.99114	0.99984	0.99119	0.99306	1%	0.6920	102.7	15.83	7.20	5.43	28.46	19.70	2.57	1.01	0.50	4.08	2.82	0.73	0.51	33.28	23.03
27年目	R 44	0.99106	0.99984	0.99111	0.99301	1%	0.6852	102.7	15.69	7.20	5.38	28.28	19.37	2.55	1.01	0.49	4.05	2.78	0.73	0.50	33.06	22.65
28年目	R 45	0.99098	0.99984	0.99103	0.99296	1%	0.6784	102.7	15.55	7.20	5.33	28.09	19.05	2.52	1.01	0.49	4.02	2.73	0.72	0.49	32.84	22.28
29年目	R 46	0.99090	0.99984	0.99095	0.99291	1%	0.6717	102.7	15.41	7.20	5.28	27.90	18.74	2.50	1.01	0.49	4.00	2.68	0.72	0.48	32.61	21.91
30年目	R 47	0.99082	0.99984	0.99087	0.99286	1%	0.6650	102.7	15.27	7.20	5.24	27.71	18.43	2.48	1.01	0.48	3.97	2.64	0.71	0.48	32.39	21.54
31年目	R 48	0.99073	0.99984	0.99079	0.99281	1%	0.6584	102.7	15.13	7.20	5.19	27.52	18.12	2.46	1.01	0.48	3.94	2.60	0.71	0.47	32.17	21.18
32年目	R 49	0.99065	0.99984	0.99070	0.99276	1%	0.6519	102.7	14.99	7.20	5.14	27.33	17.82	2.43	1.01	0.47	3.92	2.55	0.70	0.46	31.95	20.83
33年目	R 50	0.99056	0.99984	0.99061	0.99270	1%	0.6454	102.7	14.85	7.20	5.09	27.14	17.52	2.41	1.01	0.47	3.89	2.51	0.70	0.45	31.73	20.48
34年目	R 51	0.99047	0.99984	0.99052	0.99265	1%	0.6391	102.7	14.71	7.19	5.04	26.95	17.22	2.39	1.01	0.46	3.86	2.47	0.69	0.44	31.51	20.14
35年目	R 52	0.99038	0.99984	0.99043	0.99260	1%	0.6327	102.7	14.57	7.19	5.00	26.76	16.93	2.36	1.01	0.46	3.83	2.43	0.69	0.44	31.28	19.79
36年目	R 53	0.99028	0.99984	0.99034	0.99254	1%	0.6265	102.7	14.43	7.19	4.95	26.57	16.65	2.34	1.01	0.46	3.81	2.38	0.68	0.43	31.06	19.46
37年目	R 54	0.99019	0.99984	0.99025	0.99248	1%	0.6203	102.7	14.29	7.19	4.90	26.38	16.37	2.32	1.01	0.45	3.78	2.34	0.68	0.42	30.84	19.13
38年目	R 55	0.99009	0.99984	0.99015	0.99243	1%	0.6141	102.7	14.15	7.19	4.85	26.19	16.09	2.30	1.01	0.45	3.75	2.30	0.67	0.41	30.62	18.80
39年目	R 56	0.98999	0.99984	0.99005	0.99237	1%	0.6080	102.7	14.01	7.19	4.81	26.01	15.81	2.27	1.01	0.44	3.72	2.26	0.67	0.41	30.40	18.48
40年目	R 57	0.98989	0.99984	0.98995	0.99231	1%	0.6020	102.7	13.87	7.19	4.76	25.82	15.54	2.25	1.01	0.44	3.70	2.23	0.66	0.40	30.18	18.17
41年目	R 58	0.98979	0.99984	0.98985	0.99225	1%	0.5961	102.7	13.73	7.19	4.71	25.63	15.28	2.23	1.01	0.43	3.67	2.19	0.66	0.39	29.95	17.86
42年目	R 59	0.98968	0.99984	0.98975	0.99219	1%	0.5902	102.7	13.59	7.19	4.66	25.44	15.01	2.21	1.01	0.43	3.64	2.15	0.65	0.39	29.73	17.55
43年目	R 60	0.98957	0.99984	0.98964	0.99213	1%	0.5843	102.7	13.45	7.18	4.61	25.25	14.75	2.18	1.01	0.42	3.61	2.11	0.65	0.38	29.51	17.24
44年目	R 61	0.98946	0.99984	0.98953	0.99207	1%	0.5785	102.7	13.31	7.18	4.57	25.06	14.50	2.16	1.01	0.42	3.59	2.08	0.64	0.37	29.2	

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道42号	紀宝熊野道路	2	15.6km

■事業費内訳(事業全体)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					68,447	
	改良費				10,074	
		土工	m3	1,617,000	7,324	
		法面工	m ²	145,000	556	切土法面、盛土法面
		管渠工	m			
		函渠工	m	194	156	
		排水工	m	4,913	803	
		中央分離帯工	m	15,600	280	
		雑工	式	1	955	
	橋梁費				32,339	
		100m以上	m	4,865	32,283	
		100m未満	m		56	
	トンネル費				21,028	
		NATM	m	4,190	21,028	
		シールド	m			
	IC・JCT費				2,513	
		IC	箇所	2	2,513	紀宝ICハーフ、御浜IC
		JCT	箇所			
	舗装費				1,517	
		車道舗装	m ²	178,500	1,517	
		歩道舗装	m ²			
	付帯施設費				976	
		交通管理施設工	式	1	976	防護柵工等
		遮音壁	m			
②用地及補償費					4,252	
	用地費		m ²		3,361	
		宅地	m ²	20,000	519	
		田畑	m ²	351,000	2,808	
		山林・原野	m ²	69,100	35	
		その他	m ²			
	補償費	式	1	891		
③間接経費			式	1	12,201	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					84,900	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道42号	紀宝熊野道路	2	15.6km

■事業費内訳(残事業)

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					68,427	
	改良費				10,054	
		土工	m ³	1,617,000	7,324	
		法面工	m ²	145,000	556	切土法面、盛土法面
		管渠工	m			
		函渠工	m	194	156	
		排水工	m	4,913	803	
		中央分離帯工	m	15,600	280	
		雑工	式	1	935	
	橋梁費				32,339	
		100m以上	m	4,865	32,283	
		100m未満	m		56	
	トンネル費				21,028	
		NATM	m	4,190	21,028	
		シールド	m			
	IC・JCT費				2,513	
		IC	箇所	2	2,513	紀宝ICハーフ、御浜IC
		JCT	箇所			
	舗装費				1,517	
		車道舗装	m ²	178,500	1,517	
		歩道舗装	m ²			
	付帯施設費				976	
		交通管理施設工	式	1	976	防護柵工等
		遮音壁	m			
②用地及補償費					2,332	
	用地費			m ²	1,441	
		宅地	m ²	20,000	222	
		田畑	m ²	351,000	1,204	
		山林・原野	m ²	69,100	15	
		その他	m ²			
	補償費			式	1	891
③間接経費			式	1	9,940	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					80,699	

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

全事業 / 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道42号	紀宝熊野道路	2	17.0km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	17.0	5,800	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	19,000	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			24,800	

■更新費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
更新費	式			構造物の更新
更新費合計				

【単価等について】

- 維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。
 ○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。
