

報告に係る資料
【河川事業】

令和8年6月19日
河 川 部

目 次

1.	事業再評価対象事業位置図	・・・	1
2.	費用対効果実施判定票	・・・	2-1
3.	様式集		
	狩野川直轄河川改修事業	・・・	3-1
4.	流域委員会資料		
	令和8年度 第1回狩野川水系流域委員会		
	狩野川直轄河川改修事業	・・・	4-1

中部地方整備局 事業位置図



費用対効果分析実施判定票

年 度： 令和8年度	事 業 名： 狩野川直轄河川改修事業
担当課： 河川部 河川計画課	担当課長名： 小泉 陽彦

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。


項 目	判 定	
	判断根拠	チェック欄
(ア) 前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合		
事業目的 ・事業目的に変更がない	☐ 事業目的に変更がない ☒ 事業目的に変更がある 前回：既往最大洪水である狩野川台風(昭和33年9月洪水)に次ぐ規模の洪水(基準地点大仁：3,100m ³ /s)に対して、支川は既往最大洪水流量規模の洪水が発生した場合においても、外水氾濫による家屋等の浸水被害を防止することを目標とする。 今回：下流域の主要な地点黒瀬において、気候変動によって2℃上昇した場合でも年超過確率1/70程度の降雨により発生する洪水を安全に流下させることを目標とする。	☐
	外的要因 ・事業を巡る社会経済情勢の変化がない 判断根拠例[地元情勢等の変化がない]	☐
内的要因＜費用便益分析関係＞ ※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。 注)なお、下記2～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。		
1. 費用便益分析マニュアルの変更がない 判断根拠例[B/Cの算定方法に変更がない]	☐ 治水経済調査マニュアル(案)に変更がない ☒ 治水経済調査マニュアル(案)が改定(R2.4版⇒R7.7版)	☒
2. 需要量等の変更がない 判断根拠例[需要量等の減少が10%※以内]	☒ 需要量の減少が10%以内 前回：14,851(百万円)→今回：39,522(百万円)	☒
3. 事業費の変化 判断根拠例[事業費の増加が10%※以内]	☐ 事業費の増加が10%以内 ☒ 事業費の増加が10%以上 前回：46,338(百万円)→今回：122,085(百万円)	☐
4. 事業展開の変化 判断根拠例[事業期間の延長が10%※以内]	☐ 事業期間が変更 前回：事業期間 (H17～R16) 今回：事業期間 (R9～R38)	☐
(イ) 費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合		
・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい 判断根拠例[直近3か年の事業費の平均に対する分析費用1%以上] または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。	☒ 前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている (全体事業) 残事業費 6.8 ～ 7.0 残工期 6.9 ～ 6.9 資産額 7.5 ～ 6.2 (残事業) 残事業費 8.4 ～ 9.9 残工期 9.2 ～ 9.0 資産額 10.0 ～ 8.2	☒
前回評価で費用対効果分析を実施している		☒
以上より、費用対効果分析を実施するものとする。		

狩野川直轄河川改修事業 様式集

業務カルテ 概要図(流域図)


- | | |
|--------|--|
| [様式—1] | 狩野川水系直轄管理区間における氾濫ブロック分割 |
| [様式—2] | 資産データ |
| [様式—3] | 被害額 整備計画策定時河道(現況河道)
被害額 整備計画河道 |
| [様式—4] | 年平均被害軽減期待額 整備計画策定時河道→整備計画河道
年平均被害軽減期待額 整備計画策定時河道→当面整備河道 |
| [様式—5] | 費用対効果 (全体事業)
費用対効果 (全体事業・感度分析) |
| [様式—6] | 事業費の内訳書 (全体事業費) |

狩野川流域図

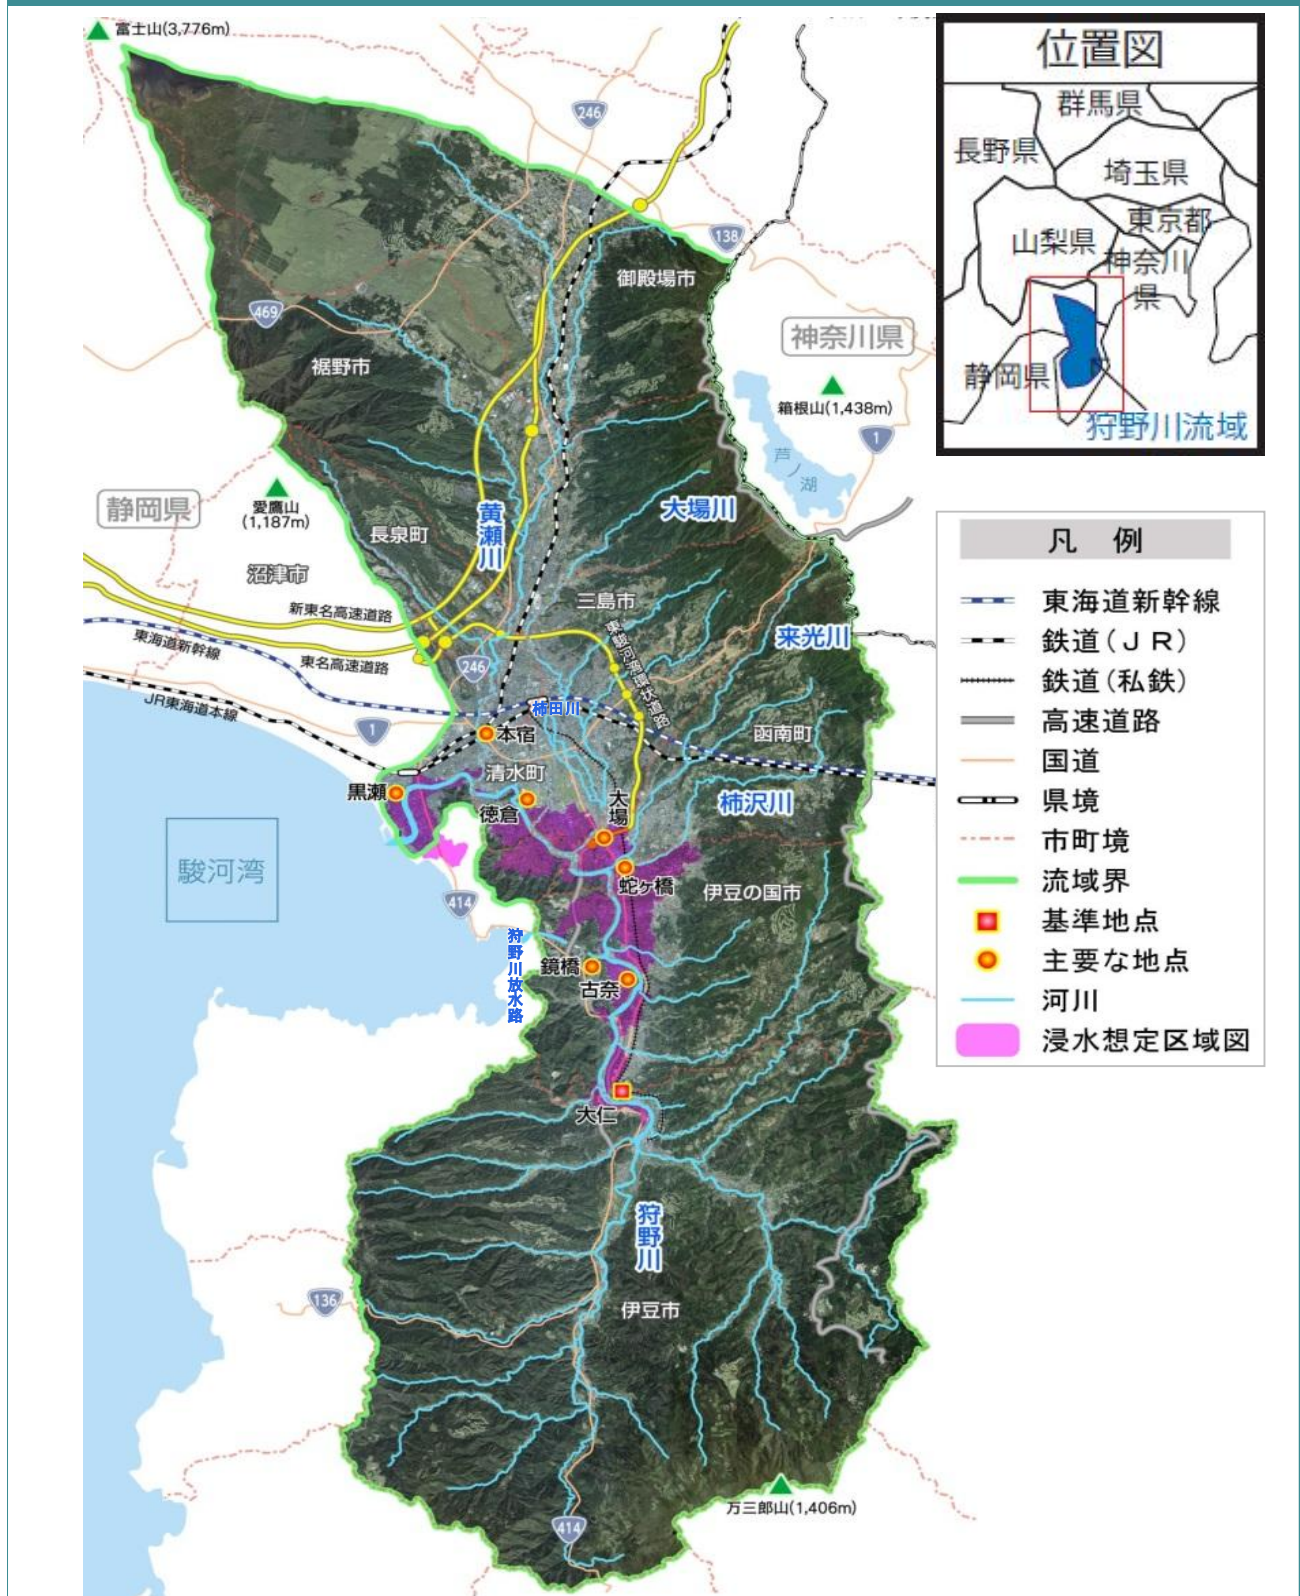

事業名 (箇所名)	狩野川直轄河川改修事業			担当課 担当課長名	水管理・国土保全局治水課 笠井 雅広			事業 主体	中部地方整備局																																					
実施箇所	静岡県沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町																																													
該当基準	社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業																																													
主な事業の諸元	堤防整備、護岸整備、浸透対策、河道掘削、工作物の改築、耐震対策																																													
事業期間	事業採択		令和9年度		完了		令和38年度																																							
総事業費(億円)	1,221			残事業費(億円)			1,221																																							
目的・必要性	<解決すべき課題・背景> - 令和元年東日本台風では、戦後最大の被害を発生させた狩野川台風と同規模の降雨により、浸水家屋約1,250戸の内水氾濫等による被害が発生した。 - 令和3年7月洪水では黄瀬川大橋橋梁の損傷、令和7年9月の集中豪雨による急激な水位上昇など、近年の降雨特性や気候変動による降雨量の増加など、災害発生リスクが高まっているため、流域一帯で対応を図る必要がある。 <達成すべき目標> 狩野川においては、下流域の主要な地点黒瀬において、気候変動によって2℃上昇した場合でも年超過確率1/70程度の降雨により発生する洪水を安全に流下させることを目標とする。 <政策体系上の位置づけ> - 政策目標：水害等災害による被害を軽減する。 - 施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する。																																													
便益の主な根拠	年平均被害軽減戸数：390戸 年平均浸水軽減面積：69ha																																													
事業全体の投資 効率性	基準年度		令和8年度																																											
	B:総便益(億円)		7,185		C:総費用(億円)		679		全体B/C (社会的割引率2%) (社会的割引率1%)	10.6 (14.7) (18.0)	B-C	6,506	EIRR(%)	193%																																
残事業の投資効 率性	B:総便益(億円)		7,185		C:総費用(億円)		679		継続B/C		10.6																																			
感度分析	<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">全体事業B/C</th><th colspan="4">残事業B/C</th></tr></thead><tbody><tr><td>残事業費(+10%～-10%)</td><td colspan="4">9.7 ～ 11.6</td><td colspan="4">9.7 ～ 11.6</td></tr><tr><td>残工期(-10%～+10%)</td><td colspan="4">10.1 ～ 11.0</td><td colspan="4">10.1 ～ 11.0</td></tr><tr><td>資産額(-10%～+10%)</td><td colspan="4">9.6 ～ 11.6</td><td colspan="4">9.6 ～ 11.6</td></tr></tbody></table>											全体事業B/C				残事業B/C				残事業費(+10%～-10%)	9.7 ～ 11.6				9.7 ～ 11.6				残工期(-10%～+10%)	10.1 ～ 11.0				10.1 ～ 11.0				資産額(-10%～+10%)	9.6 ～ 11.6				9.6 ～ 11.6			
	全体事業B/C				残事業B/C																																									
残事業費(+10%～-10%)	9.7 ～ 11.6				9.7 ～ 11.6																																									
残工期(-10%～+10%)	10.1 ～ 11.0				10.1 ～ 11.0																																									
資産額(-10%～+10%)	9.6 ～ 11.6				9.6 ～ 11.6																																									
事業の効果等	・事業実施前に変更河川整備計画目標流量の洪水が発生した場合の被害想定は、氾濫面積約1,700 ha、浸水人口約60,400人、浸水家屋約25,000戸であり、整備を実施することで氾濫面積、浸水人口、浸水家屋が解消される。																																													
社会経済情勢等 の変化	・令和元年東日本台風では、戦後最大の被害を発生させた狩野川台風と同規模の降雨により、浸水家屋約1,250戸の内水氾濫等による被害が発生した。 ・令和3年7月洪水では黄瀬川大橋橋梁の損傷、令和7年9月の集中豪雨による急激な水位上昇など、近年の降雨特性や気候変動による降雨量の増加など、災害発生リスクが高まっているため、流域一帯で対応を図る必要がある。 ・狩野川流域と他地域を結ぶ交通網としては、昭和39年(1964年)に東海道新幹線が開通、昭和44年(1969年)に東名高速道路が全通し、氾濫原に位置する下流域の沼津市や三島市は交通の要衝となっています。さらに、この地域は伊豆や富士といった観光地へ向かう交通網の整備も進められている。 ・近年では、新東名高速道路の一部開通(平成24年(2012年))、伊豆縦貫自動車道のうち東駿河湾環状道路(三島塚原～函南塚本間)(平成26年(2014年))、天城北道路(大平～月ヶ瀬間)(平成31年(2019年))の開通など、整備は着実に進んでおり、市街地の高密度化が進展している。 ・令和5年8月に、気候変動を考慮した流域治水プロジェクト2.0を公表し、流域全体で協力して治水安全度を向上させる取り組みを実施している。 ・流域市町がまちづくりや住まい方の誘導による水害に強い地域づくりを進める際、水害リスク情報の共有・提供など技術的な支援や、中高頻度の外力規模の浸水想定や施設整備前後の浸水想定などの水害リスク情報の提供等を行う。 ・住民の避難を促す取組や、水防への意識向上啓発、防災・減災教育の取組の推進などを行っている。																																													
主な事業の進捗 状況	・狩野川本川は、既往最大洪水である狩野川台風(昭和33年9月洪水)に次ぐ規模の洪水(基準地点大仁：3,100m ³ /s)に対して、支川は既往最大洪水流量規模の洪水が発生した場合においても、外水氾濫による家屋等の浸水被害を防止することを目標に河川整備を進めてきた。 ・整備計画策定以降、河道掘削、堤防整備等を進めており、減災対策としては、塚本地区に河川防災ステーションが整備された。																																													
主な事業の進捗 の見込み	・当面の段階的な整備(概ね5か年)として、黄瀬川合流点下流において河道掘削を実施するとともに、狩野川放水路下流区間の堤防整備や横断工作物の改築を継続して実施する。 ・中小規模洪水における流域の治水安全度を向上させるため、既設狩野川放水路分流堰の改築を実施する。																																													
コスト縮減や代 替案立案等の可 可能性	【コスト縮減】 ・河道掘削により発生する土砂は海岸養浜材や防災ステーション整備時の盛土材等として利活用することを積極的に検討し、コスト縮減を図る。 事業実施の各段階において、工法の工夫や新技術の採用などによるコスト縮減や工期短縮等に努める。 樹木伐開に合わせて天地返しや伐採木の配布を積極的に行うことで廃棄物の総量を減らし、コスト縮減を図る。 【代替案立案】 河川整備計画は、流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものであり、現時点においては河川整備計画における河川改修が最も妥当である。																																													
対応方針	改善継続																																													
対応方針理由	当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みや社会情勢の変化などから河川整備計画を変更し、改善継続することが妥当である。																																													
その他	<静岡県の意見・反映内容> (静岡県) 対応方針(原案)のとおり事業を改善継続することについて、異存はありません。 狩野川流域では、令和元年東日本台風や令和3年の豪雨など度重なる浸水被害に見舞われており、気候変動の影響により更なる豪雨の激甚化・頻発化が想定される中、治水対策に対する地域の要請はますます強くなっております。事業の実施に当たっては、関係者との十分な調整やコスト縮減・効率化などを図りながら、計画的かつ効果的な事業推進により、地域社会が事業効果を早期に享受できるようお願いいたします。																																													

【様式-1】 狩野川水系直轄管理区間における氾濫ブロック図

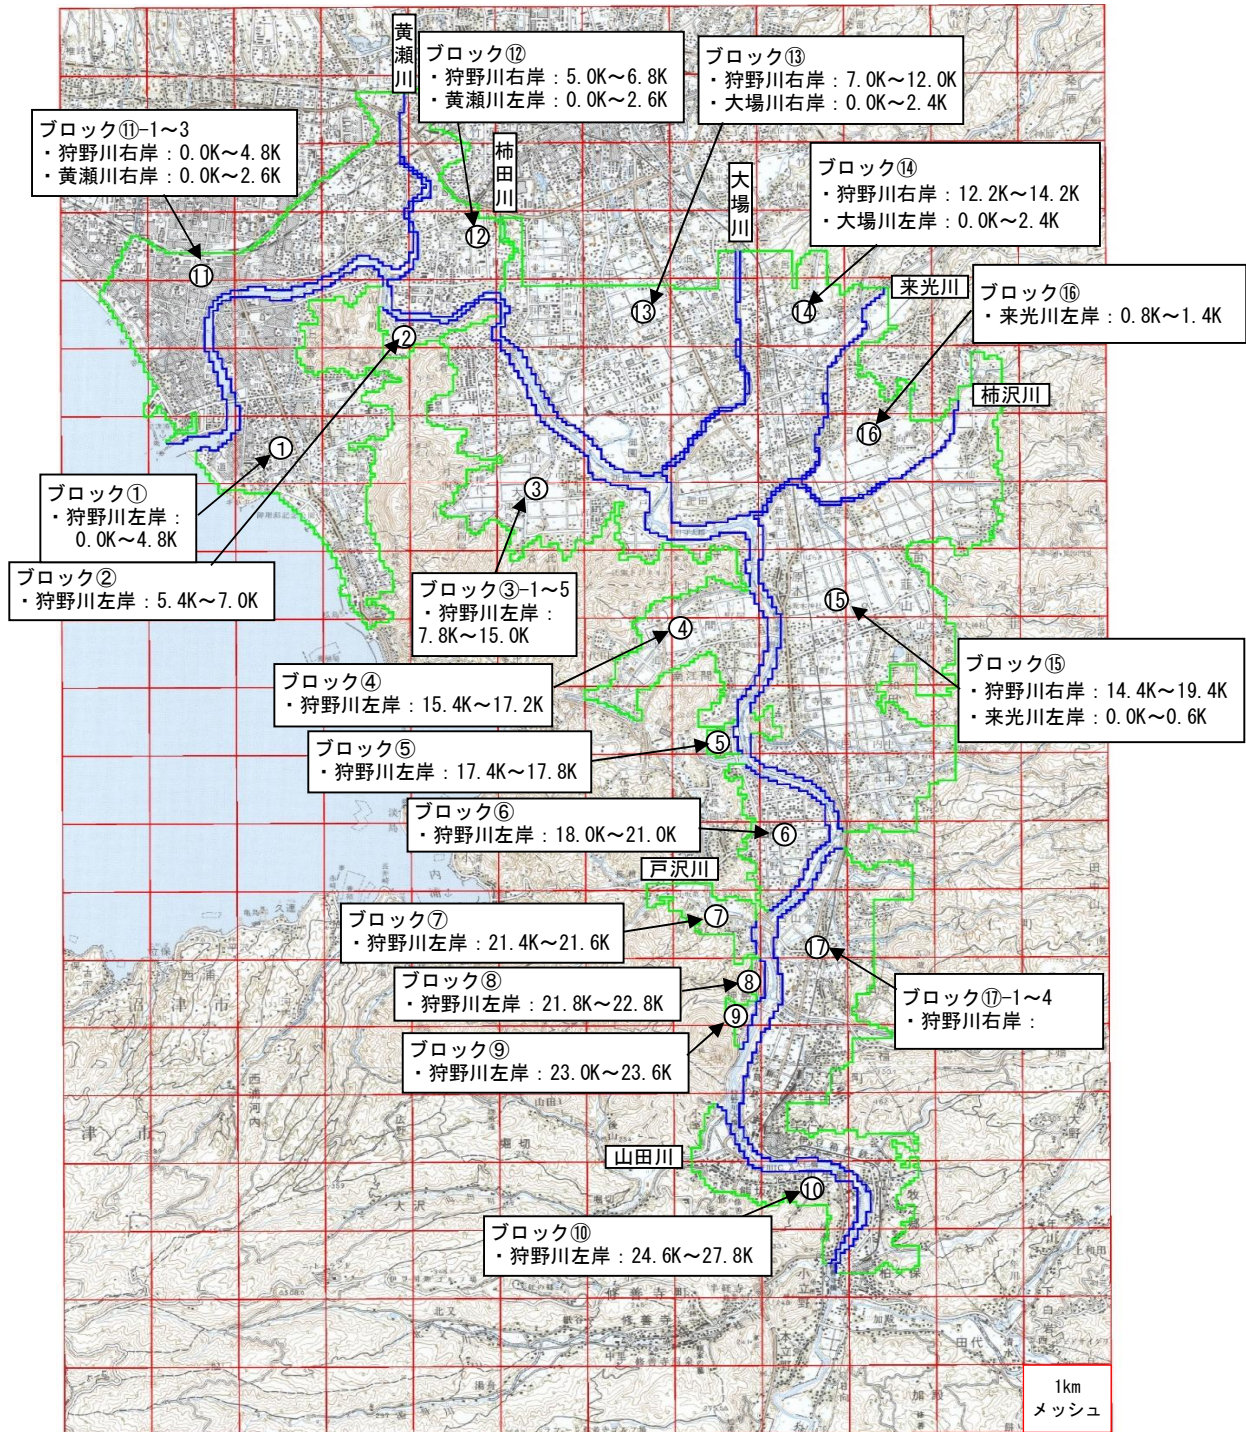

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）											合計
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (人)	農漁家数 (戸)	延床面積 (m ²)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		農作物資産				
										自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫	水稻	畑作物	小計		
1	5.97	31,034	13,701	11,205	123	2,336,125	1.1	4.5	610,663	128,349	47,980	55,971	20,872	381	120	1	25	26	864,362	
2	0.50	1,901	793	656	10	117,619	—	—	30,746	7,431	2,778	1,369	697	31	10	—	—	—	43,062	
3	4.75	11,923	4,656	2,670	104	794,406	137.2	16.9	207,658	43,613	16,304	7,179	4,965	323	102	131	95	226	280,370	
4	2.36	2,400	847	755	70	170,195	87.2	37.5	44,489	7,935	2,966	2,182	1,818	218	69	83	212	295	59,972	
5	0.14	219	82	63	4	10,846	—	—	2,835	772	289	193	146	12	4	—	—	—	4,251	
6	1.46	5,610	2,597	2,331	49	463,707	12.6	15.7	121,213	24,326	9,094	4,903	2,025	153	48	12	89	101	161,863	
7	0.73	554	206	89	26	51,420	15.8	9.9	13,441	1,931	722	439	195	82	26	15	56	71	16,907	
8	0.11	57	21	7	1	4,378	2.1	—	1,144	201	75	34	35	3	1	2	—	2	1,495	
9	0.15	139	65	2	2	8,755	2.6	—	2,289	606	226	3	—	7	2	3	—	3	3,136	
10	1.41	1,723	652	1,194	15	167,042	24.6	4.0	43,665	6,105	2,282	3,701	2,047	47	15	24	22	46	57,908	
11	5.99	34,169	15,914	21,006	68	2,356,739	4.2	—	616,052	149,086	55,732	106,889	38,198	212	67	4	—	4	966,240	
12	2.46	10,374	4,275	7,223	37	690,045	8.4	6.3	180,378	40,053	14,973	32,192	22,941	115	36	8	36	44	290,732	
13	6.23	16,712	6,573	12,455	124	834,234	154.6	5.3	218,069	61,572	23,017	54,214	34,756	385	122	148	30	178	392,313	
14	5.14	16,220	6,775	6,579	133	1,048,569	90.3	29.5	274,096	63,473	23,728	22,360	13,444	414	131	86	167	253	397,899	
15	11.29	18,294	7,206	5,307	497	1,200,224	389.0	170.5	313,738	67,506	25,235	16,793	10,806	1,546	488	372	964	1,336	437,448	
16	2.42	6,213	2,419	990	60	355,512	104.4	27.8	92,931	22,657	8,470	3,505	1,513	186	59	100	157	257	129,578	
17	6.08	13,349	5,427	7,561	131	1,039,207	63.9	26.5	271,649	50,843	19,006	39,501	21,013	407	128	61	150	211	402,758	
合計	57.19	170,891	72,209	80,093	1,454	11,649,023	1,098.0	354.4	3,045,056	676,459	252,877	351,428	175,471	4,522	1,428	1,050	2,003	3,053	4,510,294	

資産単価：「治水経済調査マニュアル 各種資産評価単価及びデフレーター 令和7年6月改正 国土交通省河川局河川計画課」におけるR5年評価額

様式-3 被害額（確率規模別整理：雨量1.10倍）

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模	一般資産被害額							農作物被害額		公共土木施設等被害額			営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1/3	293.2	4.5	—	64.9	37.1	—	—	—	—	296.6	—	64.3	3.0	1.4	4.4	3.9	0.3	—	769.2	
1/5	999.8	41.2	42.3	261.4	164.3	0.3	0.2	—	—	—	1,120.0	—	108.7	3.7	2.6	6.3	6.9	5.2	—	2,756.6
1/10	13,812.2	3,059.3	2,080.5	1,736.1	1,005.7	6.9	3.3	5.0	—	5.0	16,104.6	297.2	911.4	415.5	230.1	645.6	129.7	320.3	—	40,117.8
1/17	40,163.0	10,837.7	7,063.1	3,876.4	2,294.6	42.0	20.1	47.2	36.2	83.4	47,708.3	2,499.5	2,043.3	1,343.4	732.7	2,076.1	444.6	1,115.2	—	120,267.3
1/30	339,897.6	106,491.6	70,872.4	50,236.3	27,194.7	351.3	163.9	176.9	368.4	545.3	441,643.8	11,711.0	24,590.3	13,395.8	6,957.3	20,353.1	7,010.3	11,049.6	—	1,112,111.2
1/50	470,478.6	144,620.0	85,658.2	66,857.6	37,077.8	532.3	222.3	201.4	423.4	624.8	597,641.3	13,268.1	35,526.9	19,721.2	9,452.0	29,173.2	11,208.9	14,346.3	—	1,507,236.3
1/60	509,055.3	155,663.5	90,392.6	71,898.0	39,679.8	590.8	240.7	205.8	431.6	637.4	643,699.8	13,491.7	38,725.3	21,730.0	10,198.6	31,928.6	12,555.7	15,329.3	—	1,623,888.5
1/70	544,869.3	165,611.8	94,341.5	76,687.3	42,167.6	647.2	260.2	210.0	436.9	646.9	686,041.9	13,695.8	41,798.0	23,485.3	10,905.7	34,391.0	13,631.5	16,195.0	—	1,730,985.0
1/80	549,900.5	164,690.2	92,967.2	77,066.7	42,176.1	619.0	247.3	178.9	429.7	608.6	688,328.9	12,485.4	42,664.7	23,835.2	10,987.4	34,822.6	14,043.1	16,052.1	—	1,736,672.4
1/100	624,588.4	184,848.4	102,614.7	87,008.9	48,156.0	751.1	295.4	203.0	475.6	678.6	777,811.4	13,775.2	48,100.7	27,169.8	12,321.5	39,491.3	16,063.1	17,908.9	—	1,962,092.1

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模	一般資産被害額							農作物被害額		公共土木施設等被害額			営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1/17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1/30	107,450.5	32,514.5	19,318.2	10,033.9	5,956.4	165.3	73.5	65.4	171.3	236.7	130,229.8	5,530.6	5,786.3	4,150.0	2,092.4	6,242.4	1,697.3	3,229.0	—	328,464.4
1/50	164,983.6	47,498.5	26,186.7	18,927.8	12,173.7	261.6	107.2	114.4	237.3	351.7	200,443.2	8,774.3	10,955.2	6,932.2	3,305.7	10,237.9	3,293.3	4,590.6	—	508,785.3
1/60	136,123.4	39,778.3	20,636.6	12,469.6	7,772.8	250.9	98.4	88.6	220.3	308.9	161,110.2	7,089.2	8,317.2	5,906.5	2,677.5	8,584.0	3,020.4	3,764.1	—	409,324.0
1/70	144,413.1	41,637.6	21,255.7	13,010.6	8,111.9	270.7	105.4	91.0	224.7	315.7	169,773.4	7,215.6	8,931.8	6,332.2	2,832.4	9,164.6	3,309.7	3,918.3	—	431,434.1
1/80	268,485.0	79,222.8	50,900.7	32,471.5	16,945.4	324.7	131.0	117.6	300.2	417.8	332,772.6	9,045.6	18,602.5	11,072.6	5,470.6	16,543.2	5,832.1	8,106.6	—	839,801.5
1/100	421,911.6	126,243.8	77,244.5	59,705.4	32,680.1	509.2	218.3	209.3	441.1	650.4	533,136.5	13,798.9	31,947.7	17,770.7	8,506.8	26,277.5	10,035.4	12,677.4	—	1,347,036.7

単位：百万円

様式-3 被害額（確率規模別整理：雨量1.07倍）

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模	一般資産被害額							農作物被害額		公共土木施設等被害額			営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1/3	126.3	0.2	—	29.8	16.9	—	—	—	—	—	128.5	—	29.1	0.2	0.1	0.3	1.7	—	—	332.8
1/5	855.8	41.0	25.6	221.2	138.1	0.3	0.2	—	—	—	951.4	—	101.0	3.7	2.6	6.3	6.2	4.1	—	2,351.2
1/10	11,437.8	2,571.6	1,713.8	1,418.5	792.0	5.5	2.7	4.7	—	4.7	13,312.7	293.2	714.4	345.7	193.7	539.4	102.5	266.9	—	33,175.7
1/17	33,942.8	8,956.1	6,023.4	3,364.9	1,965.3	33.8	16.7	45.0	34.4	79.4	40,293.1	2,467.2	1,769.0	1,139.6	629.5	1,769.1	360.2	933.2	—	101,974.2
1/30	309,639.1	96,425.1	67,036.8	45,020.6	24,309.5	299.4	143.6	163.1	336.3	499.4	402,812.3	10,825.5	21,590.9	11,785.5	6,320.9	18,106.4	5,817.7	10,183.6	—	1,012,709.9
1/50	434,338.5	133,895.0	81,954.8	61,692.8	34,043.6	475.3	204.8	195.3	408.1	603.4	553,980.3	12,986.2	32,191.2	17,888.1	8,747.3	26,635.4	9,936.8	13,447.7	—	1,396,385.8
1/60	465,807.4	143,616.3	85,023.8	65,911.5	36,531.2	530.1	221.3	201.4	417.5	618.9	591,849.7	13,239.7	35,005.9	19,565.4	9,371.6	28,937.0	11,138.9	14,244.2	—	1,492,675.9
1/70	501,084.7	153,370.8	89,421.4	70,931.3	39,150.5	580.2	237.7	204.9	429.1	634.0	634,243.9	13,442.7	38,129.5	21,366.0	10,053.2	31,419.2	12,319.8	15,125.8	—	1,600,091.5
1/80	524,711.9	160,056.4	92,116.4	72,947.7	40,244.1	618.1	250.8	207.3	434.4	641.7	661,081.1	13,569.3	39,555.5	22,436.6	10,484.5	32,921.1	12,903.3	15,710.4	—	1,667,327.8
1/100	558,521.6	167,243.3	94,057.0	79,327.8	43,676.2	632.1	252.2	181.2	432.0	613.2	700,233.0	12,619.1	43,943.1	24,280.4	11,160.6	35,441.0	14,456.7	16,278.9	—	1,767,295.2

単位：百万円

様式-3 被害額 当面事業完成（R13河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模	一般資産被害額							農作物被害額		公共土木施設等被害額			営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/3	126.3	0.2	—	29.8	16.9	—	—	—	—	—	128.5	—	29.1	0.2	0.1	0.3	1.7	—	—	332.8
1/5	855.8	41.0	25.6	221.2	138.1	0.3	0.2	—	—	—	951.4	—	101.0	3.7	2.6	6.3	6.2	4.1	—	2,351.2
1/10	4,440.2	395.6	276.4	948.2	540.8	2.0	0.9	4.7	—	4.7	4,900.1	293.2	413.6	74.4	40.4	114.8	51.0	41.9	—	12,423.4
1/17	8,142.9	1,200.2	768.9	1,613.2	963.8	5.2	2.3	6.9	1.6	8.5	9,421.0	358.4	751.1	177.6	96.2	273.8	103.7	122.7	—	23,735.7
1/30	99,241.3	29,769.8	18,682.3	9,450.8	5,396.3	144.6	67.1	58.5	152.5	211.0	120,762.4	4,818.6	5,201.7	3,671.7	1,916.7	5,588.4	1,433.0	3,018.6	—	303,785.9
1/50	320,797.0	97,282.0	64,437.6	43,676.4	22,912.1	328.8	146.9	172.5	389.7	562.2	407,788.0	12,268.4	22,236.6	12,629.8	6,492.7	19,122.5	6,379.5	10,075.3	—	1,028,013.3
1/60	346,444.0	106,500.3	67,392.6	43,092.4	22,017.5	374.5	164.4	163.2	390.3	553.5	434,801.0	11,541.0	23,548.0	14,137.9	7,042.3	21,180.2	7,402.2	10,833.4	—	1,095,845.0
1/70	410,102.6	125,231.8	76,408.8	57,115.3	31,210.4	461.8	197.7	196.3	419.4	615.7	519,940.0	13,179.9	30,433.3	17,111.0	8,289.9	25,400.9	9,571.5	12,562.2	—	1,312,431.9
1/80	443,923.7	135,231.1	80,556.6	61,412.3	33,702.7	513.1	215.6	201.6	426.8	628.4	560,621.3	13,391.4	33,095.4	18,713.9	8,928.7	27,642.6	10,584.4	13,443.7	—	1,414,962.3
1/100	506,903.8	152,834.3	88,200.1	71,331.8	38,764.6	601.4	245.7	208.7	439.9	648.6	637,290.2	13,712.4	39,078.1	21,757.3	10,139.4	31,896.7	12,788.2	15,016.3	—	1,609,312.2

単位：百万円

様式-3 被害額（整備計画策定時(R8河道)：雨量1.10倍）

様式-3

被害額

整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/2

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍

水系名：狩野川

河川名：狩野川

流量規模：1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	293.2	4.5	—	64.9	37.1	—	—	—	—	—	296.6	—	64.3	3.0	1.4	4.4	3.9	0.3	—	769.2
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	293.2	4.5	—	64.9	37.1	—	—	—	—	—	296.6	—	64.3	3.0	1.4	4.4	3.9	0.3	—	769.2

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍

水系名：狩野川

河川名：狩野川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	999.8	41.2	42.3	261.4	164.3	0.3	0.2	—	—	—	1,120.0	—	108.7	3.7	2.6	6.3	6.9	5.2	—	2,756.6
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	999.8	41.2	42.3	261.4	164.3	0.3	0.2	—	—	—	1,120.0	—	108.7	3.7	2.6	6.3	6.9	5.2	—	2,756.6

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	3,015.6	392.4	263.9	391.0	191.1	1.5	0.7	5.0	—	5.0	3,158.2	297.2	228.5	68.9	38.6	107.5	35.4	40.9	—	8,128.9
⑪	8,014.5	2,520.3	1,737.6	547.3	287.0	4.6	2.3	—	—	—	9,730.3	—	340.3	299.5	168.9	468.4	60.1	265.3	—	23,978.0
⑫	2,782.1	146.6	79.0	797.8	527.6	0.8	0.3	—	—	—	3,216.1	—	342.6	47.1	22.6	69.7	34.2	14.1	—	8,010.9
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	13,812.2	3,059.3	2,080.5	1,736.1	1,005.7	6.9	3.3	5.0	—	5.0	16,104.6	297.2	911.4	415.5	230.1	645.6	129.7	320.3	—	40,117.8

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍

水系名：狩野川

河川名：狩野川

流量規模：1/17

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用				事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計					
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫														
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
③-1	9,782.9	2,440.9	1,654.9	382.4	260.2	4.8	2.5	1.5	6.9	8.4	10,780.3	121.6	246.4	324.1	186.2	510.3	81.7	255.2	—	26,532.5	
③-2	8,060.6	3,047.0	1,972.7	609.5	246.5	17.0	8.3	32.0	3.5	35.5	10,359.4	1,599.3	356.4	350.2	189.3	539.5	97.4	312.7	—	27,261.8	
③-3	1,055.8	193.5	98.1	195.4	194.4	1.7	0.9	5.8	7.3	13.1	1,290.9	294.2	80.4	26.4	11.9	38.3	39.7	18.2	—	3,514.6	
③-4	640.7	163.7	96.8	79.4	80.4	4.6	2.2	0.7	16.5	17.2	792.2	122.0	27.2	18.2	9.4	27.6	5.2	16.2	—	2,075.4	
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑩	4,629.4	758.4	510.4	636.5	318.4	4.2	1.9	7.2	—	7.2	5,089.6	342.1	306.3	92.1	53.7	145.8	54.8	79.0	—	12,884.0	
⑪	11,742.3	3,645.7	2,377.7	834.4	448.6	7.8	3.5	—	—	—	14,142.7	—	509.1	425.3	228.5	653.8	107.3	375.3	—	34,848.2	
⑫	4,251.3	588.5	352.5	1,138.8	746.1	1.9	0.8	—	2.0	2.0	5,253.2	20.3	517.5	107.1	53.7	160.8	58.5	58.6	—	13,150.8	
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	40,163.0	10,837.7	7,063.1	3,876.4	2,294.6	42.0	20.1	47.2	36.2	83.4	47,708.3	2,499.5	2,043.3	1,343.4	732.7	2,076.1	444.6	1,115.2	—	120,267.3	

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	89,735.2	29,072.8	22,149.6	14,382.1	4,939.2	35.3	19.5	—	10.5	10.5	118,967.4	65.0	4,944.5	3,146.6	1,841.4	4,988.0	1,480.7	3,191.2	—	293,981.0
②	17.6	1.9	1.9	0.6	0.3	—	—	—	—	—	16.5	—	1.5	1.3	0.6	1.9	0.3	0.2	—	42.7
③-1	70.3	13.4	5.6	1.3	0.9	—	—	—	—	—	67.8	—	2.3	5.3	2.5	7.8	0.7	1.2	—	171.3
③-2	18.2	3.1	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	16.1	—	0.5	2.1	1.0	3.1	0.1	0.2	—	41.6
③-3	20,131.9	6,298.2	4,182.3	934.3	622.6	15.2	7.6	1.7	9.0	10.7	23,886.7	146.0	531.6	686.0	373.5	1,059.5	221.6	652.9	—	58,701.1
③-4	11,896.2	4,438.0	2,631.5	929.6	427.6	26.6	12.1	36.0	5.3	41.3	15,108.3	1,671.8	466.2	501.3	257.2	758.5	138.6	440.4	—	38,986.7
③-5	851.6	222.5	118.8	99.7	100.4	8.0	3.5	0.8	16.7	17.5	1,042.1	126.1	35.4	27.8	12.9	40.7	7.9	21.3	—	2,695.5
④	2,907.1	1,221.1	757.0	318.7	261.7	15.4	8.6	27.6	76.3	103.9	4,073.4	1,723.1	154.3	157.4	83.2	240.6	38.0	123.2	—	11,946.1
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	47,513.1	15,171.2	8,459.9	2,796.2	1,205.9	59.6	24.7	4.4	37.2	41.6	55,821.2	426.5	2,003.0	1,838.4	864.9	2,703.3	873.4	1,472.2	—	138,571.8
⑦	1,683.1	514.2	251.9	73.1	36.4	12.6	4.9	3.4	3.2	6.6	1,911.6	173.9	28.7	70.3	31.5	101.8	31.0	47.7	—	4,877.5
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	6,608.1	1,182.3	838.3	889.5	446.6	6.5	3.1	7.5	—	7.5	7,401.0	346.1	398.5	129.5	73.5	203.0	84.9	125.9	—	18,541.3
⑪-1	47,577.0	14,077.7	7,782.7	8,515.0	5,227.9	6.5	2.9	—	—	—	61,726.7	—	3,646.1	1,717.8	814.5	2,532.3	1,077.7	1,361.9	—	153,534.4
⑪-2	17,280.8	5,814.4	5,084.5	2,076.6	715.4	3.5	1.3	—	—	—	22,984.6	—	3,887.1	1,430.6	634.8	2,065.4	1,116.2	679.0	—	61,708.8
⑪-3	4,417.1	1,506.5	923.8	298.6	101.1	4.6	2.1	—	—	—	5,382.3	—	213.9	177.6	91.4	269.0	40.1	151.4	—	13,310.5
⑫	5,196.6	816.4	494.1	1,373.8	903.0	2.2	0.9	—	5.1	5.1	6,519.9	36.6	630.2	136.0	70.3	206.3	69.7	81.6	—	16,336.4
⑬	22,225.9	7,179.3	4,439.4	9,808.7	6,853.3	34.1	14.0	28.8	12.1	40.9	37,511.5	1,411.5	3,580.3	910.1	468.0	1,378.1	841.2	723.8	—	96,042.0
⑭	22,009.9	6,715.0	4,996.5	2,841.7	1,993.5	39.7	19.9	12.9	60.6	73.5	28,653.1	894.3	1,527.3	810.6	456.3	1,266.9	384.3	729.6	—	72,145.2
⑮	27,290.1	8,928.6	5,762.0	1,823.1	899.5	58.9	29.5	41.8	101.1	142.9	33,235.4	3,985.9	1,157.9	1,261.0	682.6	1,943.6	319.7	915.2	—	86,492.3
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	5,800.6	1,319.1	757.7	464.5	341.8	17.4	7.1	5.3	31.3	36.6	6,461.4	402.7	256.6	160.4	78.3	238.7	112.3	129.4	—	16,345.9
⑰-2	5,005.0	1,490.9	903.4	2,504.1	2,065.8	5.0	2.1	6.5	—	6.5	8,886.4	289.3	1,084.2	166.2	84.8	251.0	148.4	149.2	—	22,791.3
⑰-3	1,662.2	505.0	331.5	104.9	51.7	0.2	0.1	0.2	—	0.2	1,970.4	12.2	40.2	59.5	34.1	93.6	23.5	52.1	—	4,847.8
合計	339,897.6	106,491.6	70,872.4	50,236.3	27,194.7	351.3	163.9	176.9	368.4	545.3	441,643.8	11,711.0	24,590.3	13,395.8	6,957.3	20,353.1	7,010.3	11,049.6	—	1,112,111.2

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時 (R8河道) 雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	122,824.7	37,894.3	24,408.9	18,537.9	7,086.7	53.0	25.0	—	12.2	12.2	156,436.1	65.0	6,522.1	4,459.1	2,294.6	6,753.7	2,024.0	3,881.5	—	386,525.1
②	574.2	157.0	105.4	38.2	14.9	0.5	0.3	—	—	—	660.8	—	33.3	26.0	14.9	40.9	4.2	16.3	—	1,646.0
③-1	581.8	138.6	104.8	13.8	10.1	0.3	0.2	—	—	—	630.2	—	10.5	18.1	10.9	29.0	3.0	15.2	—	1,537.5
③-2	30,694.8	9,432.0	5,330.5	1,387.4	995.4	26.7	11.1	1.8	12.2	14.0	35,525.4	162.2	853.0	1,111.1	539.6	1,650.7	387.7	919.7	—	87,390.6
③-3	16,049.3	5,802.3	3,292.8	1,284.6	622.8	39.0	15.7	37.5	5.3	42.8	20,113.0	1,708.1	682.0	703.9	336.7	1,040.6	234.1	566.6	—	51,493.7
③-4	1,248.8	287.0	132.3	115.0	121.2	13.0	4.6	0.9	16.7	17.6	1,426.1	130.2	54.4	42.6	17.9	60.5	14.3	26.1	—	3,651.1
④	5,120.9	1,881.4	1,129.5	527.7	429.9	28.7	14.0	29.0	83.5	112.5	6,776.0	1,771.7	257.4	221.0	115.9	336.9	68.4	187.6	—	18,642.6
⑤	32.0	7.8	—	1.3	0.5	—	—	—	—	—	30.9	—	2.2	5.3	2.4	7.7	0.7	0.5	—	83.6
⑥	62,688.7	19,100.8	8,726.0	3,290.3	1,427.6	90.3	30.5	4.4	43.6	48.0	70,752.8	430.6	2,978.2	2,840.0	1,194.1	4,034.1	1,489.7	1,733.6	—	176,821.2
⑦	2,219.2	618.8	298.0	117.2	50.4	18.3	6.6	3.5	3.5	7.0	2,469.8	182.0	45.4	96.0	40.3	136.3	46.5	57.1	—	6,272.6
⑧	490.0	77.7	31.7	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	471.5	24.4	11.5	14.0	5.5	19.5	7.4	6.8	—	1,177.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	8,420.7	1,527.8	955.8	1,112.5	574.8	9.0	3.8	7.8	—	7.8	9,352.5	350.2	483.5	171.3	89.2	260.5	115.7	154.7	—	23,329.3
⑪-1	61,197.8	17,894.1	8,820.1	9,860.7	6,002.0	10.1	3.9	—	—	—	77,011.2	—	5,572.6	2,550.5	1,126.5	3,677.0	1,943.2	1,664.3	—	193,657.0
⑪-2	22,371.5	7,522.4	5,994.9	2,692.6	973.3	5.1	2.0	—	—	—	29,354.8	—	5,045.7	1,935.5	831.7	2,767.2	1,555.4	842.1	—	79,127.0
⑪-3	7,486.3	2,452.9	1,381.6	523.0	238.7	7.0	2.8	—	—	—	8,972.5	—	362.1	300.5	147.6	448.1	78.3	238.9	—	22,192.2
⑫	5,977.8	1,054.1	661.5	1,557.9	1,022.0	2.6	1.0	—	7.5	7.5	7,625.5	44.7	739.1	167.1	85.5	252.6	88.6	106.9	—	19,141.8
⑬	32,939.4	11,636.9	7,092.7	14,072.1	9,197.4	49.2	19.4	31.1	12.1	43.2	55,655.2	1,479.9	5,378.5	1,468.7	736.8	2,205.5	1,450.6	1,166.9	—	142,386.9
⑭	32,798.1	10,028.3	6,743.5	4,215.0	2,890.4	62.0	28.1	13.5	60.9	74.4	42,120.0	931.1	2,314.7	1,270.1	668.7	1,938.8	648.0	1,044.9	—	105,837.3
⑮	35,567.3	11,744.6	7,693.3	2,564.1	1,336.2	80.6	40.4	58.2	133.3	191.5	43,797.6	5,210.6	1,529.6	1,597.5	866.0	2,463.5	425.2	1,211.0	—	113,855.5
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	8,906.6	1,984.5	1,033.6	624.9	467.6	25.5	8.9	5.5	32.6	38.1	9,684.3	423.1	418.3	271.0	124.1	395.1	197.7	188.0	—	24,396.2
⑰-2	8,726.1	2,283.5	1,108.7	4,102.0	3,482.3	9.0	3.0	6.7	—	6.7	14,628.2	293.4	2,143.4	318.3	139.0	457.3	358.9	211.3	—	37,813.8
⑰-3	3,562.6	1,093.2	612.6	202.6	116.1	1.1	0.6	1.0	—	1.0	4,146.9	60.9	89.4	133.6	64.1	197.7	67.3	106.3	—	10,258.3
合計	470,478.6	144,620.0	85,658.2	66,857.6	37,077.8	532.3	222.3	201.4	423.4	624.8	597,641.3	13,268.1	35,526.9	19,721.2	9,452.0	29,173.2	11,208.9	14,346.3	—	1,507,236.3

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	134,695.0	41,003.2	25,820.9	20,542.0	7,781.5	58.1	26.3	—	12.2	12.2	170,605.9	65.0	7,103.5	4,869.5	2,449.4	7,318.9	2,194.3	4,163.1	—	421,389.9
②	1,030.3	313.1	245.4	71.7	28.0	0.8	0.5	—	—	—	1,253.9	—	54.8	39.0	24.5	63.5	7.3	34.8	—	3,104.1
③-1	872.5	216.8	177.8	22.7	16.7	0.5	0.3	—	—	—	969.9	—	15.5	24.9	14.9	39.8	5.5	24.6	—	2,362.6
③-2	34,585.9	10,685.1	5,774.5	1,543.6	1,108.3	30.4	12.3	1.8	14.3	16.1	39,875.2	162.2	1,003.2	1,302.3	614.0	1,916.3	480.5	1,025.4	—	98,219.0
③-3	17,884.7	6,360.6	3,401.0	1,472.2	718.5	44.8	18.0	38.0	5.3	43.3	22,185.6	1,716.1	796.4	797.7	370.3	1,168.0	288.1	608.1	—	56,705.4
③-4	1,303.7	301.5	134.4	120.4	127.0	14.2	5.1	0.9	16.7	17.6	1,488.6	130.2	60.2	46.0	19.1	65.1	16.0	27.2	—	3,811.2
④	6,094.4	2,131.5	1,303.1	614.1	493.1	33.2	15.5	29.4	84.3	113.7	7,928.1	1,795.9	299.2	260.8	132.3	393.1	85.7	214.0	—	21,514.6
⑤	233.1	115.7	87.0	19.6	11.9	1.2	0.7	—	—	—	348.2	—	10.0	13.8	8.2	22.0	3.7	12.6	—	865.7
⑥	67,694.6	20,018.4	8,748.6	3,398.6	1,475.6	99.2	32.2	4.4	44.0	48.4	75,288.6	430.6	3,300.9	3,191.2	1,305.8	4,497.0	1,718.6	1,792.2	—	188,543.5
⑦	2,530.5	672.1	309.8	138.8	56.7	19.7	7.1	3.6	3.8	7.4	2,771.1	186.1	52.1	105.1	44.0	149.1	55.4	61.2	—	7,017.1
⑧	490.0	78.1	34.0	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	473.4	24.4	11.5	14.1	5.6	19.7	7.4	7.0	—	1,182.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	8,839.9	1,613.7	1,001.8	1,170.2	602.5	9.7	3.9	7.9	—	7.9	9,825.3	358.3	507.7	182.5	93.5	276.0	124.0	162.9	—	24,503.8
⑪-1	63,641.8	18,641.9	9,058.7	10,126.8	6,118.5	10.7	4.1	—	—	—	79,841.0	—	5,822.1	2,672.1	1,177.1	3,849.2	2,057.6	1,725.7	—	200,898.1
⑪-2	24,045.3	7,997.6	6,268.0	2,956.5	1,060.6	6.3	2.4	—	—	—	31,413.8	—	5,708.1	2,199.1	919.2	3,118.3	1,819.4	888.7	—	85,285.0
⑪-3	8,587.8	2,794.9	1,551.1	602.5	283.2	8.1	3.2	—	—	—	10,262.4	—	419.6	352.3	169.0	521.3	95.4	270.8	—	25,400.3
⑫	1,658.5	54.7	47.3	739.3	585.3	0.1	—	—	2.9	2.9	2,289.3	28.4	293.9	10.6	5.7	16.3	25.3	6.4	—	5,747.7
⑬	36,226.4	12,805.4	7,803.9	15,322.4	10,025.5	54.8	21.0	31.5	12.1	43.6	61,036.4	1,496.0	6,005.8	1,662.3	813.9	2,476.2	1,643.5	1,284.0	—	156,244.9
⑭	36,967.0	11,247.8	7,352.3	4,655.5	3,215.2	68.8	29.7	13.7	60.9	74.6	47,143.9	935.2	2,593.1	1,449.5	745.2	2,194.7	730.2	1,158.8	—	118,366.8
⑮	38,090.4	12,664.9	8,334.8	2,839.0	1,486.1	88.9	44.5	60.8	141.4	202.2	47,153.1	5,373.7	1,644.0	1,695.8	915.9	2,611.7	467.8	1,308.3	—	122,309.4
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	9,708.6	2,201.0	1,142.7	663.8	498.3	28.2	9.4	5.5	33.7	39.2	10,574.9	431.2	461.4	311.4	140.2	451.6	221.6	208.3	—	26,640.2
⑰-2	9,999.9	2,533.8	1,152.6	4,647.2	3,845.6	10.3	3.3	6.7	—	6.7	16,467.0	293.4	2,459.3	376.1	159.8	535.9	425.6	229.7	—	42,610.3
⑰-3	3,875.0	1,211.7	642.9	214.3	124.2	1.5	0.8	1.1	—	1.1	4,504.2	65.0	103.0	153.9	71.0	224.9	82.8	115.5	—	11,166.9
合計	509,055.3	155,663.5	90,392.6	71,898.0	39,679.8	590.8	240.7	205.8	431.6	637.4	643,699.8	13,491.7	38,725.3	21,730.0	10,198.6	31,928.6	12,555.7	15,329.3	—	1,623,888.5

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/70

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	145,407.8	44,060.5	27,217.3	22,205.4	8,450.1	64.4	28.4	0.2	12.2	12.4	183,596.2	77.2	7,693.9	5,234.7	2,604.0	7,838.7	2,364.1	4,440.6	—	453,457.0
②	1,500.4	472.4	384.6	98.5	41.1	1.4	0.7	—	—	—	1,854.4	—	74.0	56.6	34.3	90.9	11.6	53.4	—	4,583.4
③-1	37,356.4	11,524.6	6,086.8	1,646.6	1,182.4	33.5	13.3	1.8	14.5	16.3	42,920.0	162.2	1,116.2	1,455.9	673.4	2,129.3	555.4	1,097.2	—	105,840.2
③-2	19,212.6	6,727.1	3,464.0	1,631.6	811.3	49.0	19.4	38.4	5.3	43.7	23,680.8	1,728.4	873.8	861.2	393.4	1,254.6	328.0	634.9	—	60,459.2
③-3	1,457.5	319.9	137.6	121.4	128.4	16.0	5.5	1.1	16.7	17.8	1,622.2	142.5	67.2	54.3	21.7	76.0	19.5	28.5	—	4,160.0
④	6,887.1	2,346.6	1,444.8	688.7	552.2	38.1	17.5	29.7	85.4	115.1	8,885.4	1,808.0	335.1	290.6	146.1	436.7	101.0	236.2	—	23,892.5
⑤	584.8	272.7	162.6	56.1	38.7	3.0	1.4	—	—	—	830.5	—	24.4	29.6	15.5	45.1	11.1	27.1	—	2,057.5
⑥	72,178.7	20,764.7	8,762.0	3,485.0	1,513.9	108.2	33.8	4.4	44.0	48.4	79,279.9	430.6	3,664.4	3,501.5	1,401.7	4,903.2	1,922.5	1,839.5	—	198,934.8
⑦	2,702.5	689.6	320.6	173.8	64.3	20.3	7.2	3.6	4.2	7.8	2,951.9	190.1	59.0	109.5	45.5	155.0	57.9	62.9	—	7,462.9
⑧	498.6	82.9	35.6	17.6	17.9	1.3	0.4	0.5	—	0.5	485.5	24.4	11.8	14.3	5.7	20.0	7.6	7.4	—	1,211.5
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	9,254.2	1,691.6	1,021.9	1,241.3	638.3	10.1	4.1	7.9	—	7.9	10,285.3	358.3	537.3	192.4	97.2	289.6	135.0	169.1	—	25,644.0
⑪-1	65,624.9	19,243.7	9,329.2	10,344.4	6,221.1	11.3	4.4	—	—	—	82,198.1	—	5,960.7	2,774.8	1,219.2	3,994.0	2,108.8	1,780.1	—	206,820.7
⑪-2	25,930.9	8,345.4	6,454.1	3,380.3	1,138.9	6.5	2.5	—	—	—	33,581.8	—	6,319.7	2,422.5	1,011.5	3,434.0	1,980.2	922.0	—	91,496.3
⑪-3	9,454.4	3,105.1	1,668.7	673.7	325.0	9.3	3.6	—	—	—	11,307.9	—	463.4	399.1	188.9	588.0	109.4	297.4	—	28,005.9
⑫	2,192.3	112.1	82.6	990.0	783.0	0.2	0.1	—	3.3	3.3	3,086.9	28.4	384.8	13.9	8.1	22.0	37.8	12.1	—	7,735.6
⑬	38,557.8	13,598.0	8,026.3	16,077.9	10,515.4	59.4	22.6	32.0	12.1	44.1	64,448.1	1,508.2	6,435.9	1,796.1	867.6	2,663.7	1,774.6	1,347.2	—	165,079.2
⑭	40,594.9	12,412.0	7,938.2	5,033.0	3,465.8	75.0	31.9	13.7	60.9	74.6	51,606.7	935.2	2,840.8	1,602.7	816.3	2,419.0	816.5	1,267.8	—	129,511.4
⑮	40,414.8	13,541.3	8,717.8	3,111.1	1,654.1	98.0	49.2	63.2	144.6	207.8	50,149.0	5,504.5	1,747.6	1,768.8	958.2	2,727.0	502.1	1,386.7	—	129,811.0
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	10,339.0	2,348.9	1,213.7	699.3	519.2	29.8	9.9	5.6	33.7	39.3	11,248.6	435.3	491.5	336.4	151.5	487.9	242.5	221.9	—	28,326.8
⑰-2	10,485.6	2,617.4	1,205.6	4,783.3	3,973.7	10.5	3.4	6.7	—	6.7	17,124.9	293.4	2,581.3	397.2	167.4	564.6	450.2	238.2	—	44,338.8
⑰-3	4,234.1	1,335.3	667.5	228.3	132.8	1.9	0.9	1.2	—	1.2	4,897.8	69.1	115.2	173.2	78.5	251.7	95.7	124.8	—	12,156.3
合計	544,869.3	165,611.8	94,341.5	76,687.3	42,167.6	647.2	260.2	210.0	436.9	646.9	686,041.9	13,695.8	41,798.0	23,485.3	10,905.7	34,391.0	13,631.5	16,195.0	—	1,730,985.0

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/80

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	152,522.5	46,041.2	28,050.3	23,474.4	8,888.8	68.7	29.8	0.2	12.2	12.4	192,234.3	81.3	8,105.4	5,483.4	2,710.6	8,194.0	2,498.0	4,615.9	—	474,817.0
②	1,856.5	609.8	443.6	137.0	55.0	1.8	0.9	—	—	—	2,303.6	—	94.2	70.2	41.6	111.8	17.6	65.6	—	5,697.4
③	40,098.6	12,271.1	6,292.4	1,745.7	1,260.3	37.3	14.2	8.1	20.6	28.7	45,796.0	696.4	1,231.2	1,627.6	737.9	2,365.5	627.5	1,156.5	—	113,621.4
④	7,673.5	2,591.1	1,516.8	764.7	597.7	43.4	19.5	30.0	86.7	116.7	9,799.4	1,816.1	371.3	326.8	161.4	488.2	122.9	255.9	—	26,177.2
⑤	671.1	318.2	199.9	60.8	41.6	3.4	1.5	—	—	—	961.9	—	26.4	33.1	16.9	50.0	11.8	32.3	—	2,378.9
⑥	76,288.1	21,276.3	8,778.7	3,546.6	1,537.4	115.4	35.5	4.4	44.2	48.6	82,790.9	430.6	3,927.2	3,764.9	1,481.2	5,246.1	2,092.5	1,872.4	—	207,986.3
⑦	2,926.0	720.4	328.1	177.6	67.4	22.4	7.5	3.8	4.2	8.0	3,153.1	194.1	63.7	116.5	47.9	164.4	66.1	65.3	—	7,964.1
⑧	514.9	87.2	36.7	18.2	18.6	1.4	0.5	0.5	—	0.5	502.7	24.4	11.9	15.0	6.0	21.0	7.6	7.7	—	1,253.3
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	9,562.9	1,749.4	1,042.5	1,268.3	650.5	10.6	4.3	7.9	—	7.9	10,602.1	358.3	559.8	199.9	100.6	300.5	143.6	173.9	—	26,434.6
⑪-1	67,697.1	19,733.4	9,472.9	10,540.6	6,318.2	11.7	4.6	—	—	—	84,423.6	—	6,157.4	2,875.7	1,258.1	4,133.8	2,193.9	1,819.6	—	212,506.8
⑪-2	28,141.2	8,773.7	6,527.5	3,495.5	1,193.5	7.1	2.7	—	—	—	35,720.8	—	6,801.8	2,649.6	1,096.9	3,746.5	2,145.7	953.3	—	97,509.3
⑪-3	9,959.3	3,241.2	1,749.1	709.2	345.0	9.7	3.7	—	—	—	11,884.8	—	497.4	422.2	197.5	619.7	122.9	310.9	—	29,452.9
⑫	2,610.6	151.3	102.5	1,125.4	884.0	0.3	0.2	—	4.7	4.7	3,616.7	36.6	412.9	15.7	9.6	25.3	39.8	15.8	—	9,026.1
⑬	35,570.8	12,638.7	7,703.4	14,889.0	9,790.5	54.1	20.8	31.4	12.1	43.5	59,855.1	1,492.0	5,798.3	1,630.8	802.8	2,433.6	1,581.7	1,267.3	—	153,138.8
⑭	44,363.1	13,514.3	8,384.1	5,457.6	3,762.7	81.5	33.8	13.7	60.9	74.6	56,093.0	935.2	3,094.9	1,769.8	893.4	2,663.2	898.0	1,364.3	—	140,720.3
⑮	42,179.8	14,180.8	9,118.8	3,329.1	1,784.6	104.7	52.7	65.1	150.2	215.3	52,496.8	5,614.4	1,822.0	1,829.3	991.0	2,820.3	529.1	1,451.6	—	135,700.0
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	11,151.2	2,578.4	1,281.9	740.0	545.9	32.1	10.4	5.6	33.9	39.5	12,124.1	439.4	533.8	370.5	165.8	536.3	268.9	240.5	—	30,522.4
⑰-2	11,635.6	2,831.4	1,249.8	5,351.8	4,295.2	11.4	3.8	6.8	—	6.8	18,831.3	297.5	3,032.3	449.4	186.0	635.4	572.8	254.3	—	49,009.4
⑰-3	4,477.7	1,382.3	688.2	235.2	139.2	2.0	0.9	1.4	—	1.4	5,138.7	69.1	122.8	184.8	82.2	267.0	102.7	129.0	—	12,756.2
合計	549,900.5	164,690.2	92,967.2	77,066.7	42,176.1	619.0	247.3	178.9	429.7	608.6	688,328.9	12,485.4	42,664.7	23,835.2	10,987.4	34,822.6	14,043.1	16,052.1	—	1,736,672.4

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設	清掃労働 対価		代 替 活動等	小計					
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫														
①	170,443.8	51,160.3	30,413.0	25,620.4	9,771.7	77.6	32.9	0.2	12.2	12.4	213,339.9	81.3	9,059.3	6,318.5	3,050.9	9,369.4	2,918.1	5,082.0	—	527,382.1	
②	2,280.1	735.3	539.3	151.4	65.9	2.1	1.0	—	—	—	2,801.1	—	104.2	84.3	48.1	132.4	19.6	79.4	—	6,911.8	
③	49,361.6	14,661.7	7,058.9	2,190.0	1,638.5	61.3	21.9	19.1	40.3	59.4	55,645.5	1,386.8	1,651.6	2,121.2	934.4	3,055.6	842.1	1,353.2	—	138,988.1	
④	13,019.1	3,951.1	2,125.4	1,155.1	921.7	80.1	31.6	30.6	91.1	121.7	15,792.9	1,840.4	594.5	520.2	238.6	758.8	228.8	378.6	—	40,999.8	
⑤	1,048.1	473.4	222.9	86.7	60.5	6.2	2.1	—	—	—	1,409.7	—	53.1	65.6	28.4	94.0	30.5	43.4	—	3,530.6	
⑥	83,898.5	21,981.3	8,830.1	3,628.0	1,571.2	125.8	38.4	4.4	44.4	48.8	89,094.4	430.6	4,298.5	4,299.6	1,632.2	5,931.8	2,353.2	1,919.5	—	224,150.1	
⑦	3,439.8	799.8	352.7	228.8	81.5	26.2	8.9	4.0	4.3	8.3	3,663.8	206.3	79.9	134.3	54.0	188.3	85.2	71.8	—	9,241.3	
⑧	540.1	92.7	39.8	19.6	20.1	1.5	0.5	0.5	—	0.5	530.1	24.4	12.3	15.7	6.3	22.0	7.9	8.3	—	1,319.8	
⑨	218.0	192.0	101.8	0.4	—	1.2	0.4	0.7	—	0.7	381.2	32.5	0.4	25.8	11.7	37.5	0.6	18.3	—	985.0	
⑩	11,268.7	1,995.1	1,114.9	1,415.9	741.0	12.2	4.8	8.1	—	8.1	12,282.1	362.4	651.0	244.3	116.6	360.9	182.0	193.8	—	30,592.9	
⑪-1	73,767.4	21,014.8	9,945.6	10,919.3	6,511.2	13.7	5.1	—	—	—	90,655.4	—	6,643.6	3,204.4	1,373.8	4,578.2	2,422.4	1,928.8	—	228,405.5	
⑪-2	24,771.7	8,179.9	6,388.3	3,000.3	1,089.5	6.5	2.5	—	—	—	32,231.5	—	5,997.0	2,263.0	945.4	3,208.4	1,902.3	907.6	—	87,685.5	
⑪-3	11,656.5	3,733.8	1,937.6	830.2	419.2	11.5	4.4	—	—	—	13,796.1	—	589.0	493.3	229.2	722.5	152.5	353.3	—	34,206.6	
⑫	3,404.7	222.1	135.8	1,462.1	1,114.7	0.6	0.3	—	6.2	6.2	4,704.6	40.6	493.9	24.3	13.1	37.4	51.0	22.3	—	11,696.3	
⑬	42,868.4	15,144.1	8,713.7	17,383.6	11,494.0	65.8	24.8	32.5	12.1	44.6	71,005.2	1,532.6	7,136.2	2,045.3	966.1	3,011.4	1,999.6	1,486.3	—	181,910.3	
⑭	58,875.6	18,320.6	11,374.5	7,034.4	4,674.4	103.9	40.6	15.9	60.9	76.8	74,514.6	1,080.0	4,118.3	2,390.2	1,187.6	3,577.8	1,284.8	1,850.0	—	186,926.3	
⑮	49,383.5	16,796.2	10,781.2	4,141.9	2,276.8	135.8	68.1	75.1	183.1	258.2	62,018.9	5,992.2	2,102.4	2,014.6	1,103.9	3,118.5	624.2	1,718.1	—	159,416.0	
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑰-1	18,974.3	3,835.7	1,831.3	7,478.5	5,545.0	16.6	6.0	9.9	21.0	30.9	27,964.0	655.4	4,364.3	668.4	281.8	950.2	831.8	353.0	—	72,837.0	
⑰-2	5,184.0	1,550.6	704.8	251.7	151.8	2.5	1.1	1.6	—	1.6	5,822.1	77.2	146.9	233.0	97.6	330.6	125.0	140.5	—	14,490.4	
⑰-3	47.1	5.4	—	1.9	1.3	—	—	0.4	—	0.4	41.3	32.5	1.8	3.6	1.6	5.2	0.5	0.3	—	137.7	
⑰-4	137.4	2.5	3.1	8.7	6.0	—	—	—	—	—	117.0	—	2.5	0.2	0.2	0.4	1.0	0.4	—	279.0	
合計	624,588.4	184,848.4	102,614.7	87,008.9	48,156.0	751.1	295.4	203.0	475.6	678.6	777,811.4	13,775.2	48,100.7	27,169.8	12,321.5	39,491.3	16,063.1	17,908.9	—	1,962,092.1	

単位：百万円

様式-3 被害額（整備計画完成(R38河道)：雨量1.10倍）

様式-3

被害額

整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/2

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労働 対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍

水系名：狩野川

河川名：狩野川

流量規模：1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍

水系名：狩野川

河川名：狩野川

流量規模：1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/17

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	47,513.1	15,171.2	8,459.9	2,796.2	1,205.9	59.6	24.7	4.4	37.2	41.6	55,821.2	426.5	2,003.0	1,838.4	864.9	2,703.3	873.4	1,472.2	—	138,571.8
⑦	1,730.4	522.6	251.9	74.0	37.6	13.1	5.1	3.4	3.2	6.6	1,954.9	173.9	29.0	71.9	32.0	103.9	31.2	48.2	—	4,982.4
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	2,424.9	312.1	191.7	306.3	151.0	1.0	0.5	4.4	—	4.4	2,513.5	293.2	196.7	63.9	34.9	98.8	27.8	31.4	—	6,553.3
⑪	12,334.8	3,844.0	2,440.3	868.3	468.7	8.5	3.8	—	—	—	14,816.5	—	532.5	442.3	237.6	679.9	113.6	391.5	—	36,502.4
⑫	4,176.9	565.4	351.4	1,114.3	734.1	1.9	0.8	—	—	—	5,152.9	—	507.7	102.7	51.9	154.6	57.0	57.1	—	12,874.1
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	27,107.0	8,896.9	5,712.2	1,805.2	888.2	58.7	29.3	41.3	99.6	140.9	33,017.1	3,940.9	1,137.1	1,254.1	679.0	1,933.1	317.1	910.1	—	85,893.8
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	5,800.6	1,319.1	757.7	464.5	341.8	17.4	7.1	5.3	31.3	36.6	6,461.4	402.7	256.6	160.4	78.3	238.7	112.3	129.4	—	16,345.9
⑰-2	5,058.6	1,498.3	903.5	2,526.4	2,089.0	5.0	2.1	6.5	—	6.5	8,965.6	289.3	1,090.5	166.6	85.1	251.7	149.1	149.6	—	22,985.2
⑰-3	1,304.2	384.9	249.6	78.7	40.1	0.1	0.1	0.1	—	0.1	1,526.7	4.1	33.2	49.7	28.7	78.4	15.8	39.5	—	3,755.5
合計	107,450.5	32,514.5	19,318.2	10,033.9	5,956.4	165.3	73.5	65.4	171.3	236.7	130,229.8	5,530.6	5,786.3	4,150.0	2,092.4	6,242.4	1,697.3	3,229.0	—	328,464.4

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	62,690.8	19,102.1	8,726.0	3,290.4	1,427.6	90.3	30.5	4.4	43.8	48.2	70,755.3	430.6	2,978.2	2,840.2	1,194.1	4,034.3	1,489.7	1,733.7	—	176,827.7
⑦	2,219.2	618.8	297.8	117.2	50.4	18.3	6.6	3.5	3.5	7.0	2,469.6	182.0	45.4	96.0	40.3	136.3	46.5	57.1	—	6,272.2
⑧	490.0	77.7	31.7	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	471.5	24.4	11.5	14.0	5.5	19.5	7.4	6.8	—	1,177.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	4,087.3	635.6	412.6	573.4	280.6	3.1	1.5	6.2	—	6.2	4,447.6	317.6	283.8	83.6	48.5	132.1	50.4	65.3	—	11,297.1
⑪	14,860.9	4,669.7	2,853.9	1,085.6	584.1	11.5	4.8	—	—	—	17,860.3	—	648.3	559.0	286.1	845.1	158.4	468.7	—	44,051.3
⑫	4,977.2	706.0	439.0	1,313.3	866.7	2.1	0.8	—	—	—	6,162.4	—	611.2	129.3	64.8	194.1	68.7	71.3	—	15,412.8
⑬	9,700.4	2,603.8	1,734.1	4,182.4	3,106.0	12.7	6.0	21.0	11.2	32.2	15,838.4	1,145.8	1,389.3	292.4	160.7	453.1	294.2	270.3	—	40,768.7
⑭	10,180.0	2,296.4	1,416.5	932.0	486.1	7.6	4.6	8.4	16.5	24.9	11,369.8	743.2	842.6	646.8	336.5	983.3	151.8	231.3	—	29,670.1
⑮	34,856.1	11,506.8	7,532.6	2,496.4	1,292.4	79.2	39.6	57.3	129.7	187.0	42,889.8	5,153.3	1,499.2	1,566.6	848.2	2,414.8	417.5	1,186.2	—	111,550.9
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	8,906.6	1,984.5	1,033.6	624.9	467.6	25.5	8.9	5.5	32.6	38.1	9,684.3	423.1	418.3	271.0	124.1	395.1	197.7	188.0	—	24,396.2
⑰-2	8,739.6	2,288.1	1,108.7	4,105.5	3,485.8	9.1	3.0	6.7	—	6.7	14,647.0	293.4	2,151.4	319.7	139.5	459.2	360.4	211.6	—	37,869.5
⑰-3	3,275.5	1,009.0	600.2	189.9	108.9	0.9	0.5	0.9	—	0.9	3,847.2	60.9	76.0	113.6	57.4	171.0	50.6	100.3	—	9,491.8
合計	164,983.6	47,498.5	26,186.7	18,927.8	12,173.7	261.6	107.2	114.4	237.3	351.7	200,443.2	8,774.3	10,955.2	6,932.2	3,305.7	10,237.9	3,293.3	4,590.6	—	508,785.3

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/60

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	67,628.2	20,016.3	8,748.6	3,397.9	1,474.0	99.1	32.2	4.4	44.0	48.4	75,235.9	430.6	3,300.4	3,190.9	1,305.7	4,496.6	1,718.4	1,792.1	—	188,418.7
⑦	2,530.5	672.1	309.8	138.8	56.7	19.7	7.1	3.6	3.8	7.4	2,771.1	186.1	52.1	105.1	44.0	149.1	55.4	61.2	—	7,017.1
⑧	490.0	78.1	34.0	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	473.4	24.4	11.5	14.1	5.6	19.7	7.4	7.0	—	1,182.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	4,664.6	751.6	516.1	644.7	325.6	3.9	1.8	7.1	—	7.1	5,126.0	342.1	315.6	92.1	53.7	145.8	56.1	79.0	—	12,980.0
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	37,424.3	12,385.0	8,100.7	2,754.5	1,436.2	87.1	43.5	59.8	138.9	198.7	46,175.6	5,320.5	1,621.4	1,673.5	901.0	2,574.5	460.3	1,276.3	—	119,858.6
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	9,667.8	2,189.5	1,134.2	659.8	496.8	28.2	9.4	5.5	33.6	39.1	10,525.8	431.2	459.6	310.2	139.7	449.9	220.0	207.1	—	26,518.4
⑰-2	9,999.9	2,533.8	1,152.6	4,647.2	3,845.6	10.3	3.3	6.7	—	6.7	16,467.0	293.4	2,459.3	376.1	159.8	535.9	425.6	229.7	—	42,610.3
⑰-3	3,718.1	1,151.9	640.6	209.9	120.4	1.3	0.7	1.0	—	1.0	4,335.4	60.9	97.3	144.5	68.0	212.5	77.2	111.7	—	10,738.9
合計	136,123.4	39,778.3	20,636.6	12,469.6	7,772.8	250.9	98.4	88.6	220.3	308.9	161,110.2	7,089.2	8,317.2	5,906.5	2,677.5	8,584.0	3,020.4	3,764.1	—	409,324.0

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/70

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体による 応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑥	72,025.3	20,743.8	8,762.0	3,475.4	1,510.8	107.5	33.7	4.4	44.0	48.4	79,140.6	430.6	3,656.6	3,490.4	1,398.5	4,888.9	1,920.6	1,838.2	—	198,582.4
⑦	2,702.5	687.2	320.6	173.8	64.3	20.3	7.2	3.6	4.2	7.8	2,950.2	190.1	59.0	109.3	45.4	154.7	57.9	62.8	—	7,458.4
⑧	498.6	82.9	35.6	17.6	17.9	1.3	0.4	0.5	—	0.5	485.5	24.4	11.8	14.3	5.7	20.0	7.6	7.4	—	1,211.5
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	5,050.8	818.8	551.3	684.7	349.7	4.4	2.0	7.2	—	7.2	5,536.6	342.1	329.6	96.4	56.6	153.0	58.2	85.4	—	13,973.8
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	39,408.7	13,093.4	8,518.7	2,970.0	1,557.7	95.2	47.9	62.0	142.8	204.8	48,743.2	5,438.8	1,700.6	1,731.9	935.2	2,667.1	489.3	1,346.4	—	126,281.8
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	10,280.1	2,337.5	1,213.3	696.0	517.8	29.8	9.9	5.5	33.7	39.2	11,192.6	431.2	489.3	334.5	150.4	484.9	241.6	221.2	—	28,184.4
⑰-2	10,461.2	2,617.4	1,205.6	4,775.4	3,967.6	10.5	3.4	6.7	—	6.7	17,096.5	293.4	2,579.6	397.2	167.4	564.6	450.2	238.2	—	44,270.3
⑰-3	3,985.9	1,256.6	648.6	217.7	126.1	1.7	0.9	1.1	—	1.1	4,628.2	65.0	105.3	158.2	73.2	231.4	84.3	118.7	—	11,471.5
合計	144,413.1	41,637.6	21,255.7	13,010.6	8,111.9	270.7	105.4	91.0	224.7	315.7	169,773.4	7,215.6	8,931.8	6,332.2	2,832.4	9,164.6	3,309.7	3,918.3	—	431,434.1

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	64,323.4	19,372.7	16,978.0	9,811.4	3,328.7	17.4	10.3	—	7.5	7.5	84,470.7	65.0	3,688.0	2,101.0	1,359.0	3,460.0	849.6	2,264.6	—	208,647.3
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	1,721.9	782.9	502.7	166.9	124.4	8.8	5.1	24.1	64.5	88.6	2,457.9	1,638.3	89.0	106.3	57.4	163.7	21.1	80.1	—	7,851.4
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	76,245.6	21,271.1	8,778.7	3,546.5	1,537.4	115.2	35.4	4.4	44.2	48.6	82,755.2	430.6	3,920.1	3,762.7	1,480.4	5,243.1	2,087.2	1,872.1	—	207,886.8
⑦	2,901.6	716.3	328.1	177.1	67.0	22.4	7.5	3.8	4.2	8.0	3,131.2	194.1	63.6	116.5	47.8	164.3	66.1	65.1	—	7,912.4
⑧	514.9	87.2	35.6	18.2	18.6	1.4	0.5	0.5	—	0.5	501.8	24.4	11.9	15.0	6.0	21.0	7.6	7.6	—	1,251.2
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	5,414.8	904.6	630.6	729.1	374.9	4.9	2.2	7.3	—	7.3	5,981.4	346.1	341.4	100.0	59.7	159.7	60.4	95.6	—	15,053.0
⑪-1	34,508.0	10,404.4	6,446.1	6,943.2	4,297.1	3.9	1.8	—	—	—	46,452.5	—	2,634.1	1,132.6	584.2	1,716.8	715.1	1,049.8	—	115,172.8
⑪-2	12,827.6	4,479.7	4,648.7	1,457.1	501.1	2.0	0.9	—	—	—	17,746.5	—	2,319.4	887.9	435.7	1,323.6	564.7	568.7	—	46,440.0
⑪-3	1,771.7	634.8	464.4	110.7	27.5	1.8	1.0	—	—	—	2,234.8	—	81.0	65.4	39.9	105.3	10.7	68.5	—	5,512.2
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	41,343.9	13,854.3	8,888.6	3,206.2	1,703.6	102.1	51.3	63.9	145.9	209.8	51,309.2	5,541.1	1,781.6	1,795.5	971.8	2,767.3	516.0	1,416.9	—	132,691.9
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	11,059.1	2,553.6	1,281.9	736.8	543.4	31.6	10.3	5.6	33.9	39.5	12,032.7	439.4	528.2	367.7	164.4	532.1	266.1	238.9	—	30,293.6
⑰-2	11,618.4	2,825.9	1,249.8	5,340.0	4,288.9	11.3	3.8	6.8	—	6.8	18,800.9	297.5	3,029.0	448.8	185.8	634.6	571.8	253.9	—	48,932.6
⑰-3	4,234.1	1,335.3	667.5	228.3	132.8	1.9	0.9	1.2	—	1.2	4,897.8	69.1	115.2	173.2	78.5	251.7	95.7	124.8	—	12,156.3
合計	268,485.0	79,222.8	50,900.7	32,471.5	16,945.4	324.7	131.0	117.6	300.2	417.8	332,772.6	9,045.6	18,602.5	11,072.6	5,470.6	16,543.2	5,832.1	8,106.6	—	839,801.5

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画完成（R38河道）雨量1.10倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	103,866.3	32,884.5	23,132.7	16,891.3	6,101.6	42.5	21.9	—	11.0	11.0	135,741.9	65.0	5,790.3	3,695.8	2,018.7	5,714.5	1,791.5	3,489.9	—	335,544.9
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③-1	18,971.6	5,936.0	4,053.6	874.3	576.8	13.9	7.0	1.7	9.0	10.7	22,581.5	146.0	497.3	630.9	351.7	982.6	204.1	622.4	—	55,477.8
③-2	10,070.6	3,701.4	2,325.6	797.8	341.2	21.5	10.4	34.4	4.6	39.0	12,813.2	1,647.8	425.5	427.1	223.9	651.0	121.2	375.5	—	33,341.7
③-3	1,106.6	261.6	122.5	111.3	115.2	10.8	4.2	0.8	16.7	17.5	1,285.3	126.1	52.7	36.3	15.8	52.1	13.4	23.9	—	3,303.2
④	4,742.0	1,778.7	1,097.1	477.2	384.2	25.8	13.0	28.7	82.4	111.1	6,320.4	1,775.7	226.0	207.9	110.2	318.1	62.4	179.2	—	17,510.9
⑤	158.5	69.1	64.8	9.2	4.7	0.4	0.3	—	—	—	227.7	—	6.4	8.4	5.5	13.9	1.2	8.3	—	564.5
⑥	83,842.2	21,979.3	8,830.1	3,627.7	1,571.1	125.8	38.4	4.4	44.4	48.8	89,050.9	430.6	4,295.0	4,295.9	1,631.2	5,927.1	2,349.6	1,919.4	—	224,036.0
⑦	3,414.8	796.7	352.7	228.7	81.5	25.9	8.7	4.0	4.3	8.3	3,642.5	206.3	79.3	133.2	53.7	186.9	83.9	71.6	—	9,187.8
⑧	540.1	92.7	39.8	19.6	20.1	1.5	0.5	0.5	—	0.5	530.1	24.4	12.3	15.7	6.3	22.0	7.9	8.3	—	1,319.8
⑨	218.0	187.5	91.1	0.4	—	1.1	0.4	0.7	—	0.7	369.9	28.4	0.4	24.9	11.4	36.3	0.6	17.4	—	952.2
⑩	7,559.3	1,375.3	887.9	1,014.5	516.3	8.2	3.6	7.7	—	7.7	8,433.0	350.2	443.2	152.9	82.2	235.1	98.7	141.0	—	21,074.0
⑪-1	48,081.6	14,210.2	7,857.5	8,580.1	5,270.0	6.5	2.9	—	—	—	62,334.5	—	3,725.9	1,738.3	823.0	2,561.3	1,110.6	1,374.8	—	155,115.9
⑪-2	20,275.2	6,816.3	5,470.1	2,449.7	873.9	4.4	1.7	—	—	—	26,631.3	—	4,584.9	1,758.8	758.8	2,517.6	1,402.6	765.4	—	71,793.1
⑪-3	4,304.4	1,461.8	916.7	292.3	98.3	4.4	2.1	—	—	—	5,253.3	—	208.0	169.1	86.9	256.0	39.2	148.2	—	12,984.7
⑫	332.0	0.7	0.3	185.4	131.8	—	—	—	—	—	482.4	—	65.8	0.5	0.2	0.7	5.8	0.1	—	1,205.0
⑬	22,224.1	7,069.8	4,418.6	9,876.4	6,914.8	34.1	13.8	28.8	12.1	40.9	37,509.2	1,415.5	3,626.7	907.3	463.4	1,370.7	859.2	715.7	—	96,089.5
⑭	20,541.3	6,103.1	4,639.5	2,661.8	1,872.4	34.3	17.6	12.8	60.4	73.2	26,615.5	890.3	1,402.7	718.6	415.4	1,134.0	339.3	669.3	—	66,994.3
⑮	48,279.0	16,278.6	10,536.0	3,964.8	2,172.2	129.7	65.1	73.0	177.4	250.4	60,417.6	5,927.5	2,043.1	1,975.7	1,080.8	3,056.5	607.9	1,670.5	—	155,398.9
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	18,330.2	3,719.1	1,704.1	7,390.2	5,481.6	15.9	5.6	9.7	18.8	28.5	27,191.9	651.3	4,321.4	654.7	274.0	928.7	821.2	337.9	—	70,927.6
⑰-2	4,975.3	1,515.0	703.5	249.5	150.2	2.5	1.1	1.6	—	1.6	5,637.1	77.2	137.8	214.4	91.7	306.1	114.3	138.2	—	14,009.4
⑰-3	47.1	6.1	—	1.9	1.3	—	—	0.5	—	0.5	41.9	36.6	1.8	4.1	1.9	6.0	0.5	0.4	—	144.1
⑰-4	31.4	0.3	0.3	1.3	0.9	—	—	—	—	—	25.4	—	1.2	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	61.4
合計	421,911.6	126,243.8	77,244.5	59,705.4	32,680.1	509.2	218.3	209.3	441.1	650.4	533,136.5	13,798.9	31,947.7	17,770.7	8,506.8	26,277.5	10,035.4	12,677.4	—	1,347,036.7

単位：百万円

様式-3 被害額（整備計画策定時(R8河道)：雨量1.07倍）

様式-3

被害額

整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/2

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/3

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	126.3	0.2	—	29.8	16.9	—	—	—	—	—	128.5	—	29.1	0.2	0.1	0.3	1.7	—	—	332.8
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	126.3	0.2	—	29.8	16.9	—	—	—	—	—	128.5	—	29.1	0.2	0.1	0.3	1.7	—	—	332.8

単位：百万円

様式-3

被害額

整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	855.8	41.0	25.6	221.2	138.1	0.3	0.2	—	—	—	951.4	—	101.0	3.7	2.6	6.3	6.2	4.1	—	2,351.2
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	855.8	41.0	25.6	221.2	138.1	0.3	0.2	—	—	—	951.4	—	101.0	3.7	2.6	6.3	6.2	4.1	—	2,351.2

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	2,419.2	313.3	218.4	317.1	152.3	1.3	0.6	4.7	—	4.7	2,539.2	293.2	190.6	61.2	33.3	94.5	28.0	33.1	—	6,605.5
⑪	6,997.6	2,176.0	1,431.5	470.3	251.2	3.5	1.8	—	—	—	8,408.2	—	300.8	271.3	153.3	424.6	51.5	224.7	—	20,741.7
⑫	2,021.0	82.3	63.9	631.1	388.5	0.7	0.3	—	—	—	2,365.3	—	223.0	13.2	7.1	20.3	23.0	9.1	—	5,828.5
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	11,437.8	2,571.6	1,713.8	1,418.5	792.0	5.5	2.7	4.7	—	4.7	13,312.7	293.2	714.4	345.7	193.7	539.4	102.5	266.9	—	33,175.7

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/17

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③-1	7,121.1	1,589.9	1,117.8	255.2	183.4	3.5	1.8	1.4	5.9	7.3	7,622.3	113.5	171.2	242.0	135.3	377.3	55.0	168.7	—	18,788.0
③-2	6,783.2	2,544.1	1,777.3	526.4	200.7	13.7	7.0	30.7	3.4	34.1	8,794.5	1,587.3	315.1	299.3	167.9	467.2	80.0	269.2	—	23,399.8
③-3	823.5	169.8	85.3	166.7	169.1	1.5	0.8	5.4	7.0	12.4	1,051.3	290.1	63.9	21.9	10.1	32.0	29.3	15.9	—	2,911.6
③-4	533.7	123.1	77.4	52.3	49.6	3.0	1.6	0.6	16.5	17.1	623.9	117.9	20.7	14.0	7.7	21.7	4.1	12.5	—	1,658.6
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	4,324.4	696.6	448.1	591.7	289.4	3.6	1.7	6.9	—	6.9	4,715.7	342.1	288.2	86.9	50.9	137.8	51.2	71.3	—	11,968.7
⑪	10,538.4	3,327.6	2,193.1	751.1	398.7	6.8	3.1	—	—	—	12,776.4	—	447.0	384.7	212.3	597.0	88.1	343.9	—	31,471.2
⑫	3,818.5	505.0	324.4	1,021.5	674.4	1.7	0.7	—	1.6	1.6	4,709.0	16.3	462.9	90.8	45.3	136.1	52.5	51.7	—	11,776.3
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	33,942.8	8,956.1	6,023.4	3,364.9	1,965.3	33.8	16.7	45.0	34.4	79.4	40,293.1	2,467.2	1,769.0	1,139.6	629.5	1,769.1	360.2	933.2	—	101,974.2

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	80,575.9	26,015.7	20,948.1	12,658.1	4,274.2	29.8	16.9	—	9.3	9.3	107,232.7	65.0	4,454.3	2,775.6	1,691.2	4,466.8	1,252.7	2,925.9	—	264,925.4
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③-1	17,755.2	5,453.4	3,711.1	802.1	531.8	12.3	6.3	1.6	8.5	10.1	20,978.0	137.9	457.2	575.6	327.3	902.9	181.6	570.9	—	51,510.8
③-2	10,816.8	4,000.8	2,460.1	860.4	381.5	23.5	10.8	35.1	4.8	39.9	13,767.0	1,663.8	444.5	460.0	236.5	696.5	128.6	402.5	—	35,696.7
③-3	788.0	204.5	118.4	90.7	90.8	6.8	3.0	0.8	16.7	17.5	966.2	126.1	30.3	23.9	11.5	35.4	6.4	20.1	—	2,504.2
④	2,438.9	1,056.2	662.6	278.4	229.9	12.4	7.0	26.2	72.3	98.5	3,476.5	1,682.7	130.4	139.2	73.5	212.7	31.1	107.1	—	10,424.4
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	42,138.2	13,678.0	8,223.8	2,589.9	1,098.8	51.2	23.0	4.3	32.9	37.2	50,309.8	422.4	1,715.4	1,543.8	768.1	2,311.9	696.9	1,364.5	—	124,661.0
⑦	1,417.1	462.6	234.6	56.0	29.9	10.8	4.2	3.2	3.2	6.4	1,643.7	165.8	23.6	62.3	28.5	90.8	24.4	43.4	—	4,213.3
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	5,903.0	1,017.1	754.8	813.5	413.0	5.7	2.6	7.4	—	7.4	6,611.1	346.1	368.8	113.7	65.5	179.2	71.7	110.4	—	16,604.4
⑪-1	42,727.2	12,684.6	7,347.0	8,060.1	4,958.9	5.9	2.7	—	—	—	56,233.5	—	3,134.8	1,440.5	711.4	2,151.9	865.9	1,248.0	—	139,420.5
⑪-2	15,700.4	5,292.3	4,942.5	1,848.8	655.8	3.3	1.3	—	—	—	21,105.8	—	3,351.0	1,228.0	557.3	1,785.3	902.5	637.6	—	56,226.6
⑪-3	14,145.4	4,327.1	2,679.8	1,014.3	552.7	10.3	4.4	—	—	—	16,868.6	—	610.7	510.7	265.8	776.5	140.1	436.5	—	41,566.4
⑫	4,927.8	712.2	466.5	1,301.7	860.8	2.1	0.8	—	3.7	3.7	6,137.7	32.5	606.5	129.4	64.9	194.3	67.7	73.4	—	15,387.7
⑬	18,822.8	5,773.4	3,626.9	8,358.8	5,966.8	27.6	11.6	27.4	12.1	39.5	31,600.1	1,371.2	3,022.1	733.4	378.2	1,111.6	684.1	585.6	—	81,002.1
⑭	18,748.9	5,555.7	4,270.9	2,427.5	1,721.0	30.4	15.7	12.7	59.8	72.5	24,315.3	890.3	1,272.6	652.3	381.8	1,034.1	299.7	612.2	—	61,266.8
⑮	23,161.8	7,668.1	5,008.6	1,536.7	731.6	48.8	25.0	33.2	82.4	115.6	28,329.9	3,233.7	953.5	1,102.4	602.0	1,704.4	274.6	789.8	—	73,582.1
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	4,972.9	1,140.3	660.3	412.7	298.2	15.1	6.5	5.2	30.6	35.8	5,569.5	402.7	215.2	134.4	67.4	201.8	88.6	112.2	—	14,131.8
⑰-2	3,722.1	1,156.9	785.3	1,861.5	1,488.7	3.4	1.8	5.9	—	5.9	6,692.7	281.2	774.9	118.8	67.7	186.5	90.9	121.0	—	17,172.8
⑰-3	876.7	226.2	135.5	49.4	25.1	—	—	0.1	—	0.1	974.2	4.1	25.1	41.5	22.3	63.8	10.2	22.5	—	2,412.9
合計	309,639.1	96,425.1	67,036.8	45,020.6	24,309.5	299.4	143.6	163.1	336.3	499.4	402,812.3	10,825.5	21,590.9	11,785.5	6,320.9	18,106.4	5,817.7	10,183.6	—	1,012,709.9

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	110,612.9	34,820.2	23,675.4	17,237.3	6,398.3	47.6	23.6	—	11.7	11.7	143,068.8	65.0	5,991.4	3,993.3	2,124.8	6,118.1	1,869.0	3,644.3	—	353,583.6
②	360.5	76.7	33.8	20.9	8.5	0.1	0.1	—	—	—	371.5	—	23.4	21.3	11.0	32.3	2.2	6.9	—	936.9
③-1	341.3	81.4	41.8	8.1	5.7	0.1	0.1	—	—	—	355.0	—	7.3	14.7	8.0	22.7	2.5	7.7	—	873.7
③-2	83.4	21.6	13.6	1.2	0.5	—	—	—	—	—	89.3	—	1.2	5.0	2.7	7.7	0.2	2.2	—	220.9
③-3	27,132.4	8,443.0	4,893.7	1,251.5	874.5	22.7	10.1	1.7	11.9	13.6	31,629.8	158.2	743.3	961.3	484.1	1,445.4	331.9	830.9	—	77,781.0
③-4	14,369.2	5,272.5	3,102.5	1,204.9	573.2	34.6	14.6	37.3	5.3	42.6	18,232.1	1,708.1	585.5	602.0	301.0	903.0	184.5	521.8	—	46,749.1
③-5	1,201.6	276.0	127.2	114.8	121.0	11.9	4.4	0.8	16.7	17.5	1,377.8	126.1	54.2	39.1	16.8	55.9	14.0	25.1	—	3,527.5
④	4,205.0	1,646.6	985.0	445.4	368.1	23.7	12.2	28.6	81.6	110.2	5,703.1	1,767.6	211.7	198.2	103.9	302.1	56.5	164.0	—	16,001.2
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	58,073.9	17,886.0	8,685.1	3,180.6	1,379.4	80.9	28.4	4.4	41.7	46.1	66,271.2	426.5	2,657.4	2,478.6	1,076.6	3,555.2	1,280.8	1,655.4	—	165,206.9
⑦	2,091.2	589.6	287.7	109.1	48.6	16.5	5.8	3.5	3.5	7.0	2,336.1	182.0	38.1	88.0	37.7	125.7	40.6	54.7	—	5,932.7
⑧	447.5	70.8	31.7	15.9	16.6	1.3	0.4	0.4	—	0.4	433.4	20.3	9.9	11.8	4.8	16.6	6.2	6.4	—	1,077.4
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	7,715.1	1,413.1	924.2	1,034.7	526.4	7.9	3.6	7.7	—	7.7	8,625.7	350.2	455.7	154.4	84.2	238.6	105.0	145.6	—	21,553.5
⑪-1	57,694.7	16,886.3	8,494.0	9,500.8	5,840.5	9.5	3.7	—	—	—	73,034.8	—	5,134.5	2,337.9	1,045.2	3,383.1	1,743.8	1,581.2	—	183,306.9
⑪-2	21,192.9	7,063.8	5,620.8	2,632.1	934.5	4.7	1.8	—	—	—	27,788.3	—	4,785.4	1,843.1	790.5	2,633.6	1,470.3	790.3	—	74,918.5
⑪-3	16,760.5	5,154.3	3,058.3	1,224.0	667.9	13.4	5.5	—	—	—	19,947.8	—	745.4	626.9	313.6	940.5	193.2	511.6	—	49,222.4
⑫	5,660.2	959.3	580.2	1,463.2	958.7	2.5	1.0	—	6.4	6.4	7,141.7	40.6	699.5	161.2	81.2	242.4	81.9	95.9	—	17,933.5
⑬	27,157.6	9,069.4	5,642.3	11,936.8	7,998.7	41.5	16.6	30.0	12.1	42.1	45,902.2	1,451.7	4,406.1	1,160.6	584.8	1,745.4	1,124.1	916.5	—	117,451.0
⑭	28,196.3	8,707.4	6,040.9	3,642.6	2,520.8	54.0	25.8	13.5	60.6	74.1	36,497.3	931.1	1,975.2	1,081.4	582.0	1,663.4	536.0	918.8	—	91,783.7
⑮	32,677.5	10,730.7	7,192.1	2,260.9	1,149.9	72.0	35.9	54.5	124.1	178.6	40,156.3	4,989.5	1,407.2	1,500.0	810.7	2,310.7	384.2	1,116.6	—	104,662.1
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	7,698.7	1,711.5	904.4	567.3	422.3	22.5	8.2	5.5	32.5	38.0	8,410.6	423.1	365.0	230.8	106.7	337.5	171.4	163.0	—	21,243.5
⑰-2	7,608.2	2,089.1	1,056.6	3,659.7	3,126.4	7.2	2.6	6.6	—	6.6	13,022.0	293.4	1,820.9	273.7	123.6	397.3	289.8	196.0	—	33,575.8
⑰-3	3,026.5	925.4	563.5	179.7	102.2	0.7	0.4	0.8	—	0.8	3,560.4	52.8	71.7	104.6	53.3	157.9	48.4	92.8	—	8,783.2
⑰-4	31.4	0.3	—	1.3	0.9	—	—	—	—	—	25.1	—	1.2	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	60.8
合計	434,338.5	133,895.0	81,954.8	61,692.8	34,043.6	475.3	204.8	195.3	408.1	603.4	553,980.3	12,986.2	32,191.2	17,888.1	8,747.3	26,635.4	9,936.8	13,447.7	—	1,396,385.8

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体による 応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	122,824.7	37,894.3	24,408.9	18,537.9	7,086.7	53.0	25.0	—	12.2	12.2	156,436.1	65.0	6,522.1	4,459.1	2,294.6	6,753.7	2,024.0	3,881.5	—	386,525.1
②	574.2	157.0	105.4	38.2	14.9	0.5	0.3	—	—	—	660.8	—	33.3	26.0	14.9	40.9	4.2	16.3	—	1,646.0
③-1	581.8	138.6	104.8	13.8	10.1	0.3	0.2	—	—	—	630.2	—	10.5	18.1	10.9	29.0	3.0	15.2	—	1,537.5
③-2	30,694.8	9,432.0	5,330.5	1,387.4	995.4	26.7	11.1	1.8	12.2	14.0	35,525.4	162.2	853.0	1,111.1	539.6	1,650.7	387.7	919.7	—	87,390.6
③-3	16,080.1	5,807.0	3,292.8	1,285.4	623.4	39.0	15.7	37.5	5.3	42.8	20,140.4	1,708.1	682.3	703.9	336.8	1,040.7	234.1	566.9	—	51,558.7
③-4	1,248.8	287.0	132.3	115.0	121.2	13.0	4.6	0.9	16.7	17.6	1,426.1	130.2	54.4	42.6	17.9	60.5	14.3	26.1	—	3,651.1
④	5,120.9	1,881.4	1,129.5	527.7	429.9	28.7	14.0	29.0	83.5	112.5	6,776.0	1,771.7	257.4	221.0	115.9	336.9	68.4	187.6	—	18,642.6
⑤	32.0	7.8	—	1.3	0.5	—	—	—	—	—	30.9	—	2.2	5.3	2.4	7.7	0.7	0.5	—	83.6
⑥	62,688.7	19,100.8	8,726.0	3,290.3	1,427.6	90.3	30.5	4.4	43.6	48.0	70,752.8	430.6	2,978.2	2,840.0	1,194.1	4,034.1	1,489.7	1,733.6	—	176,821.2
⑦	2,219.2	618.8	298.0	117.2	50.4	18.3	6.6	3.5	3.5	7.0	2,469.8	182.0	45.4	96.0	40.3	136.3	46.5	57.1	—	6,272.6
⑧	490.0	77.7	31.7	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	471.5	24.4	11.5	14.0	5.5	19.5	7.4	6.8	—	1,177.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	8,420.7	1,527.8	955.8	1,112.5	574.8	9.0	3.8	7.8	—	7.8	9,352.5	350.2	483.5	171.3	89.2	260.5	115.7	154.7	—	23,329.3
⑪-1	61,197.8	17,894.1	8,820.1	9,860.7	6,002.0	10.1	3.9	—	—	—	77,011.2	—	5,572.6	2,550.5	1,126.5	3,677.0	1,943.2	1,664.3	—	193,657.0
⑪-2	22,371.5	7,522.4	5,994.9	2,692.6	973.3	5.1	2.0	—	—	—	29,354.8	—	5,045.7	1,935.5	831.7	2,767.2	1,555.4	842.1	—	79,127.0
⑪-3	7,486.3	2,452.9	1,381.6	523.0	238.7	7.0	2.8	—	—	—	8,972.5	—	362.1	300.5	147.6	448.1	78.3	238.9	—	22,192.2
⑫	1,233.4	27.7	16.8	580.0	451.4	—	—	—	1.6	1.6	1,713.5	16.3	226.1	7.0	3.6	10.6	17.8	2.8	—	4,298.0
⑬	32,950.4	11,654.6	7,103.0	14,101.8	9,219.9	49.6	19.4	31.1	12.1	43.2	55,723.1	1,479.9	5,369.0	1,472.8	738.1	2,210.9	1,451.1	1,168.6	—	142,544.5
⑭	32,798.1	10,028.3	6,743.5	4,215.0	2,890.4	62.0	28.1	13.5	60.9	74.4	42,120.0	931.1	2,314.7	1,270.1	668.7	1,938.8	648.0	1,044.9	—	105,837.3
⑮	35,567.3	11,744.6	7,693.3	2,564.1	1,336.2	80.6	40.4	58.2	133.3	191.5	43,797.6	5,210.6	1,529.6	1,597.5	866.0	2,463.5	425.2	1,211.0	—	113,855.5
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	8,906.6	1,984.5	1,033.6	624.9	467.6	25.5	8.9	5.5	32.6	38.1	9,684.3	423.1	418.3	271.0	124.1	395.1	197.7	188.0	—	24,396.2
⑰-2	8,726.1	2,283.5	1,108.7	4,102.0	3,482.3	9.0	3.0	6.7	—	6.7	14,628.2	293.4	2,143.4	318.3	139.0	457.3	358.9	211.3	—	37,813.8
⑰-3	3,562.6	1,093.2	612.6	202.6	116.1	1.1	0.6	1.0	—	1.0	4,146.9	60.9	89.4	133.6	64.1	197.7	67.3	106.3	—	10,258.3
⑰-4	31.4	0.3	—	1.3	0.9	—	—	—	—	—	25.1	—	1.2	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	60.8
合計	465,807.4	143,616.3	85,023.8	65,911.5	36,531.2	530.1	221.3	201.4	417.5	618.9	591,849.7	13,239.7	35,005.9	19,565.4	9,371.6	28,937.0	11,138.9	14,244.2	—	1,492,675.9

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画策定時（R8河道）雨量1.07倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/70

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	132,604.6	40,419.2	25,597.0	20,220.6	7,650.6	57.1	25.9	—	12.2	12.2	168,118.8	65.0	7,000.9	4,790.5	2,419.9	7,210.4	2,158.4	4,112.8	—	415,253.5
②	941.0	290.4	238.1	58.5	23.5	0.7	0.4	—	—	—	1,152.1	—	51.5	35.7	23.0	58.7	6.5	32.9	—	2,854.3
③-1	847.8	205.4	166.5	21.3	16.0	0.5	0.3	—	—	—	933.2	—	14.9	23.6	14.3	37.9	4.8	23.2	—	2,271.8
③-2	33,887.8	10,462.9	5,666.6	1,515.1	1,092.7	29.6	12.1	1.8	13.9	15.7	39,078.8	162.2	967.2	1,263.5	598.3	1,861.8	459.4	1,004.9	—	96,216.8
③-3	17,709.4	6,278.8	3,377.0	1,441.4	702.9	44.0	17.5	38.0	5.3	43.3	21,941.6	1,716.1	779.1	782.5	364.4	1,146.9	281.5	601.6	—	56,081.1
③-4	1,288.2	301.2	134.4	120.1	126.6	14.1	5.1	0.9	16.7	17.6	1,476.4	130.2	58.0	45.4	18.9	64.3	15.3	27.1	—	3,778.6
④	5,890.1	2,080.6	1,269.9	600.0	483.8	32.5	15.3	29.3	84.3	113.6	7,696.2	1,791.9	291.1	252.1	128.7	380.8	82.5	208.7	—	20,937.0
⑤	185.6	85.4	75.1	13.3	8.0	0.8	0.5	—	—	—	273.5	—	7.7	10.6	6.5	17.1	1.9	10.0	—	678.9
⑥	66,967.7	19,906.9	8,741.9	3,393.3	1,471.3	97.5	31.9	4.4	44.0	48.4	74,652.8	430.6	3,254.2	3,131.9	1,288.0	4,419.9	1,679.6	1,784.8	—	186,880.8
⑦	2,506.0	670.5	307.0	137.7	56.2	19.7	7.1	3.6	3.8	7.4	2,748.5	186.1	52.0	105.1	43.9	149.0	55.4	60.9	—	6,963.5
⑧	490.0	78.1	34.0	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	473.4	24.4	11.5	14.1	5.6	19.7	7.4	7.0	—	1,182.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	8,732.3	1,594.3	991.3	1,153.1	592.3	9.7	3.9	7.9	—	7.9	9,703.1	358.3	502.3	181.2	92.9	274.1	122.9	161.1	—	24,206.6
⑪-1	63,010.4	18,424.9	9,006.4	10,069.8	6,092.7	10.5	4.1	—	—	—	79,111.2	—	5,753.8	2,641.2	1,163.3	3,804.5	2,028.0	1,709.0	—	199,025.3
⑪-2	23,693.5	7,922.0	6,203.8	2,936.2	1,039.0	6.1	2.4	—	—	—	31,017.8	—	5,644.3	2,169.0	908.8	3,077.8	1,792.9	880.0	—	84,215.8
⑪-3	8,303.1	2,715.1	1,536.5	583.2	272.6	7.6	3.1	—	—	—	9,958.6	—	404.3	339.3	163.5	502.8	91.3	264.9	—	24,643.1
⑫	1,559.1	54.7	47.2	721.9	571.0	0.1	—	—	2.4	2.4	2,191.7	24.4	274.8	10.6	5.7	16.3	22.3	6.3	—	5,492.2
⑬	36,009.0	12,736.0	7,740.9	15,225.4	9,948.8	54.5	20.9	31.5	12.1	43.6	60,647.6	1,496.0	5,950.4	1,650.2	809.2	2,459.4	1,630.9	1,275.7	—	155,239.1
⑭	35,623.5	10,835.0	7,216.7	4,512.7	3,113.5	66.9	29.3	13.6	60.9	74.5	45,557.0	935.2	2,499.1	1,407.9	724.9	2,132.8	699.7	1,124.6	—	114,420.5
⑮	37,594.8	12,458.6	8,174.1	2,779.2	1,454.3	88.1	44.1	60.1	139.9	200.0	46,444.1	5,332.7	1,626.4	1,685.8	907.8	2,593.6	462.1	1,285.4	—	120,537.5
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	9,536.5	2,162.2	1,106.5	654.2	491.6	27.4	9.3	5.5	33.6	39.1	10,378.8	431.2	452.4	305.4	137.9	443.3	216.5	203.6	—	26,152.6
⑰-2	9,840.6	2,499.8	1,147.3	4,543.2	3,801.9	10.1	3.3	6.7	—	6.7	16,210.0	293.4	2,429.9	368.5	157.4	525.9	417.5	227.2	—	41,956.8
⑰-3	3,832.3	1,188.5	642.9	213.0	122.8	1.4	0.8	1.1	—	1.1	4,453.3	65.0	102.5	151.7	70.2	221.9	82.7	114.1	—	11,042.3
⑰-4	31.4	0.3	0.3	1.3	0.9	—	—	—	—	—	25.4	—	1.2	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	61.4
合計	501,084.7	153,370.8	89,421.4	70,931.3	39,150.5	580.2	237.7	204.9	429.1	634.0	634,243.9	13,442.7	38,129.5	21,366.0	10,053.2	31,419.2	12,319.8	15,125.8	—	1,600,091.5

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	139,644.0	42,477.9	26,526.9	21,271.4	8,077.2	61.4	27.4	—	12.2	12.2	176,660.1	65.0	7,328.2	5,039.7	2,522.3	7,562.0	2,263.8	4,299.0	—	436,276.5
②	1,266.1	399.7	335.6	79.6	33.0	0.9	0.6	—	—	—	1,569.6	—	61.2	51.4	31.3	82.7	8.7	45.8	—	3,883.5
③-1	1,110.8	279.5	212.1	30.3	20.9	0.6	0.3	—	—	—	1,227.7	—	20.4	34.3	19.7	54.0	8.5	30.6	—	2,995.7
③-2	35,743.1	11,073.6	5,936.5	1,591.6	1,141.9	32.1	13.0	1.8	14.5	16.3	41,204.6	162.2	1,043.7	1,367.9	639.6	2,007.5	508.7	1,059.7	—	101,534.5
③-3	18,388.1	6,548.5	3,434.0	1,527.7	747.3	47.0	18.9	38.1	5.3	43.4	22,787.9	1,716.1	824.4	827.2	381.5	1,208.7	302.9	621.9	—	58,216.8
③-4	1,357.9	309.2	137.2	121.0	127.9	15.2	5.3	0.9	16.7	17.6	1,538.8	130.2	64.5	49.8	20.3	70.1	17.8	27.8	—	3,940.5
④	6,605.9	2,261.6	1,367.6	660.7	533.6	35.5	16.4	29.5	84.5	114.0	8,519.0	1,795.9	322.3	277.2	140.4	417.6	95.0	226.1	—	22,971.2
⑤	421.3	205.8	137.4	38.1	22.0	2.3	1.1	—	—	—	614.3	—	17.6	23.0	12.5	35.5	7.2	21.4	—	1,524.0
⑥	70,102.8	20,467.3	8,752.4	3,440.1	1,495.9	104.4	33.1	4.4	44.0	48.4	77,461.7	430.6	3,493.9	3,368.9	1,361.0	4,729.9	1,833.6	1,820.4	—	194,214.5
⑦	2,640.9	685.4	311.8	161.5	61.8	20.3	7.2	3.6	4.2	7.8	2,885.6	190.1	57.2	109.1	45.3	154.4	57.6	62.1	—	7,303.7
⑧	490.0	80.5	34.2	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	475.4	24.4	11.5	14.1	5.6	19.7	7.4	7.2	—	1,186.8
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	9,097.4	1,663.9	1,006.4	1,213.2	620.8	9.9	4.0	7.9	—	7.9	10,102.8	358.3	522.1	187.9	95.6	283.5	130.9	166.4	—	25,187.5
⑪-1	64,781.5	18,985.7	9,221.5	10,264.4	6,187.3	11.2	4.4	—	—	—	81,216.4	—	5,897.2	2,728.7	1,200.0	3,928.7	2,084.9	1,757.3	—	204,340.5
⑪-2	24,739.8	8,176.1	6,388.3	3,000.0	1,089.5	6.5	2.5	—	—	—	32,204.8	—	5,941.3	2,254.6	941.5	3,196.1	1,896.0	907.4	—	87,548.3
⑪-3	9,141.9	2,978.4	1,631.3	647.3	312.0	8.9	3.5	—	—	—	10,924.6	—	444.8	380.9	180.1	561.0	103.2	287.2	—	27,044.1
⑫	1,984.1	103.7	58.6	896.4	720.9	0.1	0.1	—	3.2	3.2	2,792.7	28.4	348.8	13.1	7.8	20.9	32.2	10.1	—	7,000.2
⑬	34,334.8	12,137.6	7,409.9	14,498.2	9,540.0	51.8	20.2	31.2	12.1	43.3	57,870.4	1,488.0	5,587.0	1,545.6	766.5	2,312.1	1,508.4	1,217.8	—	148,019.5
⑭	39,079.9	11,893.2	7,669.3	4,868.5	3,366.9	72.3	30.8	13.7	60.9	74.6	49,699.9	935.2	2,744.0	1,540.1	785.5	2,325.6	782.1	1,218.7	—	124,761.0
⑮	39,277.7	13,158.3	8,509.0	2,974.3	1,566.9	94.8	47.6	62.3	143.1	205.4	48,696.3	5,455.3	1,701.8	1,741.8	939.9	2,681.7	491.7	1,349.9	—	126,210.7
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	10,050.1	2,292.7	1,183.7	686.2	511.1	29.5	9.8	5.5	33.7	39.2	10,954.1	431.2	478.7	326.9	147.5	474.4	231.9	216.6	—	27,589.2
⑰-2	10,281.9	2,577.2	1,194.4	4,735.9	3,918.7	10.3	3.3	6.7	—	6.7	16,859.6	293.4	2,533.4	388.2	164.2	552.4	441.0	235.0	—	43,643.2
⑰-3	4,098.5	1,300.3	658.0	220.9	128.2	1.8	0.9	1.2	—	1.2	4,755.2	65.0	110.0	166.0	76.3	242.3	89.5	122.0	—	11,793.8
⑰-4	73.4	0.3	0.3	3.6	2.8	—	—	—	—	—	59.6	—	1.5	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	142.1
合計	524,711.9	160,056.4	92,116.4	72,947.7	40,244.1	618.1	250.8	207.3	434.4	641.7	661,081.1	13,569.3	39,555.5	22,436.6	10,484.5	32,921.1	12,903.3	15,710.4	—	1,667,327.8

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労働 対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	153,764.2	46,363.6	28,208.8	23,585.2	8,952.4	69.1	30.0	0.2	12.2	12.4	193,642.5	81.3	8,163.1	5,529.0	2,727.8	8,256.8	2,520.7	4,645.9	—	478,296.0
②	1,903.5	620.5	450.5	138.2	55.9	1.8	0.9	—	—	—	2,353.1	—	94.5	70.2	41.9	112.1	17.6	66.7	—	5,815.3
③	40,352.2	12,322.1	6,296.0	1,752.0	1,267.3	37.4	14.2	9.2	21.9	31.1	46,034.6	789.5	1,241.6	1,642.0	742.5	2,384.5	635.3	1,159.9	—	114,317.7
④	7,864.3	2,634.6	1,538.8	780.2	605.6	44.3	20.0	30.0	86.9	116.9	10,007.9	1,816.1	379.6	334.4	164.6	499.0	128.7	260.0	—	26,696.0
⑤	676.4	324.2	199.9	61.0	41.7	3.6	1.5	—	—	—	970.7	—	26.7	34.9	17.6	52.5	11.9	32.6	—	2,402.7
⑥	76,610.6	21,344.5	8,782.3	3,556.3	1,543.7	115.8	35.6	4.4	44.2	48.6	83,095.7	430.6	3,941.2	3,789.0	1,488.5	5,277.5	2,101.9	1,876.9	—	208,761.2
⑦	2,926.0	720.4	328.1	177.6	67.4	22.4	7.5	3.8	4.2	8.0	3,153.1	194.1	63.7	116.5	47.9	164.4	66.1	65.3	—	7,964.1
⑧	514.9	87.2	36.7	18.2	18.6	1.4	0.5	0.5	—	0.5	502.7	24.4	11.9	15.0	6.0	21.0	7.6	7.7	—	1,253.3
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	9,596.5	1,749.4	1,042.5	1,272.3	652.3	10.6	4.3	7.9	—	7.9	10,631.2	358.3	560.4	200.0	100.6	300.6	143.6	173.9	—	26,503.8
⑪-1	67,951.9	19,775.4	9,489.5	10,553.6	6,325.1	11.9	4.6	—	—	—	84,671.3	—	6,184.5	2,886.3	1,261.5	4,147.8	2,206.6	1,823.2	—	213,145.4
⑪-2	28,258.1	8,798.0	6,560.8	3,502.1	1,197.8	7.3	2.7	—	—	—	35,858.5	—	6,837.8	2,661.4	1,101.7	3,763.1	2,160.7	956.9	—	97,903.8
⑪-3	10,007.3	3,248.0	1,770.5	715.0	347.3	9.8	3.8	—	—	—	11,947.3	—	500.8	424.7	198.7	623.4	124.5	312.6	—	29,610.3
⑫	2,653.9	156.4	102.7	1,139.1	893.5	0.3	0.2	—	4.9	4.9	3,670.0	36.6	415.2	16.5	9.7	26.2	39.8	16.1	—	9,154.9
⑬	40,706.4	14,364.5	8,321.2	16,833.8	11,098.5	62.2	23.7	32.3	12.1	44.4	67,826.5	1,524.5	6,844.4	1,918.7	915.2	2,833.9	1,896.4	1,413.3	—	173,793.7
⑭	44,706.4	13,652.5	8,526.9	5,507.0	3,784.6	82.4	34.1	13.7	60.9	74.6	56,609.9	935.2	3,118.2	1,789.8	903.1	2,692.9	907.6	1,381.8	—	142,014.1
⑮	42,311.6	14,237.5	9,138.1	3,345.2	1,795.7	105.7	53.3	65.4	150.8	216.2	52,672.3	5,622.5	1,826.1	1,832.7	993.9	2,826.6	529.6	1,456.3	—	136,136.7
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	11,296.1	2,600.7	1,301.5	743.8	548.1	32.6	10.6	5.6	33.9	39.5	12,267.8	439.4	542.8	377.2	168.3	545.5	275.8	243.1	—	30,887.3
⑰-2	11,781.4	2,849.7	1,260.7	5,405.5	4,336.3	11.5	3.8	6.8	—	6.8	19,031.5	297.5	3,064.3	454.4	187.8	642.2	578.2	256.1	—	49,525.5
⑰-3	4,524.6	1,391.6	700.0	235.8	139.7	2.0	0.9	1.4	—	1.4	5,189.9	69.1	124.4	187.5	83.1	270.6	103.8	130.3	—	12,884.1
⑰-4	115.3	2.5	1.5	5.9	4.7	—	—	—	—	—	96.5	—	1.9	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	—	229.3
合計	558,521.6	167,243.3	94,057.0	79,327.8	43,676.2	632.1	252.2	181.2	432.0	613.2	700,233.0	12,619.1	43,943.1	24,280.4	11,160.6	35,441.0	14,456.7	16,278.9	—	1,767,295.2

単位：百万円

様式-3 被害額（当面事業完成(R13河道）：雨量1.07倍）

様式-3

被害額

当面事業完成（R13河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/2

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労働 対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑫	126.3	0.2	—	29.8	16.9	—	—	—	—	—	128.5	—	29.1	0.2	0.1	0.3	1.7	—	—	332.8
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	126.3	0.2	—	29.8	16.9	—	—	—	—	—	128.5	—	29.1	0.2	0.1	0.3	1.7	—	—	332.8

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑫	855.8	41.0	25.6	221.2	138.1	0.3	0.2	—	—	—	951.4	—	101.0	3.7	2.6	6.3	6.2	4.1	—	2,351.2
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	855.8	41.0	25.6	221.2	138.1	0.3	0.2	—	—	—	951.4	—	101.0	3.7	2.6	6.3	6.2	4.1	—	2,351.2

単位：百万円

様式-3

被害額

当面事業完成（R13河道）雨量1.07倍

水系名：狩野川

河川名：狩野川

流量規模：1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	2,419.2	313.3	212.5	317.1	152.3	1.3	0.6	4.7	—	4.7	2,534.8	293.2	190.6	61.2	33.3	94.5	28.0	32.8	—	6,594.9
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	2,021.0	82.3	63.9	631.1	388.5	0.7	0.3	—	—	—	2,365.3	—	223.0	13.2	7.1	20.3	23.0	9.1	—	5,828.5
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	4,440.2	395.6	276.4	948.2	540.8	2.0	0.9	4.7	—	4.7	4,900.1	293.2	413.6	74.4	40.4	114.8	51.0	41.9	—	12,423.4

単位：百万円

様式-3

被害額

当面事業完成（R13河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/17

氾 濫 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営 業 停 止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 に お け る 応 急 対 策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合 計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	4,324.4	695.2	444.5	591.7	289.4	3.5	1.6	6.9	—	6.9	4,712.0	342.1	288.2	86.8	50.9	137.7	51.2	71.0	—	11,959.4
⑪	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑫	3,818.5	505.0	324.4	1,021.5	674.4	1.7	0.7	—	1.6	1.6	4,709.0	16.3	462.9	90.8	45.3	136.1	52.5	51.7	—	11,776.3
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	8,142.9	1,200.2	768.9	1,613.2	963.8	5.2	2.3	6.9	1.6	8.5	9,421.0	358.4	751.1	177.6	96.2	273.8	103.7	122.7	—	23,735.7

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	42,009.8	13,639.5	8,205.3	2,583.9	1,097.0	50.8	22.8	4.3	32.6	36.9	50,166.0	422.4	1,712.2	1,538.4	766.1	2,304.5	695.2	1,360.9	—	124,307.2
⑦	1,407.9	460.0	234.6	55.5	29.7	10.8	4.2	3.2	3.2	6.4	1,634.5	161.7	23.1	61.4	28.1	89.5	24.2	43.3	—	4,185.4
⑧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	5,943.0	1,003.9	756.7	790.3	400.8	5.5	2.5	7.4	—	7.4	6,605.8	346.1	363.8	110.3	65.1	175.4	71.0	109.7	—	16,581.9
⑪	12,305.4	3,799.1	2,444.3	863.6	466.6	8.5	3.7	—	—	—	14,759.3	—	532.5	441.6	235.9	677.5	112.5	389.0	—	36,362.0
⑫	4,927.8	712.2	466.5	1,301.7	860.8	2.1	0.8	—	3.7	3.7	6,137.7	32.5	606.5	129.4	64.9	194.3	67.7	73.4	—	15,387.7
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑮	23,075.7	7,631.7	4,993.8	1,532.2	729.4	48.4	24.8	32.4	82.4	114.8	28,222.7	3,167.9	948.4	1,095.9	599.2	1,695.1	272.7	786.6	—	73,244.2
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	4,972.9	1,140.3	660.3	412.7	298.2	15.1	6.5	5.2	30.6	35.8	5,569.5	402.7	215.2	134.4	67.4	201.8	88.6	112.2	—	14,131.8
⑰-2	3,722.1	1,156.9	785.3	1,861.5	1,488.7	3.4	1.8	5.9	—	5.9	6,692.7	281.2	774.9	118.8	67.7	186.5	90.9	121.0	—	17,172.8
⑰-3	876.7	226.2	135.5	49.4	25.1	—	—	0.1	—	0.1	974.2	4.1	25.1	41.5	22.3	63.8	10.2	22.5	—	2,412.9
合計	99,241.3	29,769.8	18,682.3	9,450.8	5,396.3	144.6	67.1	58.5	152.5	211.0	120,762.4	4,818.6	5,201.7	3,671.7	1,916.7	5,588.4	1,433.0	3,018.6	—	303,785.9

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	85,162.6	27,558.7	21,681.3	13,951.8	4,646.2	32.6	18.3	—	9.8	9.8	113,564.0	65.0	4,762.8	2,969.3	1,768.9	4,738.2	1,400.7	3,067.7	—	280,659.7
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③-1	—	2.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	0.4	0.2	0.6	—	0.2	—	7.8
③-2	7,773.8	1,761.5	1,227.6	278.5	203.6	4.4	2.3	1.4	8.1	9.5	8,348.7	125.7	183.7	259.0	146.2	405.2	59.1	186.2	—	20,569.8
③-3	6,643.2	2,455.1	1,712.8	533.6	206.6	13.2	7.1	29.4	3.4	32.8	8,586.1	1,551.2	307.4	288.1	164.7	452.8	75.2	259.7	—	22,836.8
③-4	780.1	200.3	118.4	86.9	88.5	6.7	3.0	0.8	16.7	17.5	952.6	126.1	29.4	23.1	11.2	34.3	6.1	19.9	—	2,469.8
④	2,738.6	1,145.7	706.9	296.9	240.1	14.1	7.9	26.7	74.3	101.0	3,821.4	1,694.9	140.4	149.5	79.1	228.6	33.8	115.4	—	11,285.7
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	57,981.2	17,865.3	8,685.1	3,179.8	1,379.0	80.8	28.4	4.4	41.7	46.1	66,186.0	426.5	2,647.4	2,471.5	1,074.2	3,545.7	1,273.3	1,654.1	—	164,978.7
⑦	2,091.2	589.6	287.7	109.1	48.6	16.5	5.8	3.5	3.5	7.0	2,336.1	182.0	38.1	88.0	37.7	125.7	40.6	54.7	—	5,932.7
⑧	447.5	70.8	31.7	15.9	16.6	1.3	0.4	0.4	—	0.4	433.4	20.3	9.9	11.8	4.8	16.6	6.2	6.4	—	1,077.4
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	7,715.1	1,413.1	924.2	1,034.7	526.4	7.9	3.6	7.7	—	7.7	8,625.7	350.2	455.7	154.4	84.2	238.6	105.0	145.6	—	21,553.5
⑪-1	42,727.2	12,684.6	7,347.0	8,060.1	4,958.9	5.9	2.7	—	—	—	56,233.5	—	3,134.8	1,440.5	711.4	2,151.9	865.9	1,248.0	—	139,420.5
⑪-2	16,242.9	5,446.3	4,996.0	2,031.3	685.2	3.3	1.3	—	—	—	21,819.4	—	3,543.5	1,299.8	584.3	1,884.1	975.2	650.6	—	58,279.1
⑪-3	14,912.4	4,657.9	2,866.9	1,084.1	584.6	11.5	4.8	—	—	—	17,898.6	—	652.3	560.1	286.2	846.3	158.5	468.8	—	44,146.7
⑫	5,660.2	959.3	580.2	1,463.2	958.7	2.5	1.0	—	6.4	6.4	7,141.7	40.6	699.5	161.2	81.2	242.4	81.9	95.9	—	17,933.5
⑬	8,500.1	2,330.2	1,629.4	3,525.9	2,572.6	11.2	5.6	19.2	11.2	30.4	13,782.6	1,057.1	1,187.6	243.9	141.2	385.1	241.8	246.7	—	35,506.3
⑭	10,666.6	2,750.4	1,993.2	1,390.8	1,019.8	15.3	8.0	12.1	58.1	70.2	13,240.3	886.2	775.3	400.5	225.0	625.5	158.3	295.5	—	33,895.4
⑮	32,376.9	10,652.8	7,126.2	2,222.6	1,121.8	71.2	35.5	54.0	124.0	178.0	39,776.4	4,973.3	1,396.8	1,496.1	807.4	2,303.5	383.3	1,107.6	—	103,725.9
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	7,698.7	1,711.5	901.5	567.3	422.3	22.5	8.2	5.5	32.5	38.0	8,408.4	423.1	365.0	230.8	106.7	337.5	171.4	162.8	—	21,238.2
⑰-2	7,652.2	2,100.9	1,056.6	3,664.2	3,130.4	7.2	2.6	6.6	—	6.6	13,069.7	293.4	1,835.3	277.2	124.8	402.0	294.8	196.7	—	33,712.6
⑰-3	3,026.5	925.4	563.5	179.7	102.2	0.7	0.4	0.8	—	0.8	3,560.4	52.8	71.7	104.6	53.3	157.9	48.4	92.8	—	8,783.2
合計	320,797.0	97,282.0	64,437.6	43,676.4	22,912.1	328.8	146.9	172.5	389.7	562.2	407,788.0	12,268.4	22,236.6	12,629.8	6,492.7	19,122.5	6,379.5	10,075.3	—	1,028,013.3

単位：百万円

様式-3 被害額 当面事業完成（R13河道）雨量1.07倍 水系名： 狩野川 河川名： 狩野川 流量規模： 1/60

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	98,295.9	31,543.6	22,840.7	15,970.9	5,662.9	40.4	21.3	—	11.0	11.0	129,386.6	65.0	5,477.9	3,474.6	1,953.0	5,427.6	1,694.2	3,388.1	—	319,826.1
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③-1	—	4.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	0.4	0.3	0.7	—	0.5	—	14.6
③-2	14,759.5	4,265.6	2,976.3	640.9	426.1	8.8	4.6	1.6	8.5	10.1	17,126.6	137.9	369.2	463.3	270.8	734.1	136.6	451.2	—	42,047.5
③-3	9,191.2	3,413.3	2,145.6	702.2	296.4	19.9	9.7	33.1	4.4	37.5	11,707.5	1,627.7	390.4	393.6	209.4	603.0	107.7	346.3	—	30,598.4
③-4	985.9	239.8	120.4	103.4	104.6	9.4	3.9	0.8	16.7	17.5	1,163.1	126.1	41.9	31.5	14.1	45.6	10.2	22.4	—	2,994.2
④	3,506.7	1,432.2	889.1	360.1	290.8	18.7	10.0	27.9	79.1	107.0	4,828.6	1,747.4	172.9	175.5	93.3	268.8	45.0	144.6	—	13,821.9
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑥	62,690.8	19,102.8	8,726.0	3,290.4	1,427.6	90.3	30.5	4.4	43.8	48.2	70,755.9	430.6	2,978.2	2,840.3	1,194.1	4,034.4	1,489.7	1,733.7	—	176,829.1
⑦	2,219.2	618.8	297.8	117.2	50.4	18.3	6.6	3.5	3.5	7.0	2,469.6	182.0	45.4	96.0	40.3	136.3	46.5	57.1	—	6,272.2
⑧	490.0	77.7	31.7	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	471.5	24.4	11.5	14.0	5.5	19.5	7.4	6.8	—	1,177.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	8,420.7	1,527.8	955.8	1,112.5	574.8	9.0	3.8	7.8	—	7.8	9,352.5	350.2	483.5	171.3	89.2	260.5	115.7	154.7	—	23,329.3
⑪-1	48,081.6	14,210.2	7,857.5	8,580.1	5,270.0	6.5	2.9	—	—	—	62,334.5	—	3,725.9	1,738.3	823.0	2,561.3	1,110.6	1,374.8	—	155,115.9
⑪-2	19,228.2	6,411.9	5,304.0	2,170.1	798.7	3.9	1.5	—	—	—	25,167.3	—	4,246.5	1,635.5	709.8	2,345.3	1,272.9	729.9	—	67,680.2
⑪-3	4,615.6	1,542.0	965.2	310.5	107.9	4.7	2.1	—	—	—	5,600.6	—	222.3	181.9	93.1	275.0	41.3	156.2	—	13,843.4
⑫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑭	17,459.2	5,128.8	3,923.4	2,241.6	1,596.1	28.0	14.7	12.6	59.8	72.4	22,550.7	890.3	1,199.2	612.7	360.1	972.8	277.8	564.0	—	56,919.0
⑮	35,247.1	11,613.6	7,601.1	2,538.6	1,321.1	79.6	39.9	57.8	130.9	188.7	43,363.2	5,182.0	1,519.7	1,583.5	858.1	2,441.6	420.7	1,197.1	—	112,754.0
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	8,906.6	1,984.5	1,033.6	624.9	467.6	25.5	8.9	5.5	32.6	38.1	9,684.3	423.1	418.3	271.0	124.1	395.1	197.7	188.0	—	24,396.2
⑰-2	8,751.8	2,289.6	1,108.7	4,108.3	3,488.0	9.1	3.0	6.7	—	6.7	14,660.8	293.4	2,154.6	320.7	139.9	460.6	360.6	211.7	—	37,906.9
⑰-3	3,562.6	1,093.2	612.6	202.6	116.1	1.1	0.6	1.0	—	1.0	4,146.9	60.9	89.4	133.6	64.1	197.7	67.3	106.3	—	10,258.3
⑰-4	31.4	0.3	—	1.3	0.9	—	—	—	—	—	25.1	—	1.2	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	60.8
合計	346,444.0	106,500.3	67,392.6	43,092.4	22,017.5	374.5	164.4	163.2	390.3	553.5	434,801.0	11,541.0	23,548.0	14,137.9	7,042.3	21,180.2	7,402.2	10,833.4	—	1,095,845.0

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	111,573.2	34,959.4	23,737.6	17,606.7	6,494.7	47.5	23.6	—	11.7	11.7	144,276.3	65.0	6,082.0	4,020.4	2,132.4	6,152.8	1,890.8	3,656.8	—	356,578.1
②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③-1	—	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	0.6	0.4	1.0	—	0.7	—	22.4
③-2	18,804.8	5,907.8	3,992.2	867.4	570.8	13.9	7.0	1.7	9.0	10.7	22,381.6	146.0	493.2	624.2	349.2	973.4	201.9	616.8	—	54,987.5
③-3	10,810.9	3,954.4	2,430.7	868.0	383.7	23.3	10.9	34.9	4.6	39.5	13,713.5	1,655.8	444.7	454.0	234.5	688.5	126.9	397.8	—	35,548.6
③-4	1,172.6	271.8	127.2	114.7	120.9	11.5	4.4	0.8	16.7	17.5	1,352.7	126.1	54.1	38.3	16.6	54.9	14.0	24.9	—	3,467.3
④	4,423.0	1,676.8	1,035.5	446.2	364.7	23.3	11.9	28.5	82.1	110.6	5,922.2	1,771.7	214.4	197.0	104.5	301.5	58.7	169.0	—	16,529.5
⑤	65.9	40.9	16.8	3.1	1.3	0.3	0.2	—	—	—	95.4	—	3.0	7.1	4.1	11.2	0.9	3.6	—	242.6
⑥	67,192.1	19,919.1	8,741.9	3,394.1	1,472.0	97.8	31.9	4.4	44.0	48.4	74,829.8	430.6	3,280.7	3,151.7	1,293.3	4,445.0	1,702.3	1,785.6	—	187,371.3
⑦	2,506.0	670.5	306.8	137.7	56.2	19.7	7.1	3.6	3.8	7.4	2,748.4	186.1	52.0	105.1	43.9	149.0	55.4	60.9	—	6,963.2
⑧	490.0	78.1	34.0	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	473.4	24.4	11.5	14.1	5.6	19.7	7.4	7.0	—	1,182.0
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	8,732.3	1,594.3	991.3	1,153.1	592.3	9.7	3.9	7.9	—	7.9	9,703.1	358.3	502.3	181.2	92.9	274.1	122.9	161.1	—	24,206.6
⑪-1	53,699.8	15,867.4	8,333.1	9,148.0	5,611.5	7.6	3.3	—	—	—	68,761.7	—	4,543.0	2,092.1	956.3	3,048.4	1,481.5	1,507.7	—	172,013.0
⑪-2	21,485.6	7,153.6	5,665.5	2,639.3	937.8	4.7	1.8	—	—	—	28,113.1	—	4,888.4	1,879.4	805.0	2,684.4	1,508.5	798.6	—	75,881.3
⑪-3	5,850.6	1,998.6	1,180.1	416.0	164.6	5.7	2.5	—	—	—	7,136.6	—	279.1	237.4	120.2	357.6	57.1	198.0	—	17,646.5
⑫	702.5	23.5	24.2	255.7	170.6	0.1	—	—	2.4	2.4	873.1	24.4	135.4	5.5	2.9	8.4	10.0	3.0	—	2,233.3
⑬	20,463.5	6,380.8	3,897.1	9,101.0	6,434.4	31.5	12.9	28.3	12.1	40.4	34,370.2	1,399.4	3,352.9	818.2	418.5	1,236.7	786.5	640.3	—	88,147.6
⑭	21,487.9	6,487.4	4,904.8	2,778.7	1,953.8	37.9	19.1	12.8	60.4	73.2	27,950.8	894.3	1,488.1	782.5	441.8	1,224.3	369.6	709.7	—	70,379.6
⑮	37,367.9	12,379.8	8,087.4	2,747.4	1,431.4	87.0	43.4	59.6	139.0	198.6	46,111.0	5,308.2	1,618.7	1,674.3	901.6	2,575.9	459.7	1,275.1	—	119,691.5
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	9,536.5	2,162.2	1,106.5	654.2	491.6	27.4	9.3	5.5	33.6	39.1	10,378.8	431.2	452.4	305.4	137.9	443.3	216.5	203.6	—	26,152.6
⑰-2	9,873.8	2,510.3	1,147.3	4,552.9	3,816.9	10.2	3.3	6.7	—	6.7	16,260.8	293.4	2,433.7	370.6	158.0	528.6	417.9	227.9	—	42,083.7
⑰-3	3,832.3	1,188.5	642.9	213.0	122.8	1.4	0.8	1.1	—	1.1	4,453.3	65.0	102.5	151.7	70.2	221.9	82.7	114.1	—	11,042.3
⑰-4	31.4	0.3	0.3	1.3	0.9	—	—	—	—	—	25.4	—	1.2	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	61.4
合計	410,102.6	125,231.8	76,408.8	57,115.3	31,210.4	461.8	197.7	196.3	419.4	615.7	519,940.0	13,179.9	30,433.3	17,111.0	8,289.9	25,400.9	9,571.5	12,562.2	—	1,312,431.9

単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事 業 所 における 応急対策 費 用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稻	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	121,002.1	37,448.4	24,404.6	18,669.7	7,035.4	52.6	25.0	—	12.2	12.2	154,809.0	65.0	6,481.3	4,373.1	2,251.3	6,624.4	2,027.3	3,853.4	—	382,510.4
②	82.1	17.6	1.9	3.6	1.7	0.1	0.1	—	—	—	79.4	—	4.0	2.6	1.6	4.2	0.6	1.2	—	196.5
③-1	134.8	30.9	15.3	2.8	2.0	—	—	—	—	—	137.8	—	3.2	6.7	3.6	10.3	0.9	2.9	—	340.9
③-2	21,542.1	6,733.4	4,360.9	999.5	675.0	16.6	8.1	1.7	9.1	10.8	25,477.0	146.0	568.1	742.9	395.1	1,138.0	241.6	691.2	—	62,608.3
③-3	11,819.8	4,374.2	2,586.5	915.9	421.1	25.9	11.8	35.9	5.3	41.2	14,955.2	1,671.8	462.9	492.8	253.1	745.9	137.8	433.7	—	38,603.7
③-4	1,248.8	287.0	131.6	115.0	121.2	13.0	4.6	0.9	16.7	17.6	1,425.6	130.2	54.4	42.6	17.9	60.5	14.3	26.1	—	3,649.9
④	4,967.8	1,860.0	1,153.4	501.5	403.2	27.4	13.4	28.9	83.3	112.2	6,623.6	1,779.8	236.8	219.8	115.6	335.4	64.9	187.7	—	18,267.1
⑤	233.1	118.7	87.0	19.6	11.9	1.2	0.7	—	—	—	350.4	—	10.0	14.1	8.3	22.4	3.7	12.8	—	871.5
⑥	70,102.8	20,467.3	8,752.4	3,440.1	1,495.9	104.4	33.1	4.4	44.0	48.4	77,461.7	430.6	3,493.9	3,368.9	1,361.0	4,729.9	1,833.6	1,820.4	—	194,214.5
⑦	2,640.9	685.4	311.8	161.5	61.8	20.3	7.2	3.6	4.2	7.8	2,885.6	190.1	57.2	109.1	45.3	154.4	57.6	62.1	—	7,303.7
⑧	490.0	80.5	34.2	16.8	17.5	1.3	0.4	0.5	—	0.5	475.4	24.4	11.5	14.1	5.6	19.7	7.4	7.2	—	1,186.8
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	9,097.4	1,663.9	1,006.4	1,213.2	620.8	9.9	4.0	7.9	—	7.9	10,102.8	358.3	522.1	187.9	95.6	283.5	130.9	166.4	—	25,187.5
⑪-1	58,373.4	17,091.1	8,568.6	9,575.4	5,872.1	9.5	3.7	—	—	—	73,824.5	—	5,227.7	2,373.9	1,059.7	3,433.6	1,784.6	1,598.6	—	185,362.8
⑪-2	22,549.5	7,597.4	6,010.1	2,703.7	978.7	5.3	2.0	—	—	—	29,566.3	—	5,075.4	1,959.4	842.5	2,801.9	1,562.8	847.7	—	79,700.8
⑪-3	6,919.9	2,325.5	1,316.0	484.7	209.1	6.7	2.8	—	—	—	8,358.3	—	334.0	280.4	139.8	420.2	71.3	226.9	—	20,675.4
⑫	884.8	51.7	34.3	310.6	210.0	0.1	0.1	—	3.2	3.2	1,106.7	28.4	149.6	6.5	4.0	10.5	10.4	5.4	—	2,805.8
⑬	23,628.0	7,678.8	4,782.7	10,504.8	7,236.3	36.5	14.9	29.3	12.1	41.4	39,980.4	1,427.6	3,866.0	978.5	498.3	1,476.8	933.0	776.4	—	102,383.6
⑭	24,987.9	7,632.0	5,517.8	3,220.1	2,244.7	47.2	22.9	13.4	60.6	74.0	32,405.0	927.1	1,737.1	933.5	514.3	1,447.8	453.3	819.2	—	81,536.1
⑮	38,724.7	12,918.3	8,444.7	2,905.9	1,521.8	93.5	46.8	61.7	142.4	204.1	47,974.4	5,422.5	1,673.8	1,728.2	929.1	2,657.3	484.9	1,330.9	—	124,403.6
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	10,026.4	2,287.5	1,183.7	685.5	510.8	29.5	9.8	5.5	33.7	39.2	10,932.0	431.2	477.2	323.4	146.0	469.4	231.7	216.3	—	27,530.2
⑰-2	10,295.5	2,580.9	1,194.4	4,737.9	3,920.7	10.3	3.3	6.7	—	6.7	16,875.4	293.4	2,537.7	389.3	164.6	553.9	442.0	235.2	—	43,687.3
⑰-3	4,098.5	1,300.3	658.0	220.9	128.2	1.8	0.9	1.2	—	1.2	4,755.2	65.0	110.0	166.0	76.3	242.3	89.5	122.0	—	11,793.8
⑰-4	73.4	0.3	0.3	3.6	2.8	—	—	—	—	—	59.6	—	1.5	0.2	0.1	0.3	0.3	—	—	142.1
合計	443,923.7	135,231.1	80,556.6	61,412.3	33,702.7	513.1	215.6	201.6	426.8	628.4	560,621.3	13,391.4	33,095.4	18,713.9	8,928.7	27,642.6	10,584.4	13,443.7	—	1,414,962.3

単位：百万円

様式-3

被害額

当面事業完成（R13河道）雨量1.07倍

水系名： 狩野川

河川名： 狩野川

流量規模： 1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額		営業停止 損 失	家庭における応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体によ る応急対策 費用	その他の間 接被害	合計
	家屋	家庭用品		事業所償却		農漁家		水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農業 用施設		清掃労 働対価	代 替 活動等	小計				
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫													
①	134,442.8	40,935.7	25,578.3	21,098.2	7,879.4	59.2	26.5	—	12.2	12.2	170,675.0	65.0	7,124.9	4,877.3	2,429.1	7,306.4	2,218.8	4,143.8	—	421,566.2
②	99.7	18.8	21.0	4.2	2.0	0.1	0.1	—	—	—	108.2	—	5.5	3.4	1.9	5.3	0.9	2.5	—	268.3
③-1	517.2	121.6	83.6	12.1	8.8	0.2	0.1	—	—	—	551.8	—	9.3	16.9	10.0	26.9	2.8	12.8	—	1,347.2
③-2	28,214.8	8,751.1	5,060.1	1,288.5	913.0	23.6	10.2	1.7	12.0	13.7	32,841.8	158.2	772.7	1,007.5	501.2	1,508.7	347.2	860.4	—	80,764.0
③-3	14,171.0	5,206.5	3,042.5	1,188.9	559.9	34.1	14.4	37.2	5.3	42.5	17,969.2	1,708.1	578.4	590.6	297.1	887.7	180.5	513.9	—	46,097.6
③-4	1,342.0	306.8	137.2	121.0	127.9	14.7	5.3	0.9	16.7	17.6	1,524.7	130.2	64.4	49.1	20.0	69.1	17.5	27.7	—	3,906.1
④	6,144.7	2,157.1	1,366.9	616.8	494.6	33.5	15.7	29.5	85.2	114.7	8,035.3	1,804.0	301.3	265.2	134.5	399.7	86.0	219.5	—	21,789.8
⑤	642.3	299.7	193.1	59.2	40.6	3.2	1.4	—	—	—	919.8	—	25.7	31.2	16.3	47.5	11.5	30.7	—	2,274.7
⑥	76,610.6	21,344.5	8,782.3	3,556.3	1,543.7	115.8	35.6	4.4	44.2	48.6	83,095.7	430.6	3,941.2	3,789.0	1,488.5	5,277.5	2,101.9	1,876.9	—	208,761.2
⑦	2,926.0	720.4	328.1	177.6	67.4	22.4	7.5	3.8	4.2	8.0	3,153.1	194.1	63.7	116.5	47.9	164.4	66.1	65.3	—	7,964.1
⑧	514.9	87.2	36.7	18.2	18.6	1.4	0.5	0.5	—	0.5	502.7	24.4	11.9	15.0	6.0	21.0	7.6	7.7	—	1,253.3
⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑩	9,596.5	1,749.4	1,042.5	1,272.3	652.3	10.6	4.3	7.9	—	7.9	10,631.2	358.3	560.4	200.0	100.6	300.6	143.6	173.9	—	26,503.8
⑪-1	63,138.9	18,475.1	9,019.2	10,078.8	6,095.4	10.5	4.1	—	—	—	79,262.0	—	5,793.4	2,648.1	1,167.3	3,815.4	2,043.6	1,712.9	—	199,449.3
⑪-2	25,656.9	8,301.8	6,454.1	3,363.5	1,133.9	6.5	2.5	—	—	—	33,330.0	—	6,262.4	2,374.4	989.5	3,363.9	1,971.3	919.3	—	90,766.1
⑪-3	8,638.6	2,806.1	1,558.8	605.4	284.5	8.2	3.2	—	—	—	10,317.3	—	421.7	354.1	169.3	523.4	95.7	271.9	—	25,534.8
⑫	1,686.2	96.8	65.4	619.7	463.8	0.3	0.2	—	4.9	4.9	2,175.8	36.6	231.2	10.0	5.9	15.9	16.7	10.1	—	5,423.6
⑬	31,142.6	10,762.4	6,589.0	13,461.5	8,887.4	46.9	18.5	30.6	12.1	42.7	52,613.9	1,467.7	5,151.0	1,372.9	688.3	2,061.2	1,374.0	1,081.0	—	134,699.8
⑭	31,672.4	9,713.2	6,507.9	4,100.9	2,802.1	59.7	27.7	13.5	60.6	74.1	40,723.9	931.1	2,216.1	1,193.7	639.3	1,833.0	617.1	1,010.6	—	102,289.8
⑮	42,049.2	14,135.9	9,068.5	3,297.8	1,760.7	104.5	52.6	64.9	148.6	213.5	52,288.2	5,598.1	1,811.0	1,823.7	987.4	2,811.1	528.2	1,445.6	—	135,164.9
⑯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑰-1	11,275.2	2,600.4	1,301.5	743.7	547.9	32.5	10.6	5.6	33.9	39.5	12,251.8	439.4	541.3	376.6	168.2	544.8	274.9	243.1	—	30,846.6
⑰-2	11,781.4	2,849.7	1,261.9	5,405.5	4,336.3	11.5	3.8	6.8	—	6.8	19,032.4	297.5	3,064.3	454.4	187.8	642.2	578.2	256.1	—	49,527.6
⑰-3	4,524.6	1,391.6	700.0	235.8	139.7	2.0	0.9	1.4	—	1.4	5,189.9	69.1	124.4	187.5	83.1	270.6	103.8	130.3	—	12,884.1
⑰-4	115.3	2.5	1.5	5.9	4.7	—	—	—	—	—	96.5	—	1.9	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	—	229.3
合計	506,903.8	152,834.3	88,200.1	71,331.8	38,764.6	601.4	245.7	208.7	439.9	648.6	637,290.2	13,712.4	39,078.1	21,757.3	10,139.4	31,896.7	12,788.2	15,016.3	—	1,609,312.2

単位：百万円

様式-4 年平均被害軽減期待額

河川名：狩野川

整備計画策定時（R8河道）→整備計画完成（R38河道）

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均 被害額④ (百万円)	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 ＝年平均被害軽減期待額 (百万円)	備 考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	被害軽減額 ③＝①－②					
1/2	0.500	—	—	—	—	—	—	—	
1/3	0.333	769.2	—	769.2	385.0	0.167	64.0	64.0	
1/5	0.200	2,756.6	—	2,756.6	1,763.0	0.133	234.0	298.0	
1/10	0.100	40,117.8	—	40,117.8	21,437.0	0.100	2,144.0	2,442.0	
1/17	0.059	120,267.3	—	120,267.3	80,193.0	0.041	3,288.0	5,730.0	
1/30	0.033	1,112,111.2	328,464.4	783,646.8	451,957.0	0.026	11,751.0	17,481.0	
1/50	0.020	1,507,236.3	508,785.3	998,451.0	891,049.0	0.013	11,584.0	29,065.0	
1/60	0.017	1,623,888.5	409,324.0	1,214,564.5	1,106,508.0	0.003	3,320.0	32,385.0	
1/70	0.014	1,730,985.0	431,434.1	1,299,550.9	1,257,058.0	0.003	3,771.0	36,156.0	
1/80	0.013	1,736,672.4	839,801.5	896,870.9	1,098,211.0	0.001	1,098.0	37,254.0	
1/100	0.010	1,962,092.1	1,347,036.7	615,055.4	755,963.0	0.003	2,268.0	39,522.0	

全体事業の便益：整備計画河道－整備計画策定時河道

様式-4 年平均被害軽減期待額

河川名：狩野川

整備計画策定時（R8河道）→当面事業完成（R13河道）

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均 被害額④ (百万円)	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 ＝年平均被害軽減期待額 (百万円)	備 考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	被害軽減額 ③＝①－②					
1/2	0.500	—	—	—	—	—	—	—	
1/3	0.333	332.8	332.8	—	—	0.167	—	—	
1/5	0.200	2,351.2	2,351.2	—	—	0.133	—	—	
1/10	0.100	33,175.7	12,423.4	20,752.3	10,376.0	0.100	1,038.0	1,038.0	
1/17	0.059	101,974.2	23,735.7	78,238.5	49,495.0	0.041	2,029.0	3,067.0	
1/30	0.033	1,012,709.9	303,785.9	708,924.0	393,581.0	0.026	10,233.0	13,300.0	
1/50	0.020	1,396,385.8	1,028,013.3	368,372.5	538,648.0	0.013	7,002.0	20,302.0	
1/60	0.017	1,492,675.9	1,095,845.0	396,830.9	382,602.0	0.003	1,148.0	21,450.0	
1/70	0.014	1,600,091.5	1,312,431.9	287,659.6	342,245.0	0.003	1,027.0	22,477.0	
1/80	0.013	1,667,327.8	1,414,962.3	252,365.5	270,013.0	0.001	270.0	22,747.0	
1/100	0.010	1,767,295.2	1,609,312.2	157,983.0	205,174.0	0.003	616.0	23,363.0	

全体事業の便益：当面整備河道－整備計画策定時河道 雨量1.07倍

様式-5 費用対便益（全体事業（R9～R38））

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業）

水系名：狩野川水系

（単位：百万円）

表式-1					費用対便益（単位：千円）					小浜市：対野川小浜										単位：円/年	
年次	西暦	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益：B		計 (①+②)	建設費③		費用：C		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR				
						便益①	現在価値 ②		費用	現在価値	維持管理費④ 費用	現在価値	費用	現在価値							
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000																
整備期間（30年）	2027	R09	1	0.962	1.000		0	0			2,184	2,101	0	0	2,184	2,101					
	2028	R10	2	0.925	1.000		4,260	3,941			2,570	2,377	4	3	2,573	2,380					
	2029	R11	3	0.889	1.000		9,272	8,243			2,570	2,285	7	6	2,577	2,291					
	2030	R12	4	0.855	1.000		14,285	12,214			2,327	1,990	11	9	2,338	1,999					
	2031	R13	5	0.822	1.000		18,824	15,473			2,327	1,913	45	37	2,372	1,950					
	2032	R14	6	0.790	1.000		23,363	18,457			4,839	3,822	49	38	4,887	3,860					
	2033	R15	7	0.760	1.000		24,295	18,464			4,156	3,158	352	267	4,507	3,425					
	2034	R16	8	0.731	1.000		25,095	18,344			4,132	3,020	352	257	4,484	3,277					
	2035	R17	9	0.703	1.000		25,891	18,201			4,084	2,871	352	247	4,436	3,118					
	2036	R18	10	0.676	1.000		26,677	18,034			4,097	2,770	352	238	4,450	3,008					
	2037	R19	11	0.650	1.000		27,466	17,853			6,047	3,930	353	229	6,400	4,159					
	2038	R20	12	0.625	1.000		28,631	17,894			7,916	4,948	353	221	8,269	5,169					
	2039	R21	13	0.601	1.000		30,155	18,123			7,885	4,739	353	212	8,238	4,951					
	2040	R22	14	0.577	1.000		31,674	18,276			7,885	4,550	442	255	8,328	4,805					
	2041	R23	15	0.555	1.000		33,192	18,422			6,340	3,519	353	196	6,693	3,715					
	2042	R24	16	0.534	1.000		34,413	18,377			6,732	3,595	353	189	7,085	3,784					
	2043	R25	17	0.513	1.000		35,709	18,319			6,986	3,584	353	181	7,339	3,765					
	2044	R26	18	0.494	1.000		37,055	18,305			2,978	1,471	353	174	3,332	1,645					
	2045	R27	19	0.475	1.000		37,628	17,873			2,292	1,089	353	168	2,645	1,257					
	2046	R28	20	0.456	1.000		38,069	17,359			798	364	353	161	1,151	525					
	2047	R29	21	0.439	1.000		38,223	16,780			1,023	449	465	204	1,488	653					
	2048	R30	22	0.422	1.000		38,420	16,213			1,023	432	293	124	1,316	556					
	2049	R31	23	0.406	1.000		38,617	15,679			1,023	415	287	116	1,310	531					
	2050	R32	24	0.390	1.000		38,814	15,137			1,023	399	376	147	1,399	546					
	2051	R33	25	0.375	1.000		39,011	14,629			1,023	384	163	61	1,187	445					
	2052	R34	26	0.361	1.000		39,208	14,154			385	139	278	100	663	239					
	2053	R35	27	0.347	1.000		39,283	13,631			385	134	278	96	663	230					
	2054	R36	28	0.333	1.000		39,357	13,106			385	128	278	93	663	221					
	2055	R37	29	0.321	1.000		39,431	12,657			236	76	278	89	514	165					
	2056	R38	30	0.308	1.000		39,476	12,159			236	73	278	86	514	159					
施設完成後の評価期間（50年）	2057	R39	31	0.296	1.000		39,522	11,699					52	15	52	15					
	2058	R40	32	0.285	1.000		39,522	11,264					52	15	52	15					
	2059	R41	33	0.274	1.000		39,522	10,829					52	14	52	14					
	2060	R42	34	0.264	1.000		39,522	10,434					141	37	141	37					
	2061	R43	35	0.253	1.000		39,522	9,999					52	13	52	13					
	2062	R44	36	0.244	1.000		39,522	9,643					52	13	52	13					
	2063	R45	37	0.234	1.000		39,522	9,248					563	132	563	132					
	2064	R46	38	0.225	1.000		39,522	8,892					563	127	563	127					
	2065	R47	39	0.217	1.000		39,522	8,576					563	122	563	122					
	2066	R48	40	0.208	1.000		39,522	8,221					563	117	563	117					
	2067	R49	41	0.200	1.000		39,522	7,904					563	113	563	113					
	2068	R50	42	0.193	1.000		39,522	7,628					918	177	918	177					
	2069	R51	43	0.185	1.000		39,522	7,312					918	170	918	170					
	2070	R52	44	0.178	1.000		39,522	7,035				1,007	179	1,007	179	179					
	2071	R53	45	0.171	1.000		39,522	6,758					918	157	918	157					
	2072	R54	46	0.165	1.000		39,522	6,521					982	162	982	162					
	2073	R55	47	0.158	1.000		39,522	6,244					385	61	385	61					
	2074	R56	48	0.152	1.000		39,522	6,007					385	59	385	59					
	2075	R57	49	0.146	1.000		39,522	5,770					385	56	385	56					
	2076	R58	50	0.141	1.000		39,522	5,573					385	54	385	54					
	2077	R59	51	0.135	1.000		39,522	5,335					564	76	564	76					
	2078	R60	52	0.130	1.000		39,522	5,138					392	51	392	51					
	2079	R61	53	0.125	1.000		39,522	4,940					385	48	385	48					
	2080	R62	54	0.120	1.000		39,522	4,743					474	57	474	57					
	2081	R63	55	0.116	1.000		39,522	4,585					261	30	261	30					
	2082	R64	56	0.111	1.000		39,522	4,387					721	80	721	80					
	2083	R65	57	0.107	1.000		39,522	4,229					721	77	721	77					
	2084	R66	58	0.103	1.000		39,522	4,071					721	74	721	74					
	2085	R67	59	0.099	1.000		39,522	3,913					515	51	515	51					
	2086	R68	60	0.095	1.000		39,522	3,755					515	49	515	49					
	2087	R69	61	0.091	1.000		39,522	3,597					52	5	52	5					
	2088	R70	62	0.088	1.000		39,522	3,478					52	5	52	5					
	2089	R71	63	0.085	1.000		39,522	3,359					52	4	52	4					
	2090	R72	64	0.081	1.000		39,522	3,201					141	11	141	11					
	2091	R73	65	0.078	1.000		39,522	3,083					52	4	52	4					
	2092	R74	66	0.075	1.000		39,522	2,964					52	4	52	4					
	2093	R75	67	0.072	1.000		39,522	2,846					563	41	563	41					
	2094	R76	68	0.069	1.000		39,522	2,727					563	39	563	39					
	2095	R77	69	0.067	1.000		39,522	2,648					563	38	563	38					
	2096	R78	70	0.064	1.000		39,522	2,529					563	36	563	36					
	2097	R79	71	0.062	1.000		39,522	2,450					563	35	563	35					
	2098	R80	72	0.059	1.000		39,522	2,332					918	54	918	54					
	2099	R81	73	0.057	1.000		39,522	2,253					918	52	918	52					
	2100	R82	74	0.055	1.000		39,522	2,174					1,007	55	1,007	55					
	2101	R83	75	0.053	1.000		39,522	2,095					918	49	918	49					
	2102	R84	76	0.051	1.000		39,522	2,016					982	50	982	50					
	2103	R85	77	0.049	1.000		39,522	1,937					385	19	385	19					
	2104	R86	78	0.047	1.000		39,522	1,858					385	18	385	18					
	2105	R87	79	0.045	1.000		39,522	1,778					385	17	385	17					
	2106	R88	80	0.043	1.000		39,522	1,699					385	17	385	17					
合計						2,871,894	717,994	457	B=718,451	95,891	60,725	32,380	7,143	128,271	C=67,868	B/C=10.6	650,583	193.2%			

残存価値			
項目	工事費	残存価値	備考
構造物	54,788.7	237.7	=0.1×（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
構造物以外	4,259.1	184.8	=（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
用地費	789.0	34.2	=（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
合計	59,836.7	457	単位：百万円

費用便益比		
総便益（億円）	B	7,185
便益		7,180
残存価値		5
総費用（億円）	C	679
建設費		607
維持管理費		71
費用便益比	B/C	10.6
純現在価値（億円）	B-C	6,506
経済的内部収益率	EIRR	193.2%

【参考比較：社会的割引率2%】様式-5 費用対便益（全体事業（R9～R38））

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：社会的割引率2%）

水系名：狩野川水系

（単位：百万円）

年次	西暦	年度	t	割引率 2%	デフ レー ター	便益：B			建設費③		費用：C		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR	
						便益①		残存価値 ②	計 (①+②)	費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
						便益	現在価値											
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000													
整備期間 （30年）	2027	R09	1	0.980	1.000		0	0	2,184	2,141	0	0	2,184	2,141				
	2028	R10	2	0.961	1.000		4,260	4,094	2,570	2,470	4	3	2,573	2,473				
	2029	R11	3	0.942	1.000		9,272	8,734	2,570	2,421	7	7	2,577	2,428				
	2030	R12	4	0.924	1.000		14,285	13,199	2,327	2,150	11	10	2,338	2,160				
	2031	R13	5	0.906	1.000		18,824	17,055	2,327	2,109	45	41	2,372	2,150				
	2032	R14	6	0.888	1.000		23,363	20,746	4,839	4,297	49	43	4,887	4,340				
	2033	R15	7	0.871	1.000		24,295	21,161	4,156	3,620	352	306	4,507	3,926				
	2034	R16	8	0.853	1.000		25,095	21,406	4,132	3,525	352	300	4,484	3,825				
	2035	R17	9	0.837	1.000		25,891	21,671	4,084	3,418	352	294	4,436	3,712				
	2036	R18	10	0.820	1.000		26,677	21,875	4,097	3,360	352	289	4,450	3,649				
	2037	R19	11	0.804	1.000		27,466	22,083	6,047	4,862	353	284	6,400	5,146				
	2038	R20	12	0.788	1.000		28,631	22,561	7,916	6,238	353	278	8,269	6,516				
	2039	R21	13	0.773	1.000		30,155	23,310	7,885	6,095	353	273	8,238	6,368				
	2040	R22	14	0.758	1.000		31,674	24,009	7,885	5,977	442	335	8,328	6,312				
	2041	R23	15	0.743	1.000		33,192	24,662	6,340	4,711	353	262	6,693	4,973				
	2042	R24	16	0.728	1.000		34,413	25,053	6,732	4,901	353	257	7,085	5,158				
	2043	R25	17	0.714	1.000		35,709	25,496	6,986	4,988	353	252	7,339	5,240				
	2044	R26	18	0.700	1.000		37,055	25,939	2,978	2,085	353	247	3,332	2,332				
	2045	R27	19	0.686	1.000		37,628	25,813	2,292	1,572	353	242	2,645	1,814				
	2046	R28	20	0.673	1.000		38,069	25,620			798	537	238	1,151	775			
	2047	R29	21	0.660	1.000		38,223	25,227	1,023	675	465	307	1,488	982				
	2048	R30	22	0.647	1.000		38,420	24,858	1,023	662	293	190	1,316	852				
	2049	R31	23	0.634	1.000		38,617	24,483	1,023	649	287	182	1,310	831				
	2050	R32	24	0.622	1.000		38,814	24,142	1,023	637	376	234	1,399	871				
	2051	R33	25	0.610	1.000		39,011	23,797	1,023	624	163	100	1,187	724				
	2052	R34	26	0.598	1.000		39,208	23,446	385	230	278	166	663	396				
	2053	R35	27	0.586	1.000		39,283	23,020	385	226	278	163	663	389				
	2054	R36	28	0.574	1.000		39,357	22,591	385	221	278	160	663	381				
	2055	R37	29	0.563	1.000		39,431	22,200	236	133	278	157	514	290				
	2056	R38	30	0.552	1.000		39,476	21,791	236	130	278	153	514	283				
施設完成後の 評価期間 （50年）	2057	R39	31	0.541	1.000		39,522	21,381			52	28	52	28				
	2058	R40	32	0.531	1.000		39,522	20,986			52	27	52	27				
	2059	R41	33	0.520	1.000		39,522	20,551			52	27	52	27				
	2060	R42	34	0.510	1.000		39,522	20,156				141	72	141	72			
	2061	R43	35	0.500	1.000		39,522	19,761				52	26	52	26			
	2062	R44	36	0.490	1.000		39,522	19,366				52	25	52	25			
	2063	R45	37	0.481	1.000		39,522	19,010				563	271	563	271			
	2064	R46	38	0.471	1.000		39,522	18,615				563	265	563	265			
	2065	R47	39	0.462	1.000		39,522	18,259				563	260	563	260			
	2066	R48	40	0.453	1.000		39,522	17,903				563	255	563	255			
	2067	R49	41	0.444	1.000		39,522	17,548				563	250	563	250			
	2068	R50	42	0.435	1.000		39,522	17,192				918	399	918	399			
	2069	R51	43	0.427	1.000		39,522	16,876				918	392	918	392			
	2070	R52	44	0.418	1.000		39,522	16,520				1,007	421	1,007	421			
	2071	R53	45	0.410	1.000		39,522	16,204				918	376	918	376			
	2072	R54	46	0.402	1.000		39,522	15,888				982	395	982	395			
	2073	R55	47	0.394	1.000		39,522	15,572				385	152	385	152			
	2074	R56	48	0.387	1.000		39,522	15,295				385	149	385	149			
	2075	R57	49	0.379	1.000		39,522	14,979				385	146	385	146			
	2076	R58	50	0.372	1.000		39,522	14,702				385	143	385	143			
	2077	R59	51	0.364	1.000		39,522	14,386				564	205	564	205			
	2078	R60	52	0.357	1.000		39,522	14,109				392	140	392	140			
	2079	R61	53	0.350	1.000		39,522	13,833				385	135	385	135			
	2080	R62	54	0.343	1.000		39,522	13,556				474	163	474	163			
	2081	R63	55	0.337	1.000		39,522	13,319				261	88	261	88			
	2082	R64	56	0.330	1.000		39,522	13,042				721	238	721	238			
	2083	R65	57	0.323	1.000		39,522	12,766				721	233	721	233			
	2084	R66	58	0.317	1.000		39,522	12,528				721	229	721	229			
	2085	R67	59	0.311	1.000		39,522	12,291				515	160	515	160			
	2086	R68	60	0.305	1.000		39,522	12,054				515	157	515	157			
	2087	R69	61	0.299	1.000		39,522	11,817				52	15	52	15			
	2088	R70	62	0.293	1.000		39,522	11,580				52	15	52	15			
	2089	R71	63	0.287	1.000		39,522	11,343				52	15	52	15			
	2090	R72	64	0.282	1.000		39,522	11,145				141	40	141	40			
	2091	R73	65	0.276	1.000		39,522	10,908				52	14	52	14			
	2092	R74	66	0.271	1.000		39,522	10,710				52	14	52	14			
	2093	R75	67	0.265	1.000		39,522	10,473				563	149	563	149			
	2094	R76	68	0.260	1.000		39,522	10,276				563	146	563	146			
	2095	R77	69	0.255	1.000		39,522	10,078				563	144	563	144			
	2096	R78	70	0.250	1.000		39,522	9,881				563	141	563	141			
	2097	R79	71	0.245	1.000		39,522	9,683				563	138	563	138			
	2098	R80	72	0.240	1.000		39,522	9,485				918	220	918	220			
	2099	R81	73	0.236	1.000		39,522	9,327				918	217	918	217			
	2100	R82	74	0.231	1.000		39,522	9,130				1,007	233	1,007	233			
	2101	R83	75	0.226	1.000		39,522	8,932				918	207	918	207			
	2102	R84	76	0.222	1.000		39,522	8,774				982	218	982	218			
	2103	R85	77	0.218	1.000		39,522	8,616				385	84	385	84			
	2104	R86	78	0.213	1.000		39,522	8,418				385	82	385	82			
	2105	R87	79	0.209	1.000		39,522	8,260				385	81	385	81			
	2106	R88	80	0.205	1.000		39,522	8,102				385	79	385	79			
合計						2,871,894	1,315,628	2,159	B=1,317,787	95,891	75,664	32,380	13,852	128,271	C=89,516	B/C=14.7	1,228,271	193.2%

残存価値			
項目	工事費	残存価値	備考
構造物	54,788.7	1,123.8	=0.1×（工事費）/（1+0.02） ⁸⁰
構造物以外	4,259.1	873.6	=（工事費）/（1+0.02） ⁸⁰
用地費	789.0	161.8	=（工事費）/（1+0.02） ⁸⁰
合計	59,836.7	2,159	単位：百万円

費用便益比		
総便益（億円）	B	13.17
便益		13.15
残存価値		2
総費用（億円）	C	89
建設費		75
維持管理費		13
費用便益比	B/C	14
純現在価値（億円）	B-C	12.28
経済的内部收益率	FIDP	102.2

【参考比較：社会的割引率1%】様式-5 費用対便益（全体事業（R9～R38））

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：社会的割引率1%）

水系名：狩野川水系

（単位：百万円）

年次	西暦	年度	t	割引率 1%	デフ レー ター	便益：B			建設費③		費用：C		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR	
						便益①		残存価値 (②)	計 (①+②)	費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
						便益	現在価値								費用	現在価値		
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000													
整備期間（30年）	2027	R09	1	0.990	1.000	0	0		2,184	2,162	0	0	2,184	2,162				
	2028	R10	2	0.980	1.000	4,260	4,175		2,570	2,518	4	3	2,573	2,521				
	2029	R11	3	0.971	1.000	9,272	9,003		2,570	2,495	7	7	2,577	2,502				
	2030	R12	4	0.961	1.000	14,285	13,728		2,327	2,237	11	10	2,338	2,247				
	2031	R13	5	0.951	1.000	18,824	17,902		2,327	2,213	45	43	2,372	2,256				
	2032	R14	6	0.942	1.000	23,363	22,008		4,839	4,558	49	46	4,887	4,604				
	2033	R15	7	0.933	1.000	24,295	22,667		4,156	3,877	352	328	4,507	4,205				
	2034	R16	8	0.923	1.000	25,095	23,163		4,132	3,814	352	325	4,484	4,139				
	2035	R17	9	0.914	1.000	25,891	23,664		4,084	3,733	352	322	4,436	4,055				
	2036	R18	10	0.905	1.000	26,677	24,143		4,097	3,708	352	319	4,450	4,027				
	2037	R19	11	0.896	1.000	27,466	24,610		6,047	5,418	353	316	6,400	5,734				
	2038	R20	12	0.887	1.000	28,631	25,396		7,916	7,022	353	313	8,269	7,335				
	2039	R21	13	0.879	1.000	30,155	26,506		7,885	6,931	353	310	8,238	7,241				
	2040	R22	14	0.870	1.000	31,674	27,556		7,885	6,860	442	385	8,328	7,245				
	2041	R23	15	0.861	1.000	33,192	28,578		6,340	5,459	353	304	6,693	5,763				
	2042	R24	16	0.853	1.000	34,413	29,354		6,732	5,743	353	301	7,085	6,044				
	2043	R25	17	0.844	1.000	35,709	30,138		6,986	5,896	353	298	7,339	6,194				
	2044	R26	18	0.836	1.000	37,055	30,978		2,978	2,490	353	295	3,332	2,785				
	2045	R27	19	0.828	1.000	37,628	31,156		2,292	1,898	353	292	2,645	2,190				
	2046	R28	20	0.820	1.000	38,069	31,217				798	654	353	290	1,151	944		
	2047	R29	21	0.811	1.000	38,223	30,999			1,023	830	465	377	1,488	1,207			
	2048	R30	22	0.803	1.000	38,420	30,851			1,023	822	293	235	1,316	1,057			
	2049	R31	23	0.795	1.000	38,617	30,701			1,023	814	287	228	1,310	1,042			
	2050	R32	24	0.788	1.000	38,814	30,585			1,023	806	376	296	1,399	1,102			
	2051	R33	25	0.780	1.000	39,011	30,429			1,023	798	163	127	1,187	925			
	2052	R34	26	0.772	1.000	39,208	30,269			385	297	278	215	663	512			
	2053	R35	27	0.764	1.000	39,283	30,012			385	294	278	212	663	506			
	2054	R36	28	0.757	1.000	39,357	29,793			385	292	278	210	663	502			
	2055	R37	29	0.749	1.000	39,431	29,534			236	177	278	208	514	385			
	2056	R38	30	0.742	1.000	39,476	29,291			236	175	278	206	514	381			
施設完成後の評価期間（50年）	2057	R39	31	0.735	1.000	39,522	29,049					52	38	52	38			
	2058	R40	32	0.727	1.000	39,522	28,732					52	38	52	38			
	2059	R41	33	0.720	1.000	39,522	28,456					52	37	52	37			
	2060	R42	34	0.713	1.000	39,522	28,179					141	100	141	100			
	2061	R43	35	0.706	1.000	39,522	27,903					52	37	52	37			
	2062	R44	36	0.699	1.000	39,522	27,626					52	36	52	36			
	2063	R45	37	0.692	1.000	39,522	27,349					563	390	563	390			
	2064	R46	38	0.685	1.000	39,522	27,073					563	386	563	386			
	2065	R47	39	0.678	1.000	39,522	26,796					563	382	563	382			
	2066	R48	40	0.672	1.000	39,522	26,559					563	378	563	378			
	2067	R49	41	0.665	1.000	39,522	26,282					563	374	563	374			
	2068	R50	42	0.658	1.000	39,522	26,005					918	604	918	604			
	2069	R51	43	0.652	1.000	39,522	25,768					918	598	918	598			
	2070	R52	44	0.645	1.000	39,522	25,492					1,007	649	1,007	649			
	2071	R53	45	0.639	1.000	39,522	25,255					918	586	918	586			
	2072	R54	46	0.633	1.000	39,522	25,017					982	622	982	622			
	2073	R55	47	0.626	1.000	39,522	24,741					385	241	385	241			
	2074	R56	48	0.620	1.000	39,522	24,504					385	239	385	239			
	2075	R57	49	0.614	1.000	39,522	24,267					385	237	385	237			
	2076	R58	50	0.608	1.000	39,522	24,029					385	234	385	234			
	2077	R59	51	0.602	1.000	39,522	23,792					564	340	564	340			
	2078	R60	52	0.596	1.000	39,522	23,555					392	234	392	234			
	2079	R61	53	0.590	1.000	39,522	23,318					385	227	385	227			
	2080	R62	54	0.584	1.000	39,522	23,081					474	277	474	277			
	2081	R63	55	0.579	1.000	39,522	22,883					261	151	261	151			
	2082	R64	56	0.573	1.000	39,522	22,646					721	413	721	413			
	2083	R65	57	0.567	1.000	39,522	22,409					721	409	721	409			
	2084	R66	58	0.562	1.000	39,522	22,211					721	405	721	405			
	2085	R67	59	0.556	1.000	39,522	21,974					515	286	515	286			
	2086	R68	60	0.550	1.000	39,522	21,737					515	283	515	283			
	2087	R69	61	0.545	1.000	39,522	21,539					52	28	52	28			
	2088	R70	62	0.540	1.000	39,522	21,342					52	28	52	28			
	2089	R71	63	0.534	1.000	39,522	21,105					52	28	52	28			
	2090	R72	64	0.529	1.000	39,522	20,907					141	74	141	74			
	2091	R73	65	0.524	1.000	39,522	20,710					52	27	52	27			
	2092	R74	66	0.519	1.000	39,522	20,512					52	27	52	27			
	2093	R75	67	0.513	1.000	39,522	20,275					563	289	563	289			
	2094	R76	68	0.508	1.000	39,522	20,077					563	286	563	286			
	2095	R77	69	0.503	1.000	39,522	19,880					563	283	563	283			
	2096	R78	70	0.498	1.000	39,522	19,682					563	280	563	280			
	2097	R79	71	0.493	1.000	39,522	19,484					563	278	563	278			
	2098	R80	72	0.488	1.000	39,522	19,287					918	448	918	448			
	2099	R81	73	0.484	1.000	39,522	19,129					918	444	918	444			
	2100	R82	74	0.479	1.000	39,522	18,931					1,007	482	1,007	482			
	2101	R83	75	0.474	1.000	39,522	18,733					918	435	918	435			
	2102	R84	76	0.469	1.000	39,522	18,536					982	461	982	461			
	2103	R85	77	0.465	1.000	39,522	18,378					385	179	385	179			
	2104	R86	78	0.460	1.000	39,522	18,180					385	177	385	177			
	2105	R87	79	0.456	1.000	39,522	18,022					385	176	385	176			
	2106	R88	80	0.451	1.000	39,522	17,824					385	174	385	174			
合計						2,871,894	1,897,627	4,749	B=1,902,376	95,891	84,991	32,380	20,656	128,271	C=105,647	B/C=18.0	1,796,729	193.2%

残存価値			
項目	工事費	残存価値	備考
構造物	54,788.7	2,471.6	=0.1×（工事費）/（1+0.01） ⁸⁰
構造物以外	4,259.1	1,921.3	=（工事費）/（1+0.01） ⁸⁰
用地費	789.0	355.9	=（工事費）

【感度分析】様式-5 費用対便益（全体事業：残事業費+10%）

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：残事業費+10%）

水系名：狩野川水系

（単位：百万円）

表式-5					費用対便益（事業事業：残事業費7.0%）					事業名：行野川水系										
年次	西暦	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益：B			計 (①+②)	建設費③		維持管理費④		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR		
						便益①	現在価値 ②	費用		現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値						
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000															
整備期間 （30年）	2027	R09	1	0.962	1.000	0	0			2,403	2,311	0	0	2,403	2,311					
	2028	R10	2	0.925	1.000	4,260	3,941			2,827	2,615	4	3	2,830	2,618					
	2029	R11	3	0.889	1.000	9,272	8,243			2,827	2,513	7	6	2,834	2,519					
	2030	R12	4	0.855	1.000	14,285	12,214			2,560	2,189	11	9	2,571	2,198					
	2031	R13	5	0.822	1.000	18,824	15,473			2,560	2,104	45	37	2,605	2,141					
	2032	R14	6	0.790	1.000	23,363	18,457			5,322	4,205	49	38	5,371	4,243					
	2033	R15	7	0.760	1.000	24,295	18,464			4,572	3,474	352	267	4,923	3,741					
	2034	R16	8	0.731	1.000	25,095	18,344			4,545	3,322	352	257	4,897	3,579					
	2035	R17	9	0.703	1.000	25,891	18,201			4,492	3,158	352	247	4,844	3,405					
	2036	R18	10	0.676	1.000	26,677	18,034			4,507	3,047	352	238	4,859	3,285					
	2037	R19	11	0.650	1.000	27,466	17,853			6,651	4,323	353	229	7,004	4,552					
	2038	R20	12	0.625	1.000	28,631	17,894			8,708	5,442	353	221	9,061	5,663					
	2039	R21	13	0.601	1.000	30,155	18,123			8,674	5,213	353	212	9,027	5,425					
	2040	R22	14	0.577	1.000	31,674	18,276			8,674	5,005	442	255	9,116	5,260					
	2041	R23	15	0.555	1.000	33,192	18,422			6,974	3,871	353	196	7,327	4,067					
	2042	R24	16	0.534	1.000	34,413	18,377			7,406	3,955	353	189	7,759	4,144					
	2043	R25	17	0.513	1.000	35,709	18,319			7,684	3,942	353	181	8,038	4,123					
	2044	R26	18	0.494	1.000	37,055	18,305			3,276	1,618	353	174	3,629	1,792					
	2045	R27	19	0.475	1.000	37,628	17,873			2,521	1,198	353	168	2,874	1,366					
	2046	R28	20	0.456	1.000	38,069	17,359			878	400	353	161	1,231	561					
	2047	R29	21	0.439	1.000	38,223	16,780			1,126	494	465	204	1,591	698					
	2048	R30	22	0.422	1.000	38,420	16,213			1,126	475	293	124	1,419	599					
	2049	R31	23	0.406	1.000	38,617	15,679			1,126	457	287	116	1,412	573					
	2050	R32	24	0.390	1.000	38,814	15,137			1,126	439	376	147	1,502	586					
	2051	R33	25	0.375	1.000	39,011	14,629			1,126	422	163	61	1,289	483					
	2052	R34	26	0.361	1.000	39,208	14,154			424	153	278	100	702	253					
	2053	R35	27	0.347	1.000	39,283	13,631			424	147	278	96	702	243					
	2054	R36	28	0.333	1.000	39,357	13,106			424	141	278	93	702	234					
	2055	R37	29	0.321	1.000	39,431	12,657			260	83	278	89	538	172					
	2056	R38	30	0.308	1.000	39,476	12,159			260	80	278	86	538	166					
施設完成後の 評価期間 （50年）	2057	R39	31	0.296	1.000	39,522	11,699					52	15	52	15					
	2058	R40	32	0.285	1.000	39,522	11,264					52	15	52	15					
	2059	R41	33	0.274	1.000	39,522	10,829					52	14	52	14					
	2060	R42	34	0.264	1.000	39,522	10,434					141	37	141	37					
	2061	R43	35	0.253	1.000	39,522	9,999					52	13	52	13					
	2062	R44	36	0.244	1.000	39,522	9,643					52	13	52	13					
	2063	R45	37	0.234	1.000	39,522	9,248					563	132	563	132					
	2064	R46	38	0.225	1.000	39,522	8,892					563	127	563	127					
	2065	R47	39	0.217	1.000	39,522	8,576					563	122	563	122					
	2066	R48	40	0.208	1.000	39,522	8,221					563	117	563	117					
	2067	R49	41	0.200	1.000	39,522	7,904					563	113	563	113					
	2068	R50	42	0.193	1.000	39,522	7,628					918	177	918	177					
	2069	R51	43	0.185	1.000	39,522	7,312					918	170	918	170					
	2070	R52	44	0.178	1.000	39,522	7,035				1,007	179	1,007	179	179					
	2071	R53	45	0.171	1.000	39,522	6,758					918	157	918	157					
	2072	R54	46	0.165	1.000	39,522	6,521					982	162	982	162					
	2073	R55	47	0.158	1.000	39,522	6,244					385	61	385	61					
	2074	R56	48	0.152	1.000	39,522	6,007					385	59	385	59					
	2075	R57	49	0.146	1.000	39,522	5,770					385	56	385	56					
	2076	R58	50	0.141	1.000	39,522	5,573					385	54	385	54					
	2077	R59	51	0.135	1.000	39,522	5,335					564	76	564	76					
	2078	R60	52	0.130	1.000	39,522	5,138					392	51	392	51					
	2079	R61	53	0.125	1.000	39,522	4,940					385	48	385	48					
	2080	R62	54	0.120	1.000	39,522	4,743					474	57	474	57					
	2081	R63	55	0.116	1.000	39,522	4,585					261	30	261	30					
	2082	R64	56	0.111	1.000	39,522	4,387					721	80	721	80					
	2083	R65	57	0.107	1.000	39,522	4,229					721	77	721	77					
	2084	R66	58	0.103	1.000	39,522	4,071					721	74	721	74					
	2085	R67	59	0.099	1.000	39,522	3,913					515	51	515	51					
	2086	R68	60	0.095	1.000	39,522	3,755					515	49	515	49					
	2087	R69	61	0.091	1.000	39,522	3,597					52	5	52	5					
	2088	R70	62	0.088	1.000	39,522	3,478					52	5	52	5					
	2089	R71	63	0.085	1.000	39,522	3,359					52	4	52	4					
	2090	R72	64	0.081	1.000	39,522	3,201					141	11	141	11					
	2091	R73	65	0.078	1.000	39,522	3,083					52	4	52	4					
	2092	R74	66	0.075	1.000	39,522	2,964					52	4	52	4					
	2093	R75	67	0.072	1.000	39,522	2,846					563	41	563	41					
	2094	R76	68	0.069	1.000	39,522	2,727					563	39	563	39					
	2095	R77	69	0.067	1.000	39,522	2,648					563	38	563	38					
	2096	R78	70	0.064	1.000	39,522	2,529					563	36	563	36					
	2097	R79	71	0.062	1.000	39,522	2,450					563	35	563	35					
	2098	R80	72	0.059	1.000	39,522	2,332					918	54	918	54					
	2099	R81	73	0.057	1.000	39,522	2,253					918	52	918	52					
	2100	R82	74	0.055	1.000	39,522	2,174					1,007	55	1,007	55					
	2101	R83	75	0.053	1.000	39,522	2,095					918	49	918	49					
	2102	R84	76	0.051	1.000	39,522	2,016					982	50	982	50					
	2103	R85	77	0.049	1.000	39,522	1,937					385	19	385	19					
	2104	R86	78	0.047	1.000	39,522	1,858					385	18	385	18					
	2105	R87	79	0.045	1.000	39,522	1,778					385	17	385	17					
	2106	R88	80	0.043	1.000	39,522	1,699					385	17	385	17					
合計						2,871,894	717,994	502	B=718,496	105,481	66,796	32,380	7,143	137,860	C=73,939	B/C=9.7	644,557			

残存価値			
項目	工事費	残存価値	備考
構造物	60,267.5	261.5	=0.1×（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
構造物以外	4,685.0	203.3	=（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
用地費	867.9	37.7	=（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
合計	65,820.4	502	単位：百万円

費用便益比	
総便益（億円）	B
便益	7,185
残存価値	5
総費用（億円）	C
建設費	668
維持管理費	71
費用便益比	B/C
純現在価値（億円）	B-C
	6,446

【感度分析】様式-5 費用対便益（全体事業：残事業費-10%）

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：残事業費-10%）

水系名：狩野川水系

（単位：百万円）

年次	西暦	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益：B			費用：C		費用：C		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR			
						便益①		残存価値 ②	計 (①+②)	建設費③		維持管理費④				計③+④		
						便益	現在価値			費用	現在価値	費用				現在価値	費用	現在価値
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000													
整備期間（30年）	2027	R09	1	0.962	1.000	0	0			1.966	1.891	0	0	1.966	1.891			
	2028	R10	2	0.925	1.000	4.260	3.941			2.313	2.139	4	3	2.316	2.142			
	2029	R11	3	0.889	1.000	9.272	8.243			2.313	2.056	7	6	2.320	2.062			
	2030	R12	4	0.855	1.000	14.285	12.214			2.095	1.791	11	9	2.105	1.800			
	2031	R13	5	0.822	1.000	18.824	15.473			2.095	1.722	45	37	2.140	1.759			
	2032	R14	6	0.790	1.000	23.363	18.457			4.355	3.440	49	38	4.403	3.478			
	2033	R15	7	0.760	1.000	24.295	18.464			3.740	2.843	352	267	4.092	3.110			
	2034	R16	8	0.731	1.000	25.095	18.344			3.719	2.718	352	257	4.070	2.975			
	2035	R17	9	0.703	1.000	25.891	18.201			3.676	2.584	352	247	4.027	2.831			
	2036	R18	10	0.676	1.000	26.677	18.034			3.688	2.493	352	238	4.040	2.731			
	2037	R19	11	0.650	1.000	27.466	17.853			5.442	3.537	353	229	5.795	3.766			
	2038	R20	12	0.625	1.000	28.631	17.894			7.125	4.453	353	221	7.478	4.674			
	2039	R21	13	0.601	1.000	30.155	18.123			7.097	4.265	353	212	7.450	4.477			
	2040	R22	14	0.577	1.000	31.674	18.276			7.097	4.095	442	255	7.539	4.350			
	2041	R23	15	0.555	1.000	33.192	18.422			5.706	3.167	353	196	6.059	3.363			
	2042	R24	16	0.534	1.000	34.413	18.377			6.059	3.236	353	189	6.412	3.425			
	2043	R25	17	0.513	1.000	35.709	18.319			6.287	3.225	353	181	6.640	3.406			
	2044	R26	18	0.494	1.000	37.055	18.305			2.681	1.324	353	174	3.034	1.498			
	2045	R27	19	0.475	1.000	37.628	17.873			2.063	980	353	168	2.416	1.148			
	2046	R28	20	0.456	1.000	38.069	17.359			718	327	353	161	1.071	488			
	2047	R29	21	0.439	1.000	38.223	16.780			921	404	465	204	1.386	608			
	2048	R30	22	0.422	1.000	38.420	16.213			921	389	293	124	1.214	513			
	2049	R31	23	0.406	1.000	38.617	15.679			921	374	287	116	1.208	490			
	2050	R32	24	0.390	1.000	38.814	15.137			921	359	376	147	1.297	506			
	2051	R33	25	0.375	1.000	39.011	14.629			921	345	163	61	1.084	406			
	2052	R34	26	0.361	1.000	39.208	14.154			347	125	278	100	625	225			
	2053	R35	27	0.347	1.000	39.283	13.631			347	120	278	96	625	216			
	2054	R36	28	0.333	1.000	39.357	13.106			347	115	278	93	625	208			
	2055	R37	29	0.321	1.000	39.431	12.657			213	68	278	89	491	157			
	2056	R38	30	0.308	1.000	39.476	12.159			213	66	278	86	491	152			
	施設完成後の評価期間（50年）	2057	R39	31	0.296	1.000	39.522	11.699					52	15	52	15		
2058		R40	32	0.285	1.000	39.522	11.264					52	15	52	15			
2059		R41	33	0.274	1.000	39.522	10.829					52	14	52	14			
2060		R42	34	0.264	1.000	39.522	10.434					141	37	141	37			
2061		R43	35	0.253	1.000	39.522	9.999					52	13	52	13			
2062		R44	36	0.244	1.000	39.522	9.643					52	13	52	13			
2063		R45	37	0.234	1.000	39.522	9.248					563	132	563	132			
2064		R46	38	0.225	1.000	39.522	8.892					563	127	563	127			
2065		R47	39	0.217	1.000	39.522	8.576					563	122	563	122			
2066		R48	40	0.208	1.000	39.522	8.221					563	117	563	117			
2067		R49	41	0.200	1.000	39.522	7.904					563	113	563	113			
2068		R50	42	0.193	1.000	39.522	7.628					918	177	918	177			
2069		R51	43	0.185	1.000	39.522	7.312					918	170	918	170			
2070		R52	44	0.178	1.000	39.522	7.035					1,007	179	1,007	179			
2071		R53	45	0.171	1.000	39.522	6.758					918	157	918	157			
2072		R54	46	0.165	1.000	39.522	6.521					982	162	982	162			
2073		R55	47	0.158	1.000	39.522	6.244					385	61	385	61			
2074		R56	48	0.152	1.000	39.522	6.007					385	59	385	59			
2075		R57	49	0.146	1.000	39.522	5.770					385	56	385	56			
2076		R58	50	0.141	1.000	39.522	5.573					385	54	385	54			
2077		R59	51	0.135	1.000	39.522	5.335					564	76	564	76			
2078		R60	52	0.130	1.000	39.522	5.138					392	51	392	51			
2079		R61	53	0.125	1.000	39.522	4.940					385	48	385	48			
2080		R62	54	0.120	1.000	39.522	4.743					474	57	474	57			
2081		R63	55	0.116	1.000	39.522	4.585					261	30	261	30			
2082		R64	56	0.111	1.000	39.522	4.387					721	80	721	80			
2083		R65	57	0.107	1.000	39.522	4.229					721	77	721	77			
2084		R66	58	0.103	1.000	39.522	4.071					721	74	721	74			
2085		R67	59	0.099	1.000	39.522	3.913					515	51	515	51			
2086		R68	60	0.095	1.000	39.522	3.755					515	49	515	49			
2087		R69	61	0.091	1.000	39.522	3.597					52	5	52	5			
2088		R70	62	0.088	1.000	39.522	3.478					52	5	52	5			
2089		R71	63	0.085	1.000	39.522	3.359					52	4	52	4			
2090		R72	64	0.081	1.000	39.522	3.201					141	11	141	11			
2091		R73	65	0.078	1.000	39.522	3.083					52	4	52	4			
2092		R74	66	0.075	1.000	39.522	2.964					52	4	52	4			
2093		R75	67	0.072	1.000	39.522	2.846					563	41	563	41			
2094		R76	68	0.069	1.000	39.522	2.727					563	39	563	39			
2095		R77	69	0.067	1.000	39.522	2.648					563	38	563	38			
2096		R78	70	0.064	1.000	39.522	2.529					563	36	563	36			
2097		R79	71	0.062	1.000	39.522	2.450					563	35	563	35			
2098		R80	72	0.059	1.000	39.522	2.332					918	54	918	54			
2099		R81	73	0.057	1.000	39.522	2.253					918	52	918	52			
2100		R82	74	0.055	1.000	39.522	2.174					1,007	55	1,007	55			
2101		R83	75	0.053	1.000	39.522	2.095					918	49	918	49			
2102		R84	76	0.051	1.000	39.522	2.016					982	50	982	50			
2103		R85	77	0.049	1.000	39.522	1.937					385	19	385	19			
2104		R86	78	0.047	1.000	39.522	1.858					385	18	385	18			
2105		R87	79	0.045	1.000	39.522	1.778					385	17	385	17			
2106		R88	80	0.043	1.000	39.522	1.699					385	17	385	17			
合計						2,871,894	717,994	411	B=718,405	86,302	54,651	32,380	7,143	118,682	C=61,794	B/C=11.6	656,611	

残存価値			
項目	工事費	残存価値	備考
構造物	49,309.8	213.9	=0.1×（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
構造物以外	3,833.2	166.3	=（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
用地費	710.1	30.8	=（工事費）/（1+0.04） ⁸⁰
合計	53,853.1	411	単位：百万円

費用便益比		
総便益（億円）	B	7,184
便益		7,180
残存価値		4
総費用（億円）	C	618
建設費		547
維持管理費		71
費用便益比	B/C	11.6
純現在価値（億円）	B-C	6,566

【感度分析】様式-5 費用対便益（全体事業：残工期-10%）

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：残工期-10%）

水系名：狩野川水系

（単位：百万円）

年次	西暦	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益：B			計 (①+②)	建設費③		費用：C		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR	
						便益①		残存価値 (②)		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
						便益	現在価値												
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000														
整備 期間 （27年）	2027	R09	1	0.962	1.000		0			2,470	2,376		0		2,470	2,376			
	2028	R10	2	0.925	1.000		3,934	3,639		2,855	2,641		5	4	2,860	2,645			
	2029	R11	3	0.889	1.000		8,483	7,541		2,775	2,467		9	8	2,784	2,475			
	2030	R12	4	0.855	1.000		12,902	11,031		2,586	2,211		27	23	2,613	2,234			
	2031	R13	5	0.822	1.000		17,022	13,992		3,981	3,272		52	43	4,033	3,315			
	2032	R14	6	0.790	1.000		23,363	18,457		4,921	3,888		256	202	5,177	4,090			
	2033	R15	7	0.760	1.000		24,342	18,500		4,599	3,495		391	297	4,990	3,792			
	2034	R16	8	0.731	1.000		25,257	18,463		4,548	3,325		391	286	4,939	3,611			
	2035	R17	9	0.703	1.000		26,162	18,392		4,551	3,199		391	275	4,943	3,474			
	2036	R18	10	0.676	1.000		27,067	18,297		6,926	4,682		392	265	7,318	4,947			
	2037	R19	11	0.650	1.000		28,445	18,489		8,789	5,713		392	255	9,181	5,968			
	2038	R20	12	0.625	1.000		30,194	18,871		8,761	5,476		422	264	9,184	5,740			
	2039	R21	13	0.601	1.000		31,937	19,194		8,075	4,853		452	272	8,526	5,125			
	2040	R22	14	0.577	1.000		33,543	19,354		7,262	4,190		392	226	7,655	4,416			
	2041	R23	15	0.555	1.000		34,988	19,418		7,649	4,245		392	218	8,042	4,463			
	2042	R24	16	0.534	1.000		36,510	19,496		4,645	2,481		392	210	5,038	2,691			
	2043	R25	17	0.513	1.000		37,434	19,204		2,699	1,385		392	201	3,092	1,586			
	2044	R26	18	0.494	1.000		37,971	18,758		1,053	520		392	194	1,445	714			
	2045	R27	19	0.475	1.000		38,180	18,136		1,137	540		498	236	1,635	776			
	2046	R28	20	0.456	1.000		38,406	17,513		1,137	518		324	148	1,461	666			
	2047	R29	21	0.439	1.000		38,633	16,960		1,137	499		348	153	1,485	652			
	2048	R30	22	0.422	1.000		38,859	16,398		1,137	480		323	136	1,460	616			
	2049	R31	23	0.406	1.000		39,085	15,869		783	318		245	100	1,028	418			
	2050	R32	24	0.390	1.000		39,241	15,304		428	167		309	120	737	287			
	2051	R33	25	0.375	1.000		39,326	14,747		428	161		309	116	737	277			
	2052	R34	26	0.361	1.000		39,411	14,227		296	107		309	112	605	219			
	2053	R35	27	0.347	1.000		39,470	13,696		263	91		309	107	571	198			
施設 完成 後の 評価 期間 （50年）	2054	R36	28	0.333	1.000		39,522	13,161					52	17	52	17			
	2055	R37	29	0.321	1.000		39,522	12,687					52	17	52	17			
	2056	R38	30	0.308	1.000		39,522	12,173					52	16	52	16			
	2057	R39	31	0.296	1.000		39,522	11,699					141	42	141	42			
	2058	R40	32	0.285	1.000		39,522	11,264					52	15	52	15			
	2059	R41	33	0.274	1.000		39,522	10,829					52	14	52	14			
	2060	R42	34	0.264	1.000		39,522	10,434					563	149	563	149			
	2061	R43	35	0.253	1.000		39,522	9,999					563	142	563	142			
	2062	R44	36	0.244	1.000		39,522	9,643					563	137	563	137			
	2063	R45	37	0.234	1.000		39,522	9,248					563	132	563	132			
	2064	R46	38	0.225	1.000		39,522	8,892					563	127	563	127			
	2065	R47	39	0.217	1.000		39,522	8,576					918	199	918	199			
	2066	R48	40	0.208	1.000		39,522	8,221					918	191	918	191			
	2067	R49	41	0.200	1.000		39,522	7,904					1,007	201	1,007	201			
	2068	R50	42	0.193	1.000		39,522	7,628					918	177	918	177			
	2069	R51	43	0.185	1.000		39,522	7,312					982	182	982	182			
	2070	R52	44	0.178	1.000		39,522	7,035					385	69	385	69			
	2071	R53	45	0.171	1.000		39,522	6,758					385	66	385	66			
	2072	R54	46	0.165	1.000		39,522	6,521					385	64	385	64			
	2073	R55	47	0.158	1.000		39,522	6,244					385	61	385	61			
	2074	R56	48	0.152	1.000		39,522	6,007					564	86	564	86			
	2075	R57	49	0.146	1.000		39,522	5,770					392	57	392	57			
	2076	R58	50	0.141	1.000		39,522	5,573					385	54	385	54			
	2077	R59	51	0.135	1.000		39,522	5,335					474	64	474	64			
	2078	R60	52	0.130	1.000		39,522	5,138					261	34	261	34			
	2079	R61	53	0.125	1.000		39,522	4,940					721	90	721	90			
	2080	R62	54	0.120	1.000		39,522	4,743					721	87	721	87			
	2081	R63	55	0.116	1.000		39,522	4,585					721	84	721	84			
	2082	R64	56	0.111	1.000		39,522	4,387					515	57	515	57			
	2083	R65	57	0.107	1.000		39,522	4,229					515	55	515	55			
	2084	R66	58	0.103	1.000		39,522	4,071					52	5	52	5			
	2085	R67	59	0.099	1.000		39,522	3,913					52	5	52	5			
	2086	R68	60	0.095	1.000		39,522	3,755					52	5	52	5			
	2087	R69	61	0.091	1.000		39,522	3,597					141	13	141	13			
	2088	R70	62	0.088	1.000		39,522	3,478					52	5	52	5			
	2089	R71	63	0.085	1.000		39,522	3,359					52	4	52	4			
	2090	R72	64	0.081	1.000		39,522	3,201					563	46	563	46			
	2091	R73	65	0.078	1.000		39,522	3,083					563	44	563	44			
	2092	R74	66	0.075	1.000		39,522	2,964					563	42	563	42			
	2093	R75	67	0.072	1.000		39,522	2,846					563	41	563	41			
	2094	R76	68	0.069	1.000		39,522	2,727					563	39	563	39			
	2095	R77	69	0.067	1.000		39,522	2,648					918	61	918	61			
	2096	R78	70	0.064	1.000		39,522	2,529					918	59	918	59			
	2097	R79	71	0.062	1.000		39,522	2,450					1,007	62	1,007	62			
	2098	R80	72	0.059	1.000		39,522	2,332					918	54	918	54			
	2099	R81	73	0.057	1.000		39,522	2,253					982	56	982	56			
	2100	R82	74	0.055	1.000		39,522	2,174					385	21	385	21			
	2101	R83	75	0.053	1.000		39,522	2,095					385	20	385	20			
	2102	R84	76	0.051	1.000		39,522	2,016					385	20	385	20			
	2103	R85	77	0.049	1.000		39,522	1,937					385	19	385	19			
	合計						1	2,766,265	718,309	514	B=718,823	95,891	63,300	32,380	7,778	128,271	C=71,078	B/C=10.1	647,745

残存価値		
項目	工事費	備考
構造物	54,788.7	267.4 = 0.1 × (工事費) / (1+0.04) ¹⁾
構造物以外	4,259.1	207.8 = (工事費) / (1+0.04) ¹⁾
用地費	789.0	38.5 = (工事費) / (1+0.04) ¹⁾
合計	59,836.7	514 単位：百万円

費用便益比	
総便益（億円）	B
便益	7,188
残存価値	5
総費用（億円）	C
建設費	633
維持管理費	78
費用便益比	B/C
純現在価値（億円）	R-C
	6,477

【感度分析】様式-5 費用対便益（全体事業：残工期+10%）

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：残工期+10%）

水系名：狩野川水系

（単位：百万円）

年次	西暦	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益：B			計 (①+②)	建設費③		費用：C		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR
						便益①		残存価値 ②		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
						便益	現在価値											
整備期間 （33年）	2026	R08	0	1.000	1.000													
	2027	R09	1	0.962	1.000		0	0		1,986	1,910	0	0	1,986	1,910			
	2028	R10	2	0.925	1.000		4,248	3,929		2,301	2,129	3	3	2,304	2,132			
	2029	R11	3	0.889	1.000		9,171	8,153		2,336	2,077	6	5	2,342	2,082			
	2030	R12	4	0.855	1.000		14,169	12,114		2,182	1,866	9	7	2,191	1,873			
	2031	R13	5	0.822	1.000		18,837	15,484		2,116	1,739	28	23	2,144	1,762			
	2032	R14	6	0.790	1.000		23,363	18,457		3,257	2,573	42	34	3,300	2,607			
	2033	R15	7	0.760	1.000		23,982	18,226		4,150	3,154	154	117	4,305	3,271			
	2034	R16	8	0.731	1.000		24,772	18,108		3,772	2,757	320	234	4,091	2,991			
	2035	R17	9	0.703	1.000		25,489	17,919		3,748	2,635	320	225	4,067	2,860			
	2036	R18	10	0.676	1.000		26,202	17,713		3,714	2,511	320	216	4,034	2,727			
	2037	R19	11	0.650	1.000		26,908	17,490		3,725	2,421	320	208	4,045	2,629			
	2038	R20	12	0.625	1.000		27,616	17,260		5,497	3,436	321	200	5,818	3,636			
	2039	R21	13	0.601	1.000		28,662	17,226		7,027	4,223	321	193	7,347	4,416			
	2040	R22	14	0.577	1.000		29,998	17,309		7,174	4,139	321	185	7,495	4,324			
	2041	R23	15	0.555	1.000		31,362	17,406		7,168	3,978	378	210	7,546	4,188			
	2042	R24	16	0.534	1.000		32,725	17,475		6,326	3,378	353	189	6,679	3,567			
	2043	R25	17	0.513	1.000		33,928	17,405		5,942	3,048	321	165	6,263	3,213			
	2044	R26	18	0.494	1.000		35,058	17,319		6,212	3,069	321	159	6,533	3,228			
	2045	R27	19	0.475	1.000		36,240	17,214		5,258	2,497	321	152	5,579	2,649			
	2046	R28	20	0.456	1.000		37,240	16,981		2,583	1,178	321	146	2,904	1,324			
	2047	R29	21	0.439	1.000		37,731	16,564		1,948	855	321	141	2,269	996			
	2048	R30	22	0.422	1.000		38,101	16,079		725	306	321	135	1,046	441			
	2049	R31	23	0.406	1.000		38,239	15,525		930	378	423	172	1,353	550			
	2050	R32	24	0.390	1.000		38,416	14,982		930	363	282	110	1,212	473			
	2051	R33	25	0.375	1.000		38,593	14,472		930	349	262	98	1,192	447			
	2052	R34	26	0.361	1.000		38,770	13,996		930	336	318	115	1,248	451			
	2053	R35	27	0.347	1.000		38,947	13,515		930	323	226	78	1,156	401			
	2054	R36	28	0.333	1.000		39,124	13,028		640	213	201	67	841	280			
	2055	R37	29	0.321	1.000		39,246	12,598		350	112	253	81	603	193			
	2056	R38	30	0.308	1.000		39,312	12,108		350	108	253	78	603	186			
	2057	R39	31	0.296	1.000		39,379	11,656		323	96	253	75	576	171			
	2058	R40	32	0.285	1.000		39,440	11,240		215	61	253	72	468	133			
2059	R41	33	0.274	1.000		39,481	10,818		215	59	253	69	468	128				
施設完成後の 評価期間（50年）	2060	R42	34	0.264	1.000		39,522	10,434				52	14	52	14			
	2061	R43	35	0.253	1.000		39,522	9,999				52	13	52	13			
	2062	R44	36	0.244	1.000		39,522	9,643				52	13	52	13			
	2063	R45	37	0.234	1.000		39,522	9,248				141	33	141	33			
	2064	R46	38	0.225	1.000		39,522	8,892				52	12	52	12			
	2065	R47	39	0.217	1.000		39,522	8,576				52	11	52	11			
	2066	R48	40	0.208	1.000		39,522	8,221				563	117	563	117			
	2067	R49	41	0.200	1.000		39,522	7,904				563	113	563	113			
	2068	R50	42	0.193	1.000		39,522	7,628				563	109	563	109			
	2069	R51	43	0.185	1.000		39,522	7,312				563	104	563	104			
	2070	R52	44	0.178	1.000		39,522	7,035				563	100	563	100			
	2071	R53	45	0.171	1.000		39,522	6,758				918	157	918	157			
	2072	R54	46	0.165	1.000		39,522	6,521				918	151	918	151			
	2073	R55	47	0.158	1.000		39,522	6,244				1,007	159	1,007	159			
	2074	R56	48	0.152	1.000		39,522	6,007				918	140	918	140			
	2075	R57	49	0.146	1.000		39,522	5,770				982	143	982	143			
	2076	R58	50	0.141	1.000		39,522	5,573				385	54	385	54			
	2077	R59	51	0.135	1.000		39,522	5,335				385	52	385	52			
	2078	R60	52	0.130	1.000		39,522	5,138				385	50	385	50			
	2079	R61	53	0.125	1.000		39,522	4,940				385	48	385	48			
	2080	R62	54	0.120	1.000		39,522	4,743				564	68	564	68			
	2081	R63	55	0.116	1.000		39,522	4,585				392	45	392	45			
	2082	R64	56	0.111	1.000		39,522	4,387				385	43	385	43			
	2083	R65	57	0.107	1.000		39,522	4,229				474	51	474	51			
	2084	R66	58	0.103	1.000		39,522	4,071				261	27	261	27			
	2085	R67	59	0.099	1.000		39,522	3,913				721	71	721	71			
	2086	R68	60	0.095	1.000		39,522	3,755				721	69	721	69			
	2087	R69	61	0.091	1.000		39,522	3,597				721	66	721	66			
	2088	R70	62	0.088	1.000		39,522	3,478				515	45	515	45			
	2089	R71	63	0.085	1.000		39,522	3,359				515	44	515	44			
	2090	R72	64	0.081	1.000		39,522	3,201				52	4	52	4			
	2091	R73	65	0.078	1.000		39,522	3,083				52	4	52	4			
	2092	R74	66	0.075	1.000		39,522	2,964				52	4	52	4			
	2093	R75	67	0.072	1.000		39,522	2,846				141	10	141	10			
	2094	R76	68	0.069	1.000		39,522	2,727				52	4	52	4			
	2095	R77	69	0.067	1.000		39,522	2,648				52	3	52	3			
	2096	R78	70	0.064	1.000		39,522	2,529				563	36	563	36			
	2097	R79	71	0.062	1.000		39,522	2,450				563	35	563	35			
	2098	R80	72	0.059	1.000		39,522	2,332				563	33	563	33			
	2099	R81	73	0.057	1.000		39,522	2,253				563	32	563	32			
	2100	R82	74	0.055	1.000		39,522	2,174				563	31	563	31			
	2101	R83	75	0.053	1.000		39,522	2,095				918	49	918	49			
	2102	R84	76	0.051	1.000		39,522	2,016				918	47	918	47			
	2103	R85	77	0.049	1.000		39,522	1,937				1,007	49	1,007	49			
	2104	R86	78	0.047	1.000		39,522	1,858				918	43	918	43			
	2105	R87	79	0.045	1.000		39,522	1,778				982	44	982	44			
	2106	R88	80	0.043	1.000		39,522	1,699				385	17	385	17			
	2107	R89	81	0.042	1.000		39,522	1,660				385	16	385	16			
	2108	R90	82	0.040	1.000		39,522	1,581				385	15	385	15			
	2109	R91	83	0.039	1.000		39,522	1,541				385	15	385	15			
合計						2,970,849	712,436	406	B=712,842	95,891	58,277	32,380	6,575	128,271	C=64,852	B/C=11.0	647,990	

残存価値		
項目	工事費	残存価値
構造物	54,788.7	211.3 = 0.1 × (工事費) / (1+0.04) ⁸³
構造物以外	4,259.1	164.3 = (工事費) / (1+0.04) ⁸³
用地費	789.0	30.4 = (工事費) / (1+0.04) ⁸³
合計	59,836.7	406 単位：百万円

費用便益比	
総便益（億円）	B
総費用（億円）	C
費用便益比	B/C
総便益（億円）	7,128
総費用（億円）	649
費用便益比	11.0
総便益（億円）	7,128
総費用（億円）	649
費用便益比	11.0
総便益（億円）	7,128
総費用（億円）	649
費用便益比	11.0

【感度分析】様式-5 費用対便益（全体事業：資産-10%）

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：資産-10%）

水系名：狩野川水系

(単位：百万円)

年次	西暦	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益：B				費用：C				費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR		
						便益①		残存価値 (2)	計 (①+②)	建設費③		維持管理費④					計③+④	
						便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値				費用	現在価値
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000													
整備期間（30年）	2027	R09	1	0.962	1.000	0	0			2,184	2,101	0	0	2,184	2,101			
	2028	R10	2	0.925	1.000	3,859	3,570			2,570	2,377	4	3	2,573	2,380			
	2029	R11	3	0.889	1.000	8,398	7,466			2,570	2,285	7	6	2,577	2,291			
	2030	R12	4	0.855	1.000	12,938	11,062			2,327	1,990	11	9	2,338	1,999			
	2031	R13	5	0.822	1.000	17,050	14,015			2,327	1,913	45	37	2,372	1,950			
	2032	R14	6	0.790	1.000	21,161	16,717			4,839	3,822	49	38	4,887	3,860			
	2033	R15	7	0.760	1.000	22,012	16,729			4,156	3,158	352	267	4,507	3,425			
	2034	R16	8	0.731	1.000	22,743	16,625			4,132	3,020	352	257	4,484	3,277			
	2035	R17	9	0.703	1.000	23,470	16,499			4,084	2,871	352	247	4,436	3,118			
	2036	R18	10	0.676	1.000	24,189	16,352			4,097	2,770	352	238	4,450	3,008			
	2037	R19	11	0.650	1.000	24,910	16,192			6,047	3,930	353	229	6,400	4,159			
	2038	R20	12	0.625	1.000	25,974	16,234			7,916	4,948	353	221	8,269	5,169			
	2039	R21	13	0.601	1.000	27,366	16,447			7,885	4,739	353	212	8,238	4,951			
	2040	R22	14	0.577	1.000	28,754	16,591			7,885	4,550	442	255	8,328	4,805			
	2041	R23	15	0.555	1.000	30,141	16,728			6,340	3,519	353	196	6,693	3,715			
	2042	R24	16	0.534	1.000	31,256	16,691			6,732	3,595	353	189	7,085	3,784			
	2043	R25	17	0.513	1.000	32,441	16,642			6,986	3,584	353	181	7,339	3,765			
	2044	R26	18	0.494	1.000	33,670	16,633			2,978	1,471	353	174	3,332	1,645			
	2045	R27	19	0.475	1.000	34,194	16,242			2,292	1,089	353	168	2,645	1,257			
	2046	R28	20	0.456	1.000	34,597	15,776			798	364	353	161	1,151	525			
	2047	R29	21	0.439	1.000	34,737	15,250			1,023	449	465	204	1,488	653			
	2048	R30	22	0.422	1.000	34,917	14,735			1,023	432	293	124	1,316	556			
	2049	R31	23	0.406	1.000	35,097	14,249			1,023	415	287	116	1,310	531			
	2050	R32	24	0.390	1.000	35,277	13,758			1,023	399	376	147	1,399	546			
	2051	R33	25	0.375	1.000	35,457	13,296			1,023	384	163	61	1,187	445			
	2052	R34	26	0.361	1.000	35,638	12,865			385	139	278	100	663	239			
	2053	R35	27	0.347	1.000	35,705	12,390			385	134	278	96	663	230			
	2054	R36	28	0.333	1.000	35,773	11,912			385	128	278	93	663	221			
	2055	R37	29	0.321	1.000	35,841	11,505			236	76	278	89	514	165			
	2056	R38	30	0.308	1.000	35,882	11,052			236	73	278	86	514	159			
施設完成後の評価期間（50年）	2057	R39	31	0.296	1.000	35,924	10,634					52	15	52	15			
	2058	R40	32	0.285	1.000	35,924	10,238					52	15	52	15			
	2059	R41	33	0.274	1.000	35,924	9,843					52	14	52	14			
	2060	R42	34	0.264	1.000	35,924	9,484					141	37	141	37			
	2061	R43	35	0.253	1.000	35,924	9,089					52	13	52	13			
	2062	R44	36	0.244	1.000	35,924	8,765					52	13	52	13			
	2063	R45	37	0.234	1.000	35,924	8,406					563	132	563	132			
	2064	R46	38	0.225	1.000	35,924	8,083					563	127	563	127			
	2065	R47	39	0.217	1.000	35,924	7,796					563	122	563	122			
	2066	R48	40	0.208	1.000	35,924	7,472					563	117	563	117			
	2067	R49	41	0.200	1.000	35,924	7,185					563	113	563	113			
	2068	R50	42	0.193	1.000	35,924	6,933					918	177	918	177			
	2069	R51	43	0.185	1.000	35,924	6,646					918	170	918	170			
	2070	R52	44	0.178	1.000	35,924	6,394				1,007	179	1,007	179				
	2071	R53	45	0.171	1.000	35,924	6,143					918	157	918	157			
	2072	R54	46	0.165	1.000	35,924	5,927					982	162	982	162			
	2073	R55	47	0.158	1.000	35,924	5,676					385	61	385	61			
	2074	R56	48	0.152	1.000	35,924	5,460					385	59	385	59			
	2075	R57	49	0.146	1.000	35,924	5,245					385	56	385	56			
	2076	R58	50	0.141	1.000	35,924	5,065					385	54	385	54			
	2077	R59	51	0.135	1.000	35,924	4,850					564	76	564	76			
	2078	R60	52	0.130	1.000	35,924	4,670					392	51	392	51			
	2079	R61	53	0.125	1.000	35,924	4,491					385	48	385	48			
	2080	R62	54	0.120	1.000	35,924	4,311					474	57	474	57			
	2081	R63	55	0.116	1.000	35,924	4,167					261	30	261	30			
	2082	R64	56	0.111	1.000	35,924	3,988					721	80	721	80			
	2083	R65	57	0.107	1.000	35,924	3,844					721	77	721	77			
	2084	R66	58	0.103	1.000	35,924	3,700					721	74	721	74			
	2085	R67	59	0.099	1.000	35,924	3,556					515	51	515	51			
	2086	R68	60	0.095	1.000	35,924	3,413					515	49	515	49			
	2087	R69	61	0.091	1.000	35,924	3,269					52	5	52	5			
	2088	R70	62	0.088	1.000	35,924	3,161					52	5	52	5			
	2089	R71	63	0.085	1.000	35,924	3,054					52	4	52	4			
	2090	R72	64	0.081	1.000	35,924	2,910					141	11	141	11			
	2091	R73	65	0.078	1.000	35,924	2,802					52	4	52	4			
	2092	R74	66	0.075	1.000	35,924	2,694					52	4	52	4			
	2093	R75	67	0.072	1.000	35,924	2,587					563	41	563	41			
	2094	R76	68	0.069	1.000	35,924	2,479					563	39	563	39			
	2095	R77	69	0.067	1.000	35,924	2,407					563	38	563	38			
	2096	R78	70	0.064	1.000	35,924	2,299					563	36	563	36			
	2097	R79	71	0.062	1.000	35,924	2,227					563	35	563	35			
	2098	R80	72	0.059	1.000	35,924	2,120					918	54	918	54			
	2099	R81	73	0.057	1.000	35,924	2,048					918	52	918	52			
	2100	R82	74	0.055	1.000	35,924	1,976					1,007	55	1,007	55			
	2101	R83	75	0.053	1.000	35,924	1,904					918	49	918	49			
	2102	R84	76	0.051	1.000	35,924	1,832					982	50	982	50			
	2103	R85	77	0.049	1.000	35,924	1,760					385	19	385	19			
	2104	R86	78	0.047	1.000	35,924	1,688					385	18	385	18			
	2105	R87	79	0.045	1.000	35,924	1,617					385	17	385	17			
	2106	R88	80	0.043	1.000	35,924	1,545					385	17	385	17			
合計						2,609,647	652,076	457	B=652,533	95,891	60,725	32,380	7,143	128,271	C=67,868	B/C=9.6	584,665	

残存価値			
項目	工事費	残存価値	備考
構造物	54,788.7	237.7	=0.1×(工事費)/(1+0.04) ⁸⁰
構造物以外	4,259.1	184.8	= (工事費)/(1+0.04) ⁸⁰
用地費	789.0	34.2	= (工事費)/(1+0.04) ⁸⁰
合計	59,836.7	457	単位：百万円

費用便益比		
総便益（億円）	B	6,525
便益		6,521
残存価値		5
総費用（億円）	C	679
建設費		607
維持管理費		71
費用便益比	B/C	9.6
純現在価値（億円）	B-C	5,847

【感度分析】様式-5 費用対便益（全体事業：資産+10%）

■狩野川直轄河川改修事業

様式-5

費用対便益（全体事業：資産+10%）

水系名：狩野川水系

(単位：百万円)

年次	西暦	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益：B			建設費③		費用：C		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	経済的内部 収益率 EIRR	
						便益①		残存価値 ②	計 (①+②)	費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
						便益	現在価値											
基準年	2026	R08	0	1.000	1.000													
整備期間（30年）	2027	R09	1	0.962	1.000		0			2,184	2,101	0	0	2,184	2,101			
	2028	R10	2	0.925	1.000		4,665	4,315		2,570	2,377	4	3	2,573	2,380			
	2029	R11	3	0.889	1.000		10,154	9,027		2,570	2,285	7	6	2,577	2,291			
	2030	R12	4	0.855	1.000		15,643	13,375		2,327	1,990	11	9	2,338	1,999			
	2031	R13	5	0.822	1.000		20,613	16,944		2,327	1,913	45	37	2,372	1,950			
	2032	R14	6	0.790	1.000		25,584	20,211		4,839	3,822	49	38	4,887	3,860			
	2033	R15	7	0.760	1.000		26,611	20,224		4,156	3,158	352	267	4,507	3,425			
	2034	R16	8	0.731	1.000		27,493	20,097		4,132	3,020	352	257	4,484	3,277			
	2035	R17	9	0.703	1.000		28,370	19,944		4,084	2,871	352	247	4,436	3,118			
	2036	R18	10	0.676	1.000		29,237	19,764		4,097	2,770	352	238	4,450	3,008			
	2037	R19	11	0.650	1.000		30,106	19,569		6,047	3,930	353	229	6,400	4,159			
	2038	R20	12	0.625	1.000		31,390	19,619		7,916	4,948	353	221	8,269	5,169			
	2039	R21	13	0.601	1.000		33,070	19,875		7,885	4,739	353	212	8,238	4,951			
	2040	R22	14	0.577	1.000		34,744	20,047		7,885	4,550	442	255	8,328	4,805			
	2041	R23	15	0.555	1.000		36,417	20,211		6,340	3,519	353	196	6,693	3,715			
	2042	R24	16	0.534	1.000		37,763	20,165		6,732	3,595	353	189	7,085	3,784			
	2043	R25	17	0.513	1.000		39,192	20,105		6,986	3,584	353	181	7,339	3,765			
	2044	R26	18	0.494	1.000		40,674	20,093		2,978	1,471	353	174	3,332	1,645			
	2045	R27	19	0.475	1.000		41,307	19,621		2,292	1,089	353	168	2,645	1,257			
	2046	R28	20	0.456	1.000		41,793	19,058		798	364	353	161	1,151	525			
	2047	R29	21	0.439	1.000		41,962	18,421		1,023	449	465	204	1,488	653			
	2048	R30	22	0.422	1.000		42,180	17,800		1,023	432	293	124	1,316	556			
	2049	R31	23	0.406	1.000		42,397	17,213		1,023	415	287	116	1,310	531			
	2050	R32	24	0.390	1.000		42,614	16,619		1,023	399	376	147	1,399	546			
	2051	R33	25	0.375	1.000		42,831	16,062		1,023	384	163	61	1,187	445			
	2052	R34	26	0.361	1.000		43,048	15,540		385	139	278	100	663	239			
	2053	R35	27	0.347	1.000		43,130	14,966		385	134	278	96	663	230			
	2054	R36	28	0.333	1.000		43,212	14,390		385	128	278	93	663	221			
	2055	R37	29	0.321	1.000		43,294	13,897		236	76	278	89	514	165			
	2056	R38	30	0.308	1.000		43,344	13,350		236	73	278	86	514	159			
	施設完成後の評価期間（50年）	2057	R39	31	0.296	1.000	43,394	12,845				52	15	52	15			
2058		R40	32	0.285	1.000	43,394	12,367				52	15	52	15				
2059		R41	33	0.274	1.000	43,394	11,890				52	14	52	14				
2060		R42	34	0.264	1.000	43,394	11,456				141	37	141	37				
2061		R43	35	0.253	1.000	43,394	10,979				52	13	52	13				
2062		R44	36	0.244	1.000	43,394	10,588				52	13	52	13				
2063		R45	37	0.234	1.000	43,394	10,154				563	132	563	132				
2064		R46	38	0.225	1.000	43,394	9,764				563	127	563	127				
2065		R47	39	0.217	1.000	43,394	9,416				563	122	563	122				
2066		R48	40	0.208	1.000	43,394	9,026				563	117	563	117				
2067		R49	41	0.200	1.000	43,394	8,679				563	113	563	113				
2068		R50	42	0.193	1.000	43,394	8,375				918	177	918	177				
2069		R51	43	0.185	1.000	43,394	8,028				918	170	918	170				
2070		R52	44	0.178	1.000	43,394	7,724				1,007	179	1,007	179				
2071		R53	45	0.171	1.000	43,394	7,420				918	157	918	157				
2072		R54	46	0.165	1.000	43,394	7,160				982	162	982	162				
2073		R55	47	0.158	1.000	43,394	6,856				385	61	385	61				
2074		R56	48	0.152	1.000	43,394	6,596				385	59	385	59				
2075		R57	49	0.146	1.000	43,394	6,336				385	56	385	56				
2076		R58	50	0.141	1.000	43,394	6,119				385	54	385	54				
2077		R59	51	0.135	1.000	43,394	5,858				564	76	564	76				
2078		R60	52	0.130	1.000	43,394	5,641				392	51	392	51				
2079		R61	53	0.125	1.000	43,394	5,424				385	48	385	48				
2080		R62	54	0.120	1.000	43,394	5,207				474	57	474	57				
2081		R63	55	0.116	1.000	43,394	5,034				261	30	261	30				
2082		R64	56	0.111	1.000	43,394	4,817				721	80	721	80				
2083		R65	57	0.107	1.000	43,394	4,643				721	77	721	77				
2084		R66	58	0.103	1.000	43,394	4,470				721	74	721	74				
2085		R67	59	0.099	1.000	43,394	4,296				515	51	515	51				
2086		R68	60	0.095	1.000	43,394	4,122				515	49	515	49				
2087		R69	61	0.091	1.000	43,394	3,949				52	5	52	5				
2088		R70	62	0.088	1.000	43,394	3,819				52	5	52	5				
2089		R71	63	0.085	1.000	43,394	3,688				52	4	52	4				
2090		R72	64	0.081	1.000	43,394	3,515				141	11	141	11				
2091		R73	65	0.078	1.000	43,394	3,385				52	4	52	4				
2092		R74	66	0.075	1.000	43,394	3,255				52	4	52	4				
2093		R75	67	0.072	1.000	43,394	3,124				563	41	563	41				
2094		R76	68	0.069	1.000	43,394	2,994				563	39	563	39				
2095		R77	69	0.067	1.000	43,394	2,907				563	38	563	38				
2096		R78	70	0.064	1.000	43,394	2,777				563	36	563	36				
2097		R79	71	0.062	1.000	43,394	2,690				563	35	563	35				
2098		R80	72	0.059	1.000	43,394	2,560				918	54	918	54				
2099		R81	73	0.057	1.000	43,394	2,473				918	52	918	52				
2100		R82	74	0.055	1.000	43,394	2,387				1,007	55	1,007	55				
2101		R83	75	0.053	1.000	43,394	2,300				918	49	918	49				
2102		R84	76	0.051	1.000	43,394	2,213				982	50	982	50				
2103		R85	77	0.049	1.000	43,394	2,126				385	19	385	19				
2104		R86	78	0.047	1.000	43,394	2,040				385	18	385	18				
2105		R87	79	0.045	1.000	43,394	1,953				385	17	385	17				
2106		R88	80	0.043	1.000	43,394	1,866				385	17	385	17				
合計						3,152,538	787,833	457	B=788,290	95,891	60,725	32,380	7,143	128,271	C=67,868	B/C=11.6	720,422	

残存価値			
項目	工事費	残存価値	備考
構造物	54,788.7	237.7	=0.1×(工事費)/(1+0.04) ⁸⁰
構造物以外	4,259.1	184.8	= (工事費)/(1+0.04) ⁸⁰
用地費	789.0	34.2	= (工事費)/(1+0.04) ⁸⁰
合計	59,836.7	457	単位：百万円

費用便益比	
総便益（億円）	B
便益	7,878
残存価値	5
総費用（億円）	C
建設費	607
維持管理費	71
費用便益比	B/C
純現在価値（億円）	B-C
	7,204

事業費の内訳書

河川事業

事業名	狩野川直轄河川改修事業(全体事業費)
-----	--------------------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R8年度	再評価
------	------	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	62,119	
	本工事費		式	1	60,066	
		河道掘削	千m³	695	1,356	
		樹木伐開	m²	1,428	6	
		堤防整備	m	6,010	3,323	
		浸透対策	m	9,590	1,414	
		侵食・洗掘対策	m	7,625	3,790	
		内水対策	箇所	1	352	四日町排水機場
		耐震対策	m	800	2,640	
		津波対策	m²	270	903	
		分流堰改築	式	1	3,526	
		その他	式	1	42,756	
	付帯工事費		式	1	1,014	黄瀬川大橋の改築等
	危機管理対策		式	1	1,038	
		防災関係施設整備	式	1	880	
		CCTV	基	6	158	
用地費及補償費		式	1	18,549		
	残土処分費	式	1	14,847		
	用地費	式	1	868		
	補償費	式	1	2,834		
間接経費		式	1	24,813	リスク管理費含む	
事業費(工事諸費除く) 計		式	1	105,481		
工事諸費		式	1	16,604		
事業費(工事諸費含む) 計		式	1	122,085		
維持管理費			式	1	40,848	河道維持掘削、樹木伐採、護岸修繕等、堤防除草他

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

狩野川直轄河川改修事業の 事業評価について

令和8年6月4日

国土交通省 中部地方整備局
沼津河川国道事務所

目 次

0. はじめに

1. 事業の概要・評価の視点

(1) 流域の概要	4
(2) 旧河川整備計画の内容	6
(3) 事業を巡る社会経済情勢等の変化	7
(4) 変更河川整備計画の内容	10
(5) 当面の段階的な整備	13
(6) 事業の投資効果	14
(7) 費用対効果分析	15
(8) コスト縮減や代替案等の可能性	20

2. 県への意見聴取結果

3. 対応方針（原案）

0. はじめに

今回、事業再評価を実施する理由

(国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 第3の1(5))

「社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業」に該当するため、事業再評価を実施する。

○狩野川水系河川整備計画を変更(R8.5公表)

事業計画(河川整備計画)の変更内容

- 下流域の主要な地点黒瀬において、気候変動によって2℃上昇した場合でも年超過確率1/70程度の規模の降雨により発生する洪水を安全に流下させるために整備内容を変更。

今回事業計画

- 事業期間 : 令和9年度～令和38年度
- 総事業費 : 約1,221億円

前回事業計画

- (平成17年度～令和16年度)
- (約463億円)

流域委員会と事業評価監視委員会との関係について

- 事業評価の実施について

(国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 第4の1(4))

河川事業、ダム事業については、河川法に基づき、学識経験者等から構成される委員会等での審議を経て、河川整備計画の策定・変更を行った場合には、再評価の手続きが行われたものとして位置づけるものとする。

- 審議結果の報告

(河川及びダム事業の再評価実施要領細目 第6 抜粋)


実施要領第4の1(4)の規定に基づいて審議が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に報告するものとする。

○令和8年6月4日 流域委員会による審議を実施。事業評価監視委員会に結果の報告

◆河川整備計画の策定状況

- 狩野川水系では、河川整備基本方針(平成12年12月)、河川整備計画(平成17年12月、平成28年12月変更)を策定しており、令和5年8月に気候変動等を考慮して河川整備基本方針を変更しました。
- 河川整備の進捗、昨今の地震や豪雨による甚大な浸水被害の発生など河川を取り巻く状況の変化、気候変動の影響により今後の降雨量の増大が予測されている等を鑑み、狩野川水系流域委員会での審議を経て、狩野川水系河川整備計画を令和8年5月に変更しました。

狩野川水系河川整備計画の変更に向けたスケジュール

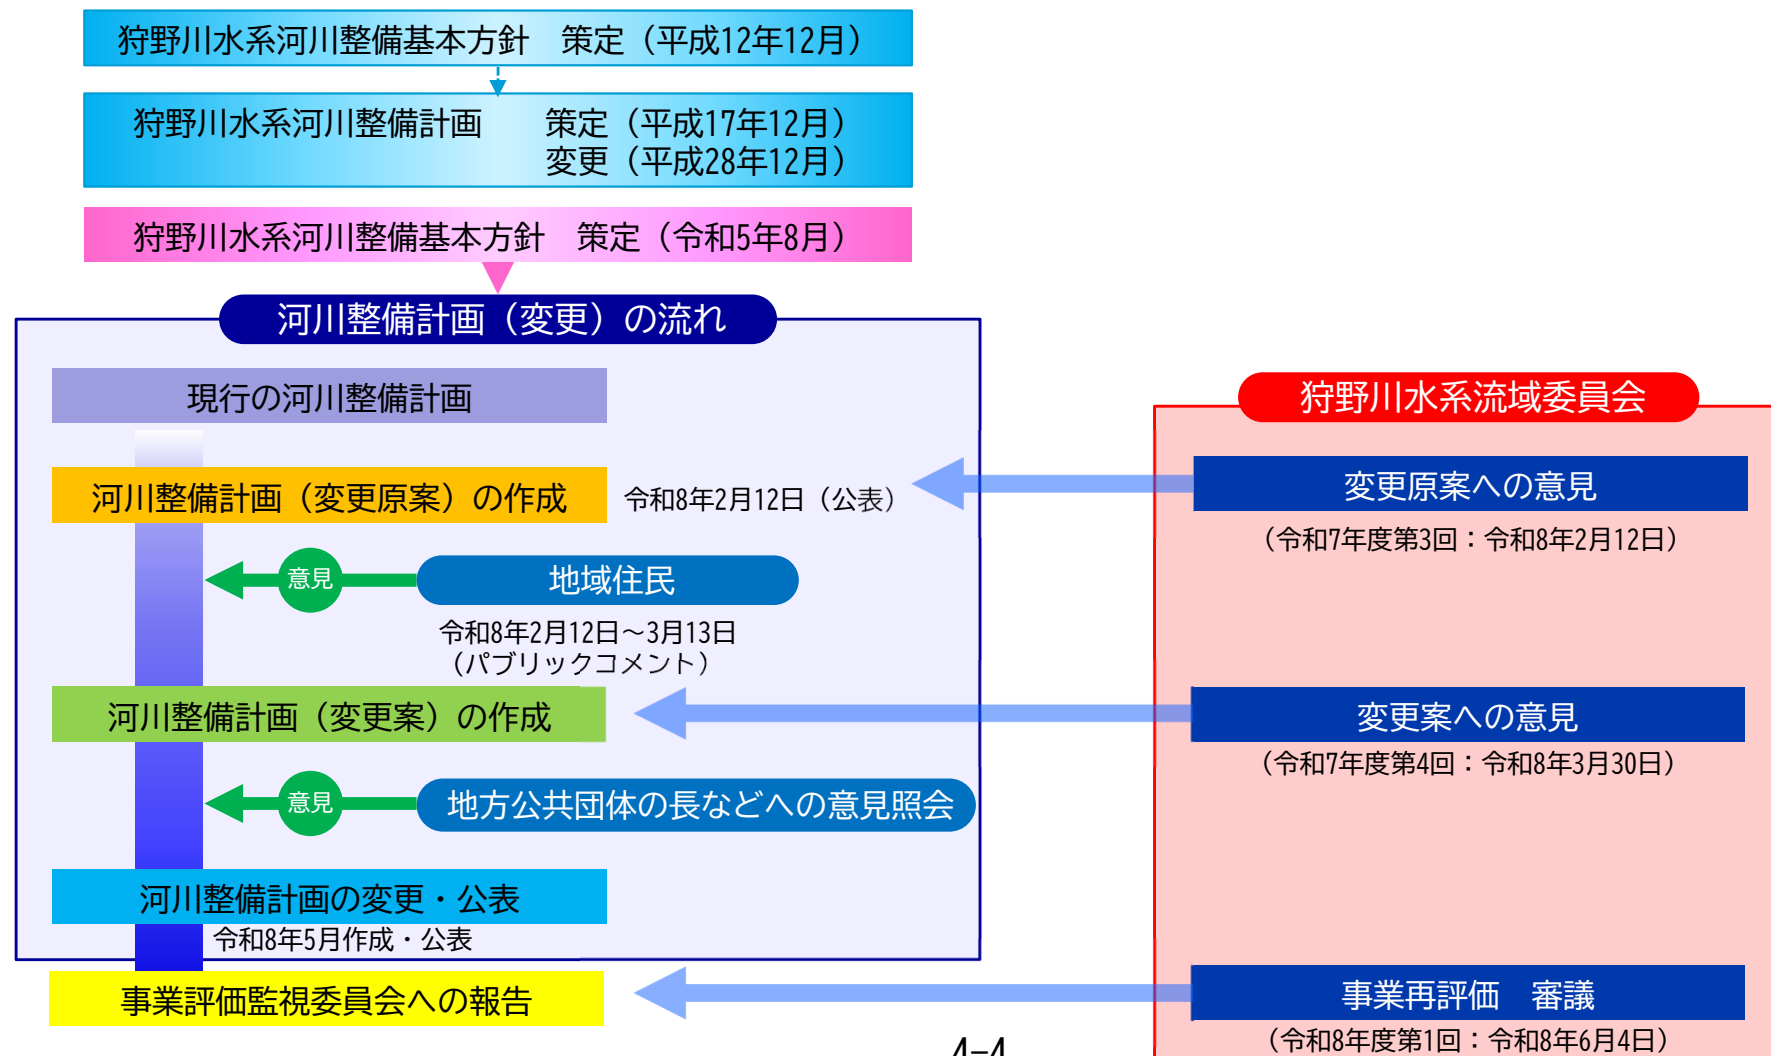


1.事業の概要・評価の視点


(1)流域の概要

狩野川水系

- 狩野川は伊豆半島中央部の静岡県伊豆市の天城山系にその源を発し、田方平野に下り伊豆の国市古奈で狩野川放水路を分派した後、箱根山等を源とする来光川、大場川等と合流、さらに、沼津市で富士山麓より南下する最大の支川黄瀬川と合流して、駿河湾に注ぐ、幹川流路延長約46km、流域面積852km²の一級河川です。
- 狩野川下流域の各市町は、県東部の駿豆地区の中核として地域の産業・経済の基盤となっています。

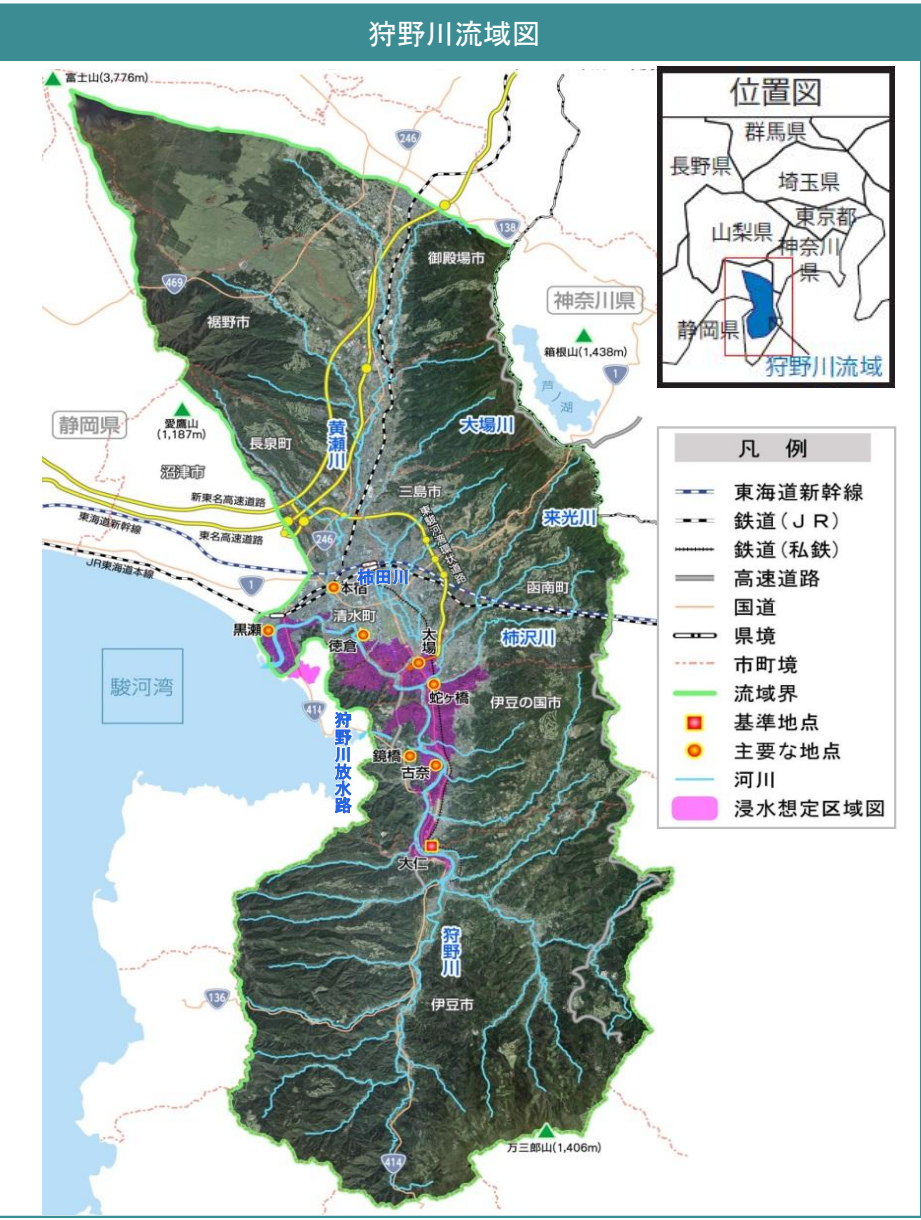

- 流域面積：852km²
- 幹川流路延長：約46km
- 直轄管理区間：狩野川24.9km 黄瀬川2.7km 大場川2.6km
来光川1.5km 柿沢川0.9km 柿田川1.2km 狩野川放水路3.0km
- 流域内市町村：6市3町
(沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町)
- 流域市町人口：約62万人(R2国勢調査)

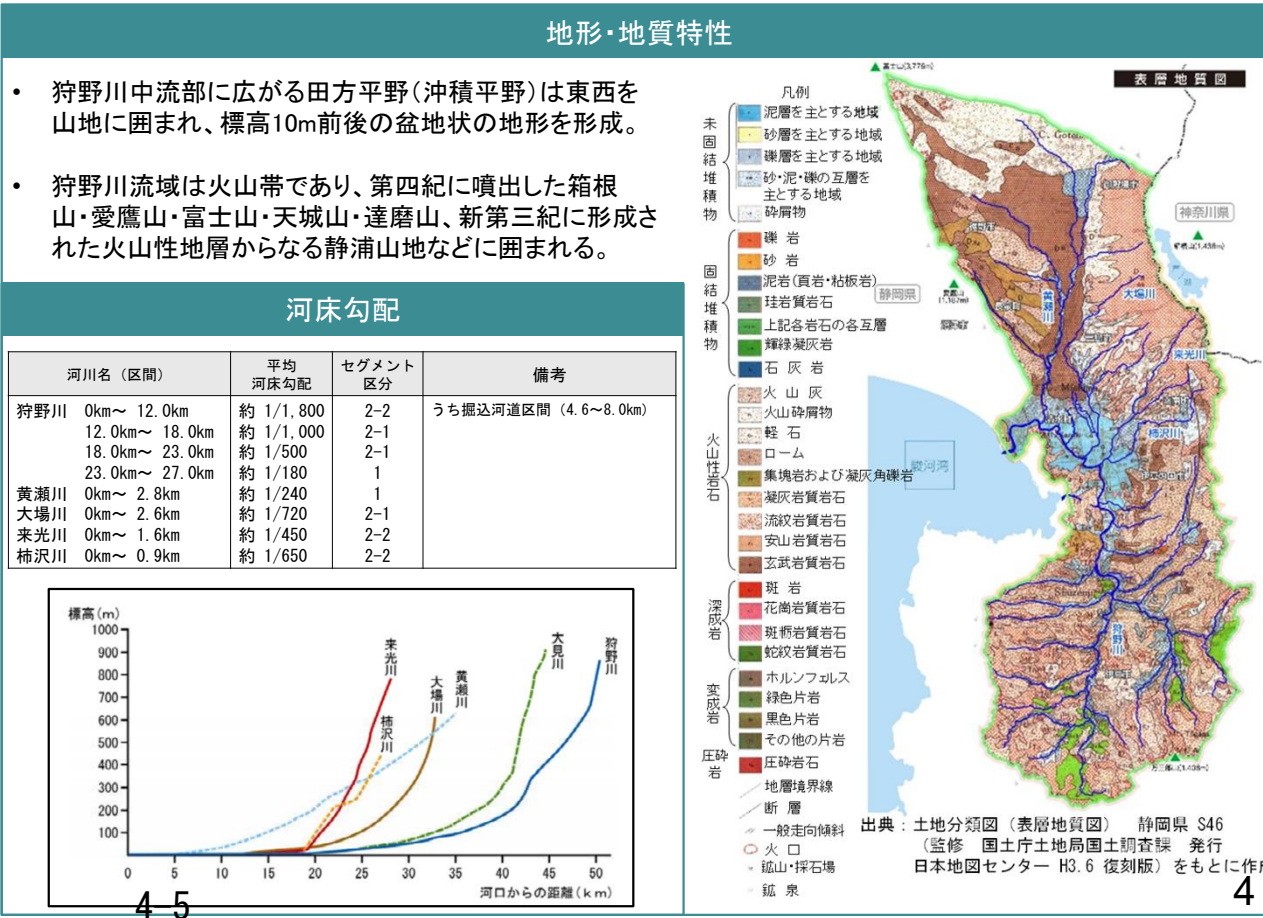

- 昭和33年9月の狩野川台風(台風22号)は、流域全体で死者・行方不明者853人、被災家屋6,775戸という未曾有の大災害をもたらしました。
- 支川においても昭和57年9月(柿沢川)、平成10年8月(来光川・柿沢川)の降雨により被害が発生しています。
- 近年においては平成14年・16年・19年・23年、令和元年・3年・6年など、内水氾濫等による浸水被害が頻発しています。


狩野川の主要洪水一覧			
発生年月日	原因	基準地点(大仁)流量(m³/s)	被害等
昭和23年9月16日	台風21号(アイオン台風)	—	床上浸水346戸、床下浸水222戸
昭和33年9月26日	台風22号(狩野川台風)	約4,000	死者684名、行方不明169名、家屋全壊261戸、流失697戸、半壊647戸、床上浸水3,012戸、床下浸水2,158戸
昭和57年9月12日	台風第18号	約2,300	家屋全壊流出1戸、床上浸水190戸、床下浸水449戸、浸水面積302ha
平成10年8月30日	前線	約900	家屋全壊3戸、半壊2戸、床上浸水284戸、床下浸水481戸、浸水面積371ha
平成14年10月1日	台風第21号	約2,000	家屋全壊1戸、半壊2戸、床上浸水975戸、床下浸水280戸、浸水面積93ha
平成16年10月8～9日	台風第22号	約1,300	家屋全壊4戸、半壊2戸、床上浸水351戸、床下浸水623戸、浸水面積147ha
平成19年9月6日	台風第9号	約2,000	家屋全壊2戸、半壊1戸、床上浸水251戸、床下浸水481戸、浸水面積550ha
平成23年9月19日	台風第15号	約1,600	床上浸水4戸、床下浸水11戸
令和元年10月11～15日	令和元年東日本台風(台風第19号)	約1,700	床上浸水623戸、床下浸水627戸、浸水面積850ha
令和3年7月3日	前線	約900	家屋全壊1戸、床上浸水9戸、床下浸水13戸
令和6年6月18日	前線	約1,500	家屋半壊1戸、床上浸水37戸、床下浸水105戸

主な洪水被害

【狩野川台風(昭和33年9月)】
(静岡県伊豆の国市)



【平成10年8月洪水】
(静岡県田方郡函南町)

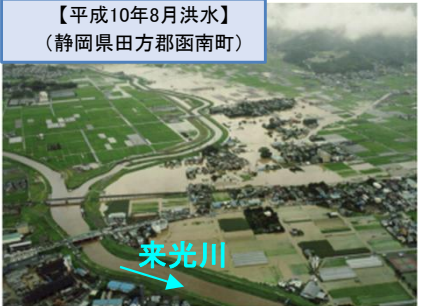

【平成16年10月洪水】
(静岡県沼津市)



【平成19年9月洪水】
(静岡県伊豆の国市)



【令和元年東日本台風(令和元年10月)】
(静岡県沼津市)



【令和3年7月洪水】
(静岡県沼津市・駿東郡清水町)





1.事業の概要・評価の視点

(2)旧河川整備計画の内容



狩野川水系

■平成17年12月(平成28年12月変更)に策定された「狩野川水系河川整備計画」において、狩野川本川は既往最大洪水である狩野川台風(昭和33年9月洪水)に次ぐ規模の洪水(基準地点大仁:3,100m³/s)、支川は既往最大洪水流量規模の洪水が発生した場合においても、外水氾濫による家屋等の浸水被害を防止することを目標としていました。

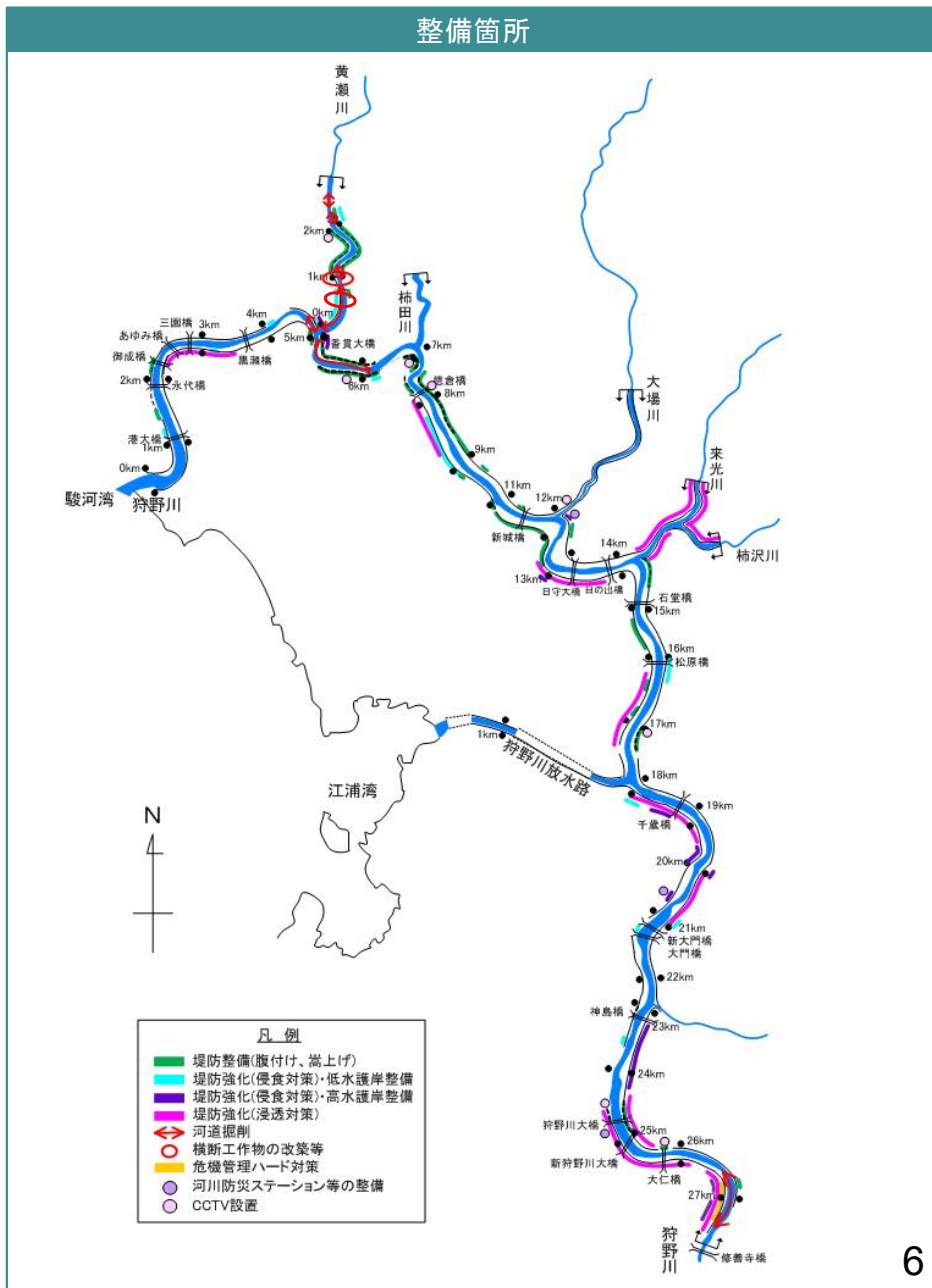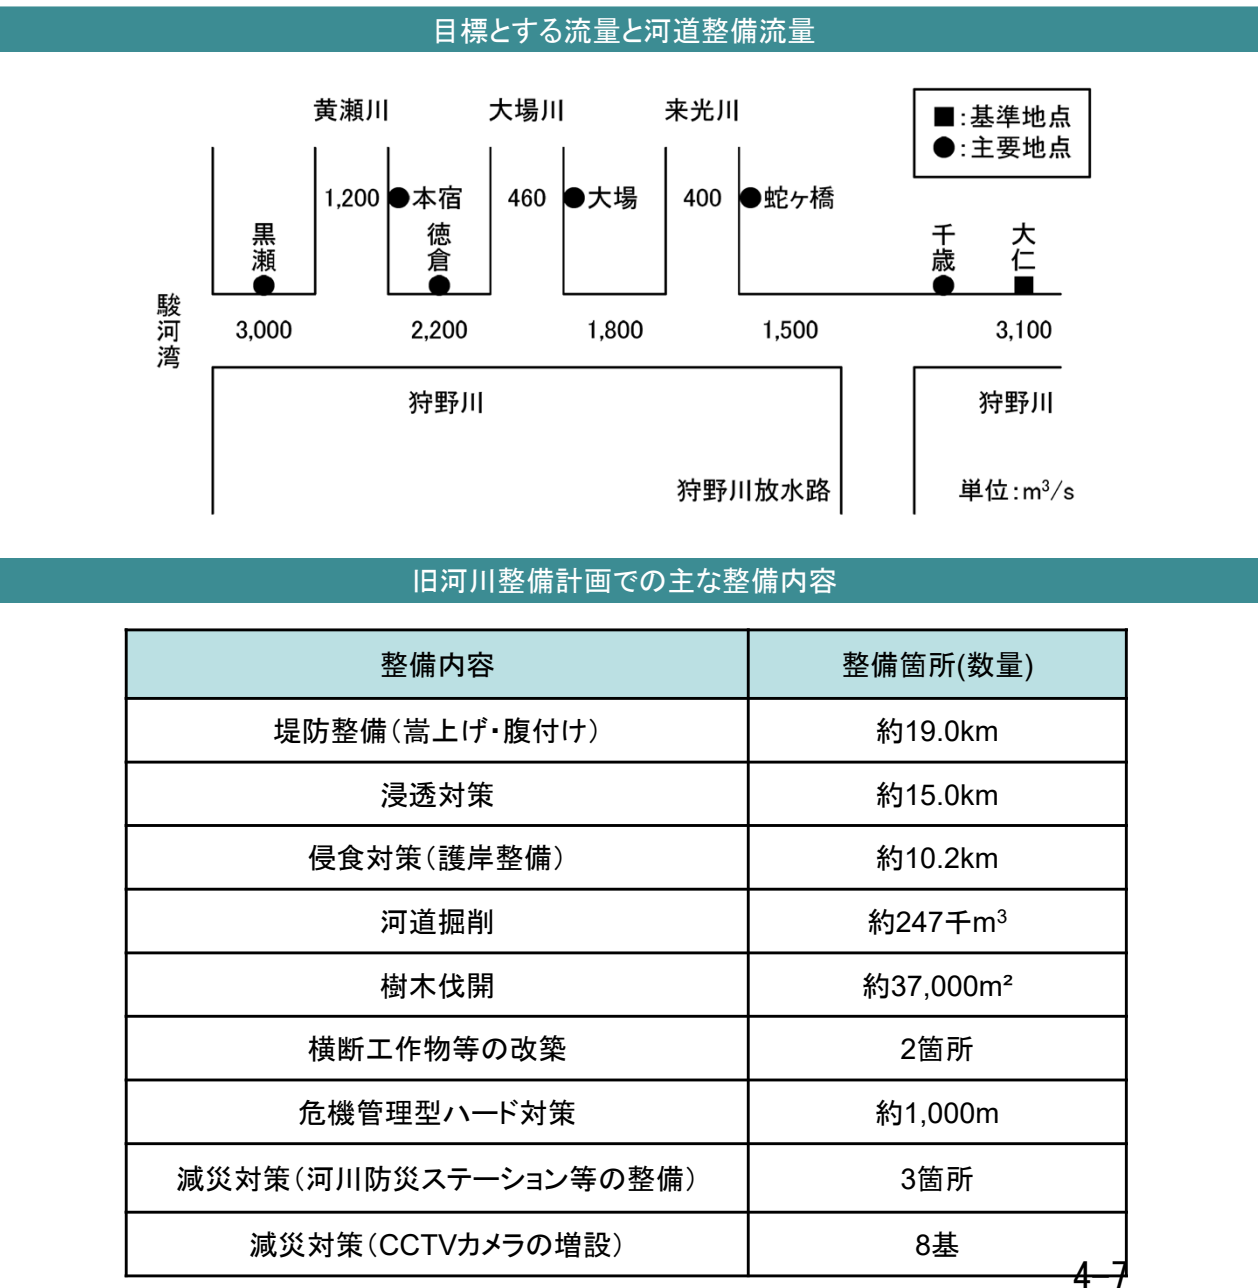

1.事業の概要・評価の視点 (3)事業を巡る社会経済情勢等の変化 災害発生リスクの増加 狩野川水系

- 令和元年東日本台風では、戦後最大の被害を発生させた狩野川台風と同規模の降雨により、浸水家屋約1,250戸の内水氾濫等による被害が発生しました。
- 令和3年7月洪水では黄瀬川大橋橋梁の損傷、令和7年9月の集中豪雨による急激な水位上昇など、近年の降雨特性や気候変動による降雨量の増加など、災害発生リスクが高まっているため、流域一帯で対応を図る必要があります。

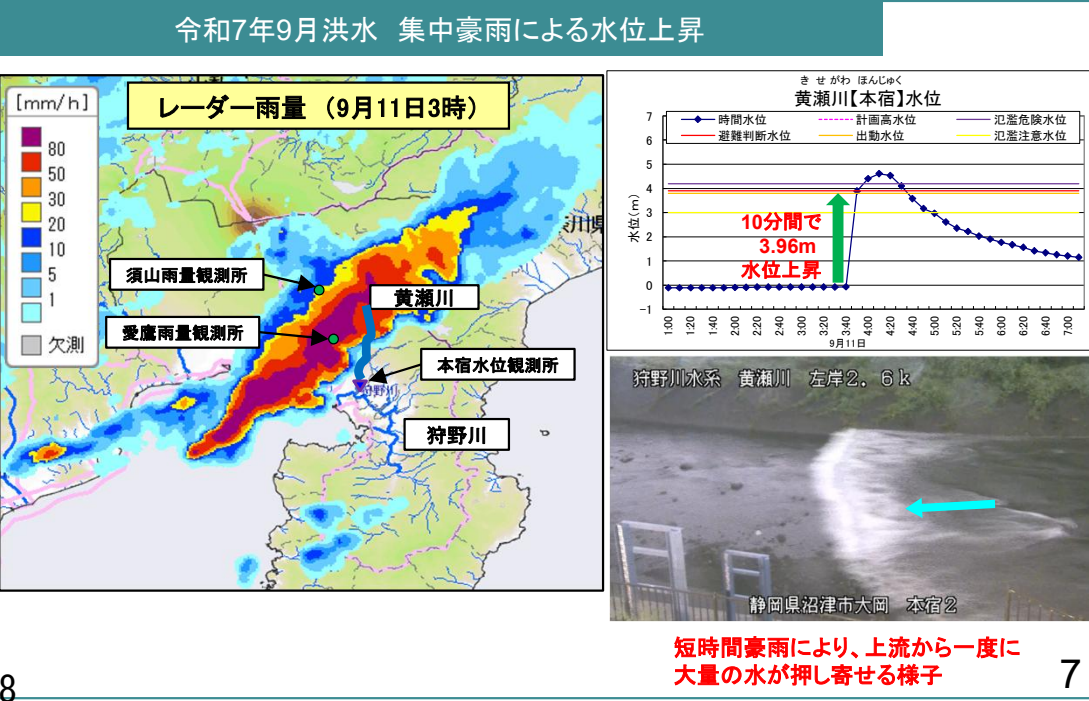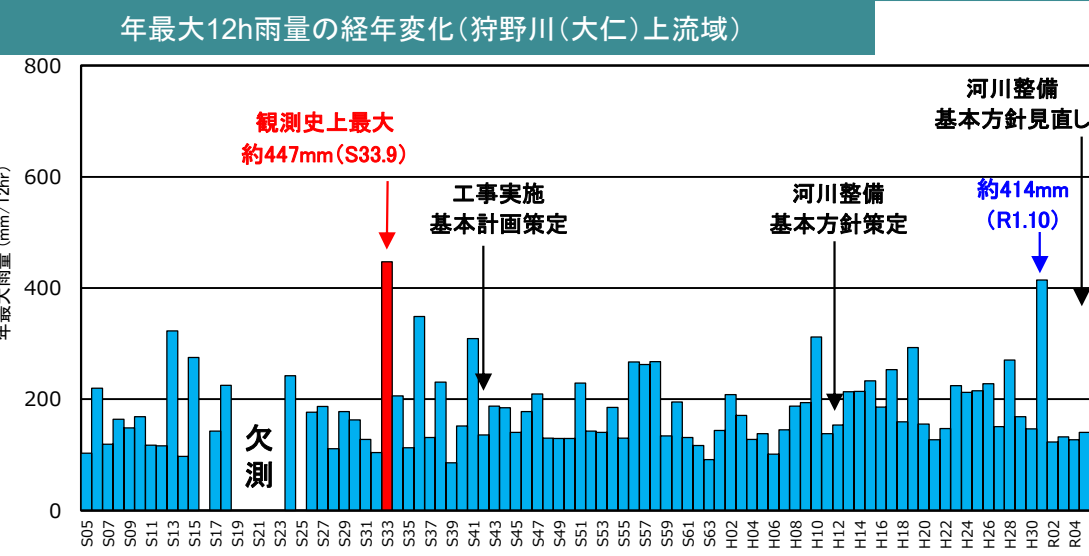


1.事業の概要・評価の視点

(3)事業を巡る社会経済情勢等の変化

地域の開発状況

狩野川水系

- 狩野川流域と他地域を結ぶ交通網としては、昭和39年(1964年)に東海道新幹線が開通、昭和44年(1969年)に東名高速道路が全通し、氾濫原に位置する下流域の沼津市や三島市は交通の要衝となっています。さらに、この地域は伊豆や富士といった観光地へ向かう交通網の整備も進められています。
- 近年では、新東名高速道路の一部開通(平成24年(2012年))、伊豆縦貫自動車道のうち東駿河湾環状道路(三島塚原～函南塚本間)(平成26年(2014年))、天城北道路(大平～月ヶ瀬間)(平成31年(2019年))の開通など、整備は着実に進んでおり、市街地の高密度化が進展しています。

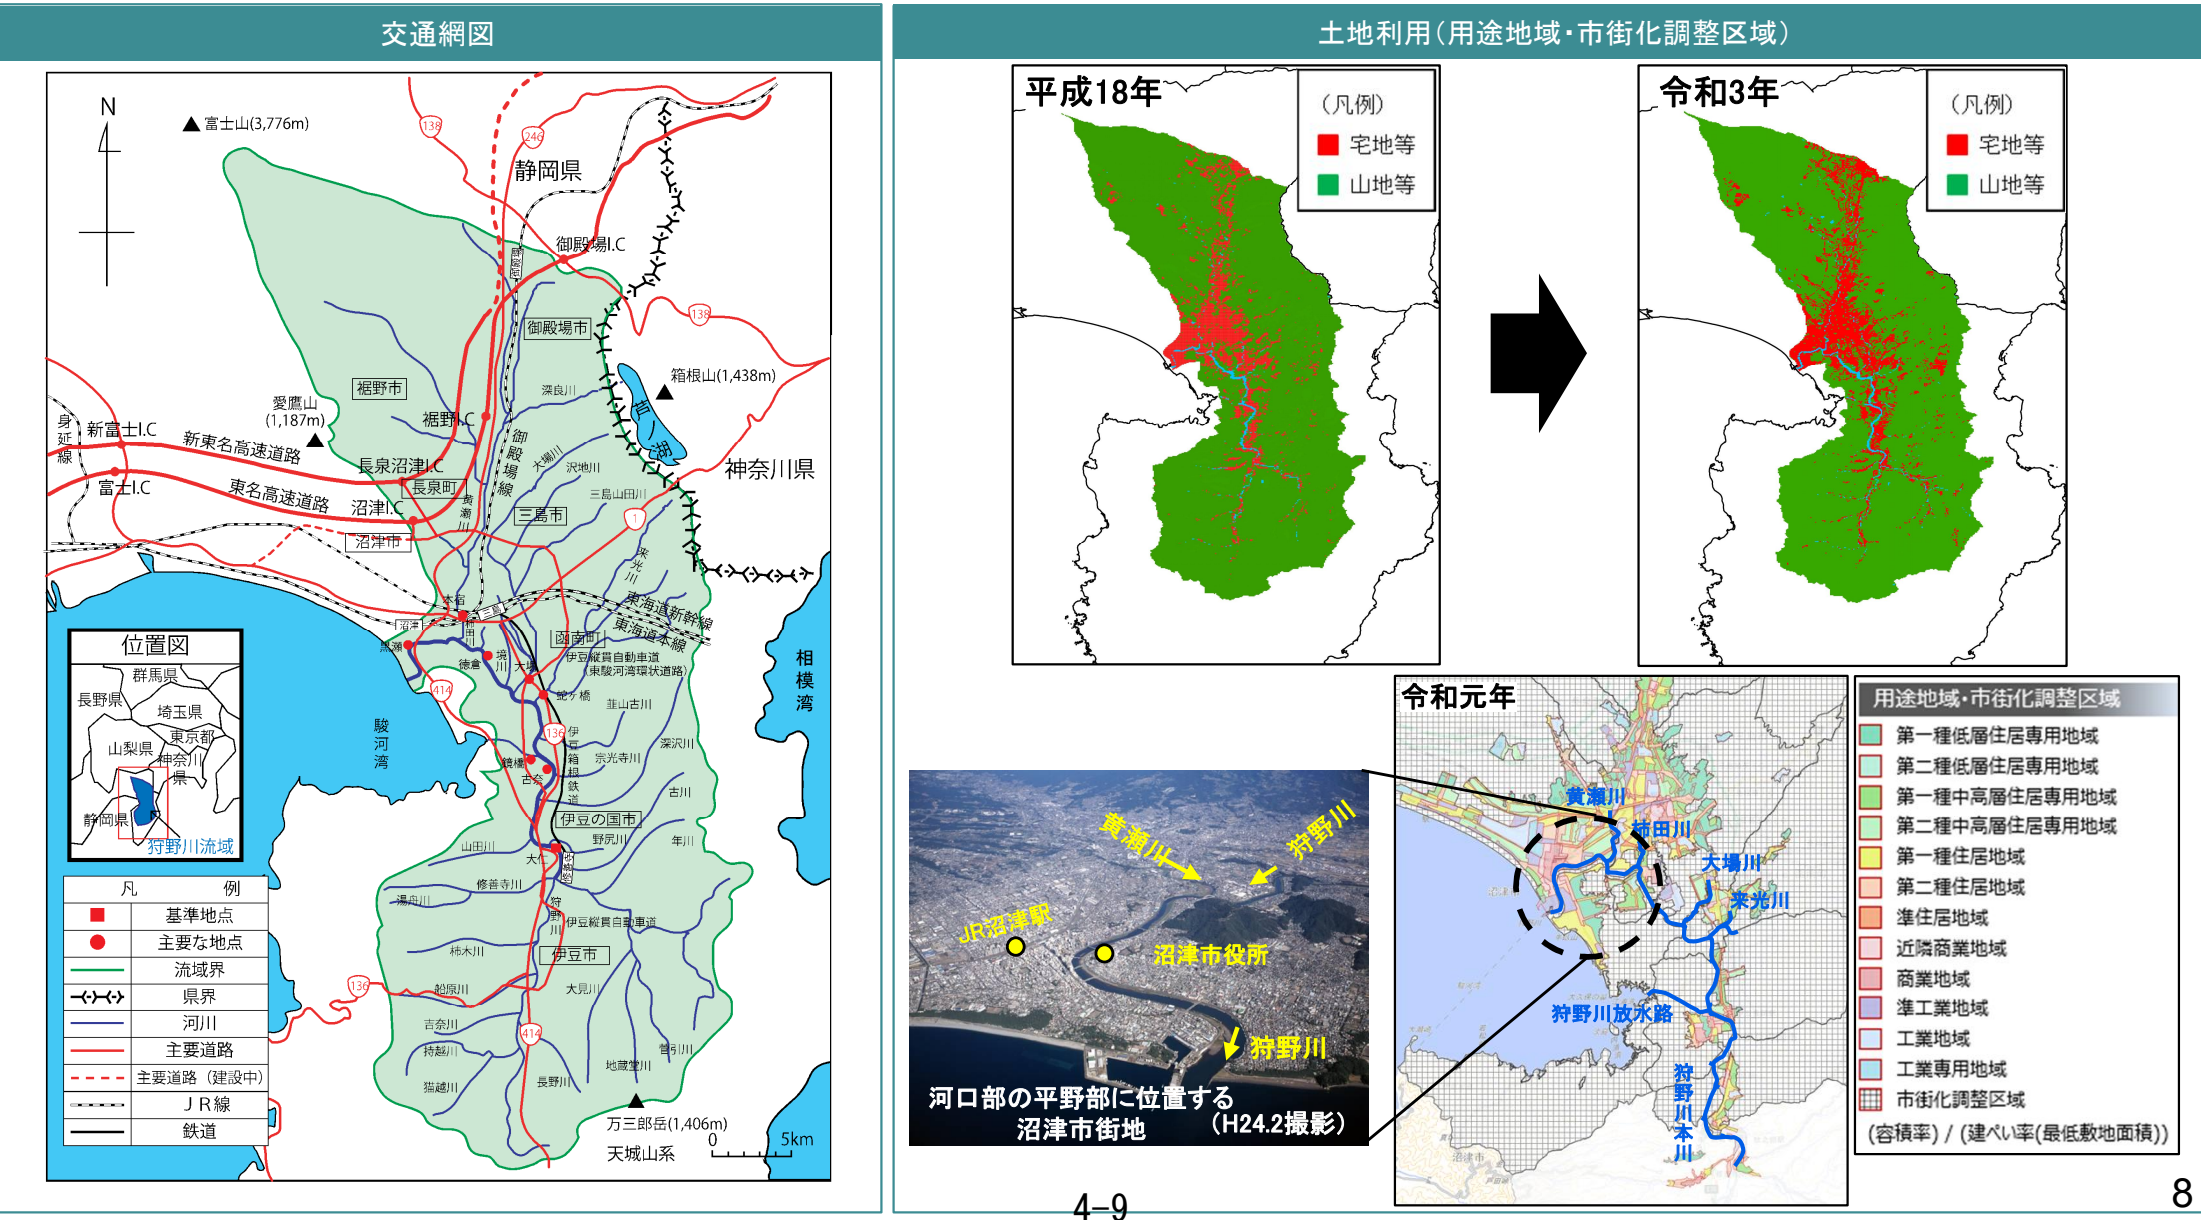

1.事業の概要・評価の視点 (3)事業を巡る社会経済情勢等の変化 地域の協力体制 狩野川水系

- 令和5年8月に、気候変動を考慮した流域治水プロジェクト2.0を公表し、流域全体で協力して治水安全度を向上させる取り組みを実施しています。
- 流域市町がまちづくりや住まい方の誘導による水害に強い地域づくりを進める際、水害リスク情報の共有・提供など技術的な支援や、中高頻度の外力規模の浸水想定や施設整備前後の浸水想定などの水害リスク情報の提供等を行います。
- 住民の避難を促す取組や、水防への意識向上啓発、防災・減災教育の取組の推進などを行っています。

狩野川水系流域治水プロジェクト2.0

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○堤防整備(国交省)



○雨水調整池堆積土砂の掘削(三島市)



堤防整備等により治水安全度の向上を図る他、雨水調整池堆積土砂の掘削等により浸水被害の軽減を図る。

被害対象を減少させるための対策

○防災指針の追加による立地適正化計画の変更(伊豆の国市、函南町)



伊豆の国市、函南町の2市町が連携し、防災指針を追加した立地適正化計画の変更を実施予定。

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

○要配慮者施設での避難訓練実施(裾野市)



○防災出前講座の実施(伊豆市)



住民の主體的な避難行動を促す取組として要配慮者施設での避難訓練の実施、地域の住民を対象とした防災出前講座等の実施。

狩野川流域 防災・河川環境教育

■ 授業の中で防災教育を実施してもらえよう支援する取り組みを継続。




凡例
● H28モデル校
● H29モデル校
● H30実践協力校
● H31/R1実践協力校
● R2実践協力校
● R3実践協力校
● R4実践協力校
○ 狩野川流域界

狩野川に学ぶ
～防災・河川環境教育実践ガイド～
【〇〇小学校版】

◆5年生 総合的学習の時間
～防災「水害について調べよう」～


※平成27年から取り組みを始め、現在、狩野川沿川の23の小学校で実施継続。

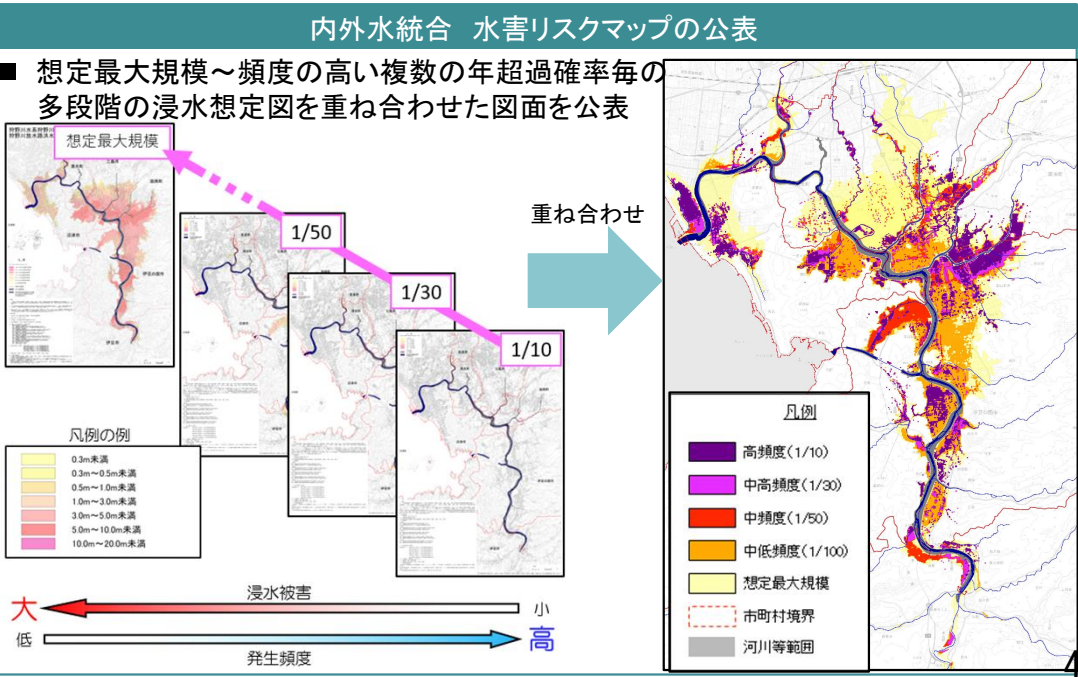

地域の要望活動

■ 狩野川改修促進期成同盟会より、国に対し継続的に整備促進の要望が行われている。

令和7年度 要望書



狩野川改修促進期成同盟会
会長 長泉町長 池田 修



沼津市記者発表資料より
要望活動状況写真

- 旧河川整備計画では「S33狩野川台風」に「次ぐ」規模の洪水を安全に流下させることを目標としていましたが、気候変動の影響や社会経済情勢の変化に伴い、頻発化・激甚化する洪水に対して従来の計画目標規模では十分な治水安全度を確保することが難しくなってきたことから、流域に暮らす方々の安全・安心な暮らしを守るために整備計画を変更しています。
- 変更河川整備計画では、今後の気候変動による降雨量増大を考慮し、目標を上回る河川整備基本方針規模等の洪水に対しても、流域全体で被害をできる限り軽減できるよう治水安全度向上を図ります。

狩野川流域における治水安全度


【旧河川整備計画目標】

昭和33年9月狩野川台風に次ぐ規模の洪水【河道整備流量:3,100m³/s(大仁地点)】

狩野川水系の気候変動による降雨量増大を考慮

【変更河川整備計画目標】

※流域における被害最小化に向けた整備方針を検討

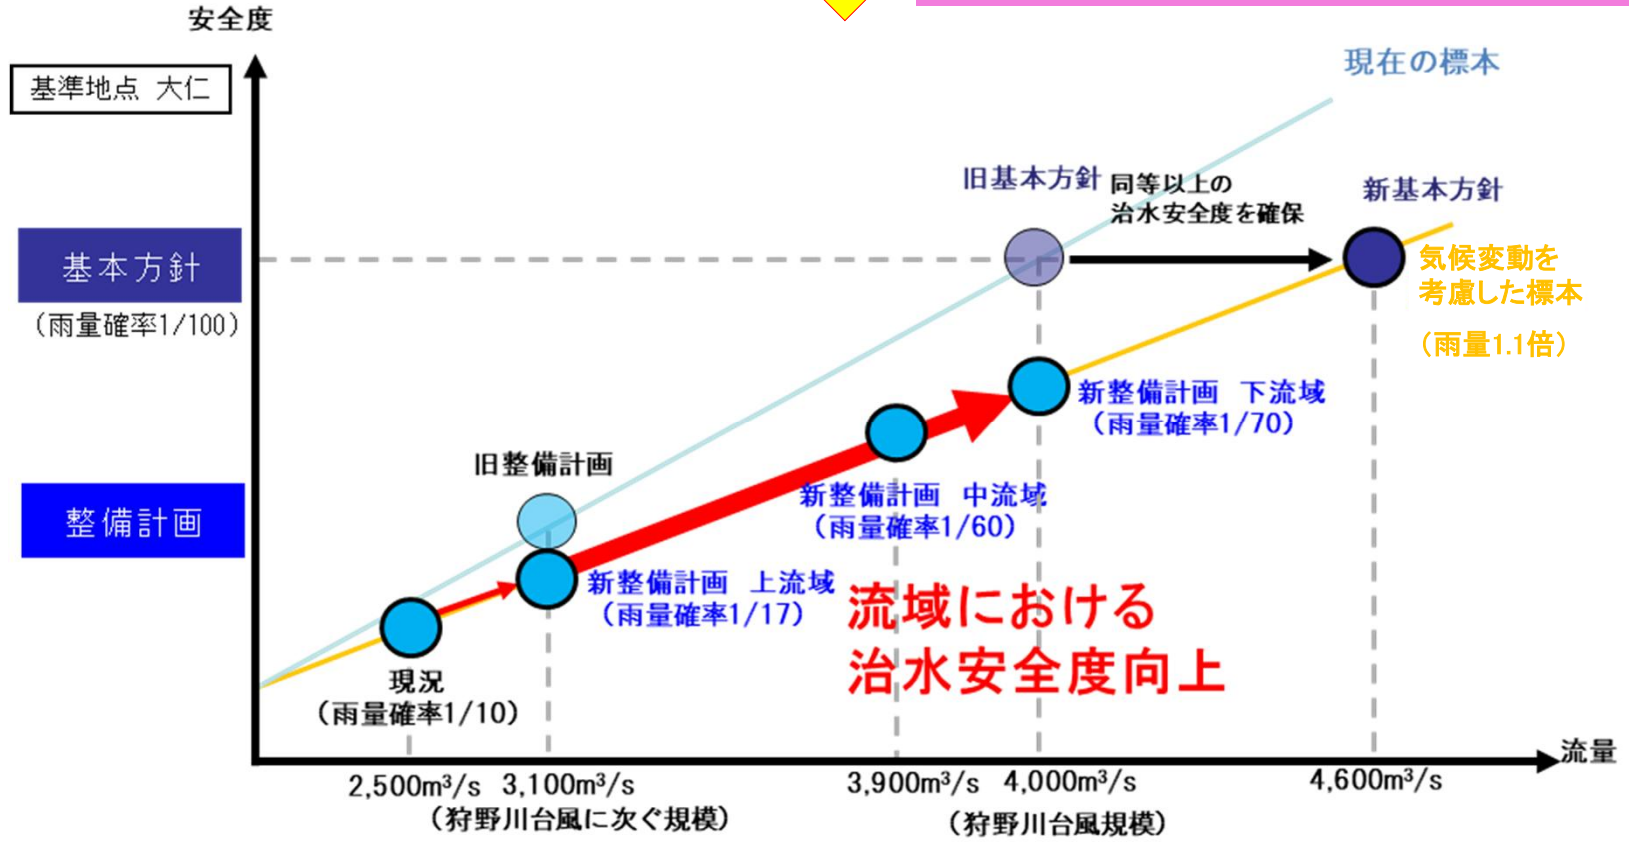

- 狩野川水系河川整備基本方針で定めた目標に向けた段階的な整備、氾濫域の資産の集積状況、土地利用の状況等を総合的に勘案し、治水安全度の向上を図ります。
- 狩野川においては、下流域の主要な地点黒瀬において、気候変動によって2℃上昇した場合でも年超過確率1/70程度の降雨により発生する洪水を安全に流下させることを目標とします。この際、流域で2,700m³/sの洪水調節機能を確保し、河道の配分流量は3,600m³/sとします。

狩野川水系変更河川整備計画の目標

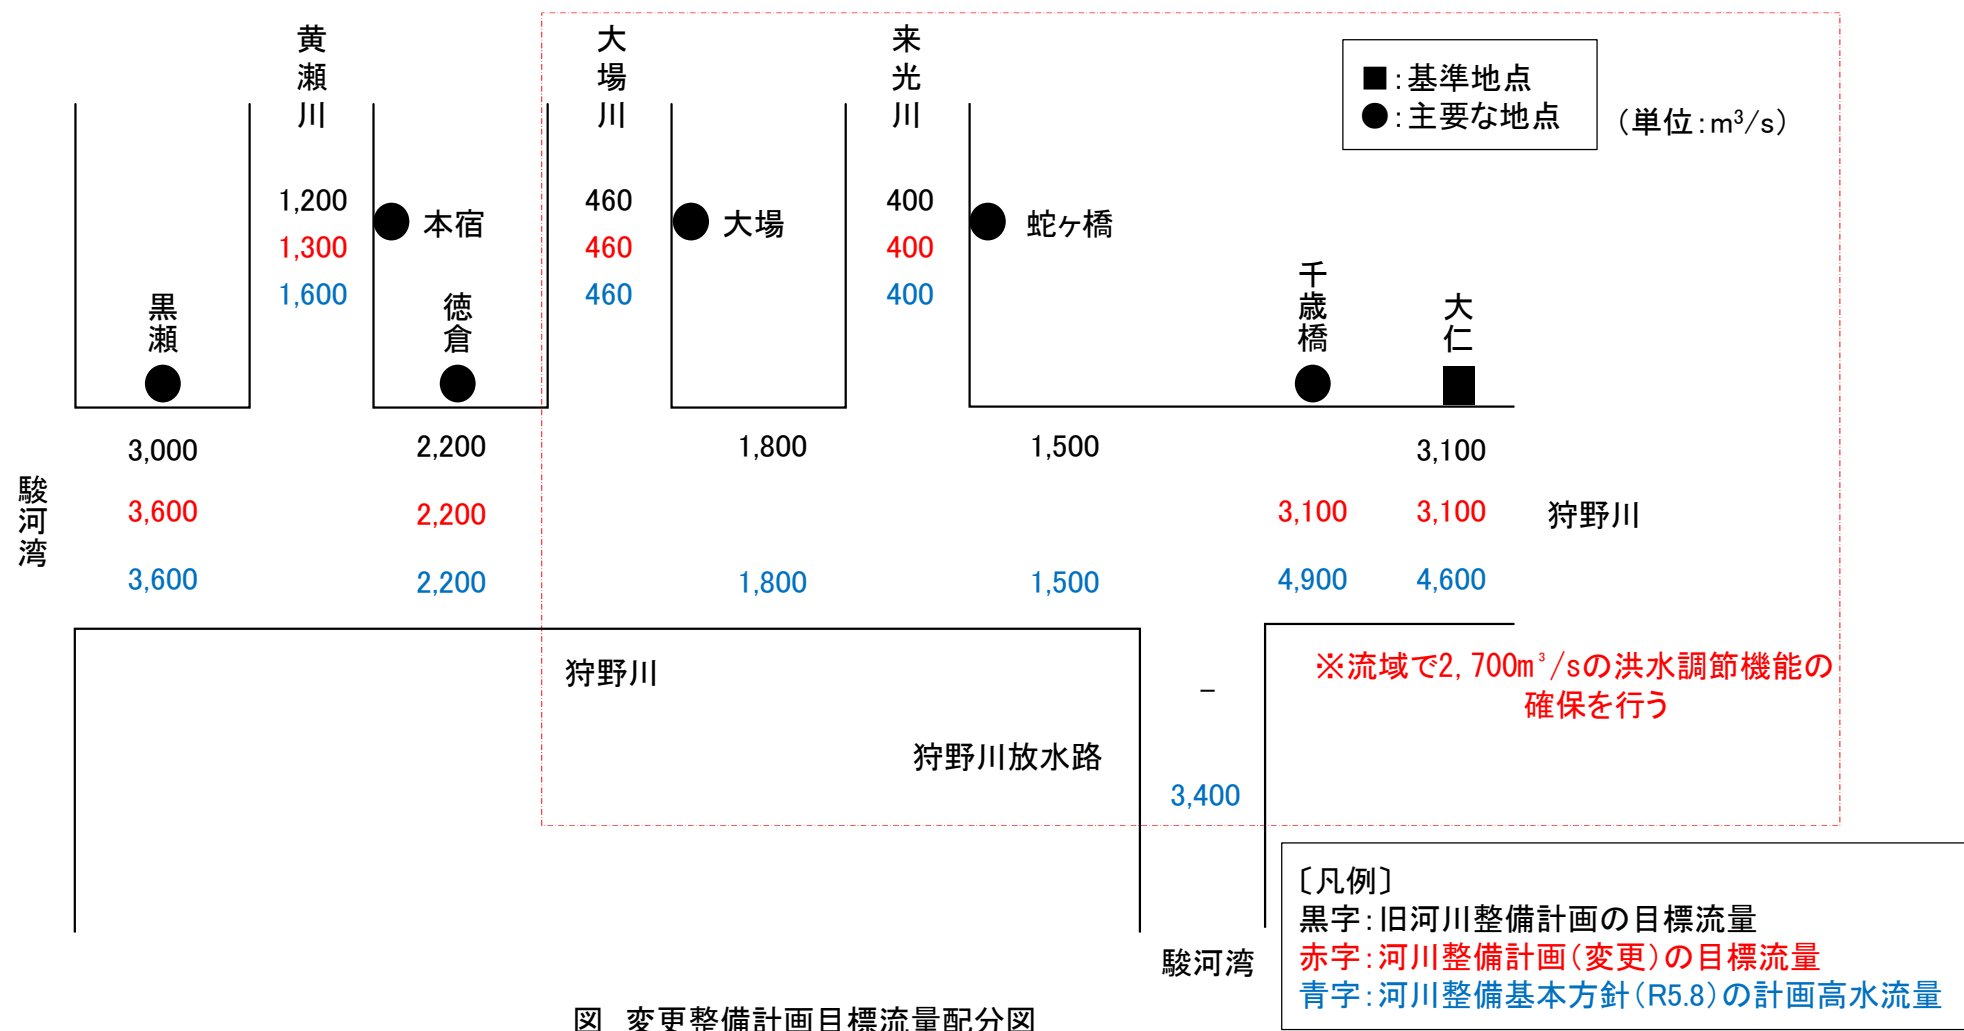



図 変更整備計画目標流量配分図

- 狩野川本川は、既往最大洪水である狩野川台風(昭和33年9月洪水)に次ぐ規模の洪水(基準地点大仁:3,100m3/s)に対して、支川は既往最大洪水流量規模の洪水が発生した場合においても、外水氾濫による家屋等の浸水被害を防止することを目標に河川整備を進めて参りました。
- 整備計画策定以降、河道掘削、堤防整備等を進めており、減災対策としては、塚本地区に河川防災ステーションが整備されました。
- 変更河川整備計画では、旧河川整備計画の残事業を実施することに加えて、気候変動による流量増大等への対応分を実施していきます。


河道整備流量の変更に伴う主な整備メニュー

●河川改修事業

整備内容	旧河川整備計画 (H17～R16)			変更河川整備計画 (R9～R38) 全体
	全体	整備済み	進捗率	
堤防整備 (嵩上げ・腹付け)	約19.0km	約13.0km	約68%	約6km
浸透対策	約15.0km	約0.0km	0%	約9.6km
侵食・洗堀対策 (護岸整備)	約10.2km	約2.8km	約28%	約10.6km
河道掘削	約247千m ³	約162千m ³	約66%	約695千m ³
樹木伐開 (維持伐開を除く)	約37,000m ²	約37,000m ²	100%	約1,428m ²
横断工作物の改築	2箇所	1箇所	50%	1箇所
狩野川放水路分流堰改築	—	—	—	1式
その他 (既設狩野川放水路の改築等を含めた洪水調節機能の確保)	—	—	—	1式
内水対策 (四日町排水機場)	—	—	—	1基
地震・津波対策 (耐震対策)	約1,000m	約200m	20%	約800m
地震・津波対策 (狩野川放水路)	—	—	—	約270m
危機管理対策 (河川防災ステーション)	3箇所	1箇所	33%	1箇所
危機管理対策 (CCTV設置)	8基	2基	約25%	6基

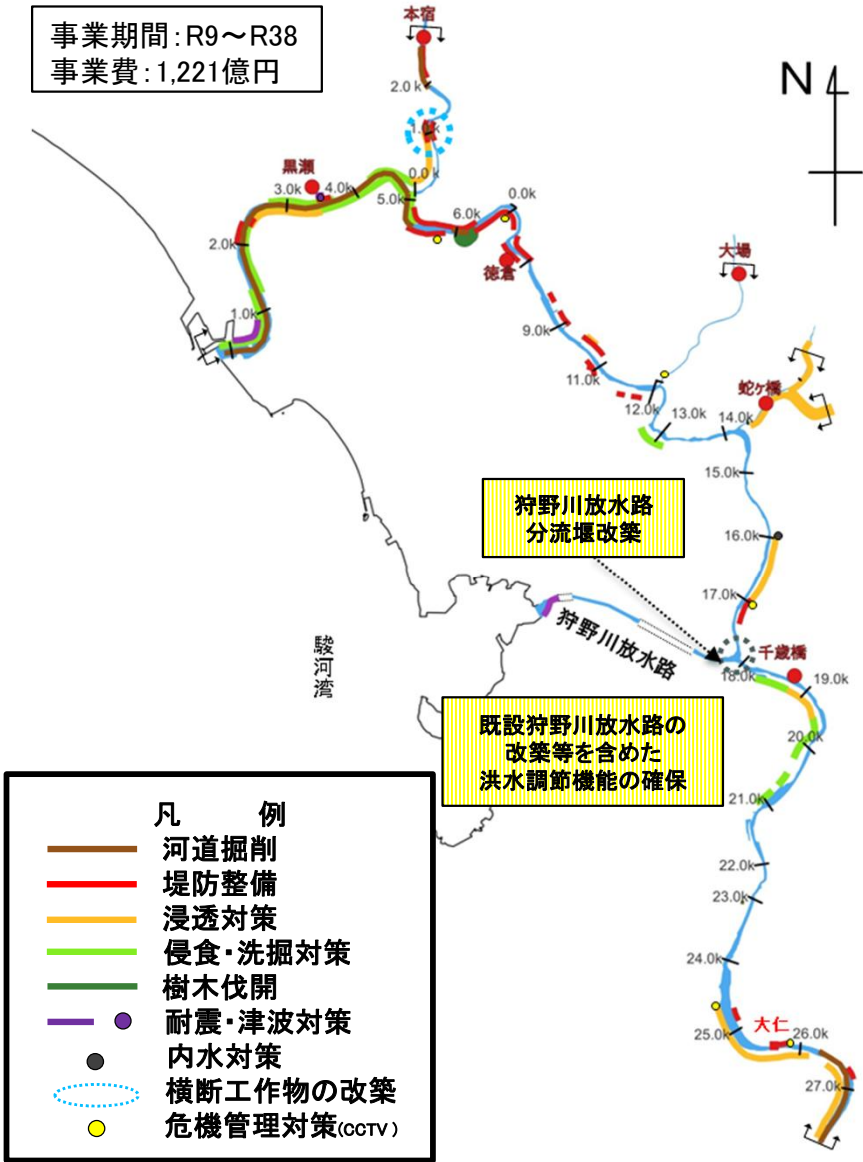


- 当面の段階的な整備(概ね5か年)として、黄瀬川合流点下流において河道掘削を実施するとともに、狩野川放水路下流区間の堤防整備や横断工作物の改築を継続して実施します。
- 中小規模洪水における流域の治水安全度を向上させるため、既設狩野川放水路分流堰の改築を実施します。

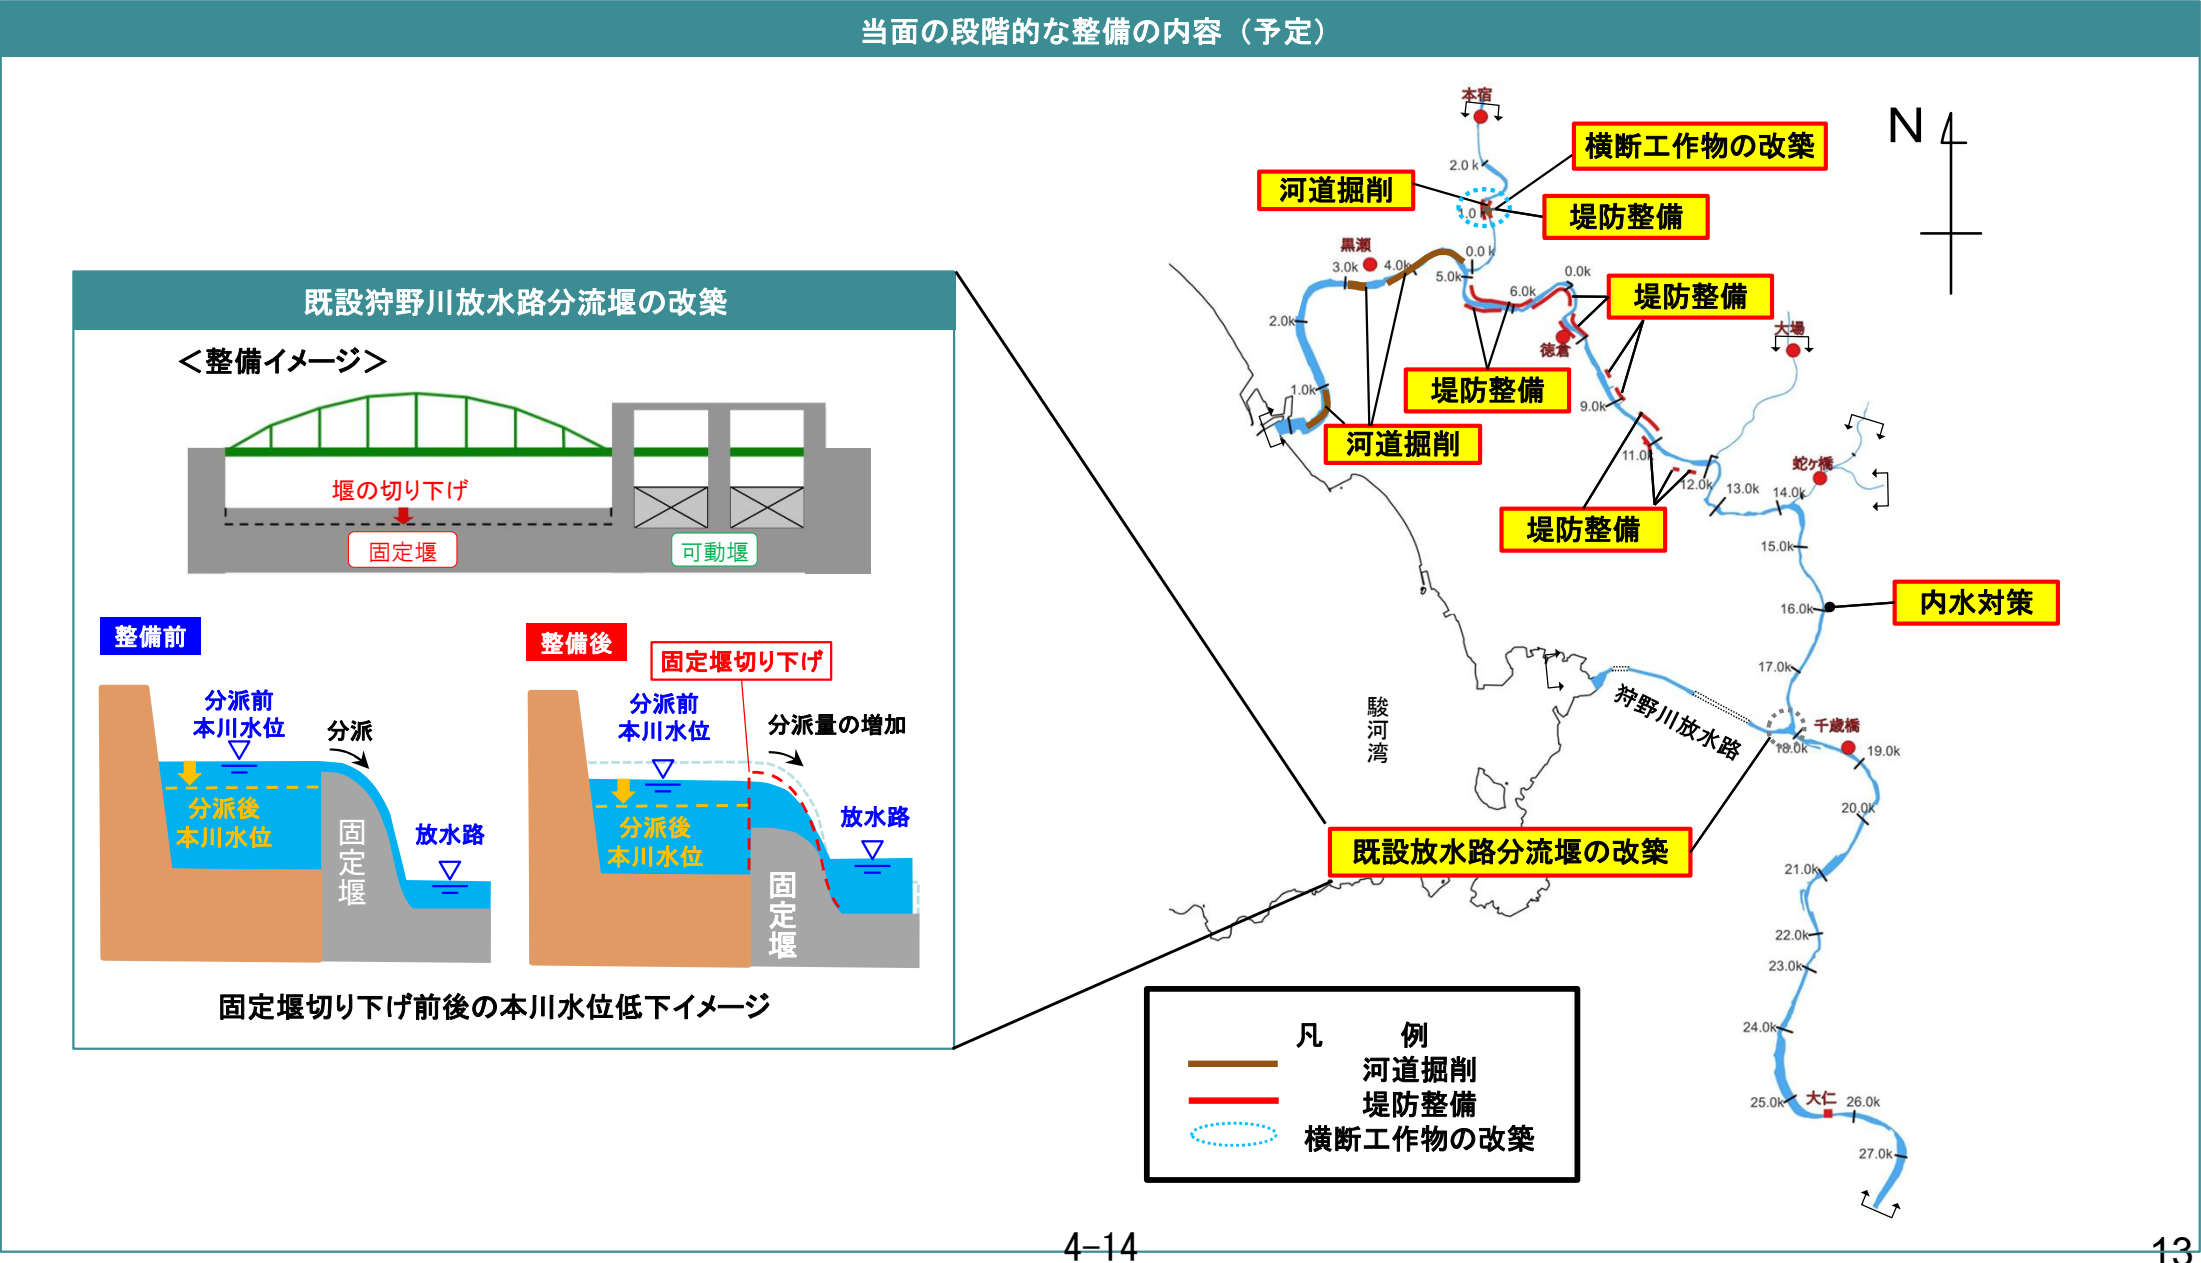

■ 事業実施前に変更河川整備計画目標流量の洪水が発生した場合の被害想定は、氾濫面積約1,700 ha、浸水人口約60,400人、浸水家屋約25,000戸であり、整備を実施することで氾濫面積、浸水人口、浸水家屋が解消されます。

事業実施前後の氾濫想定図(変更河川整備計画規模)

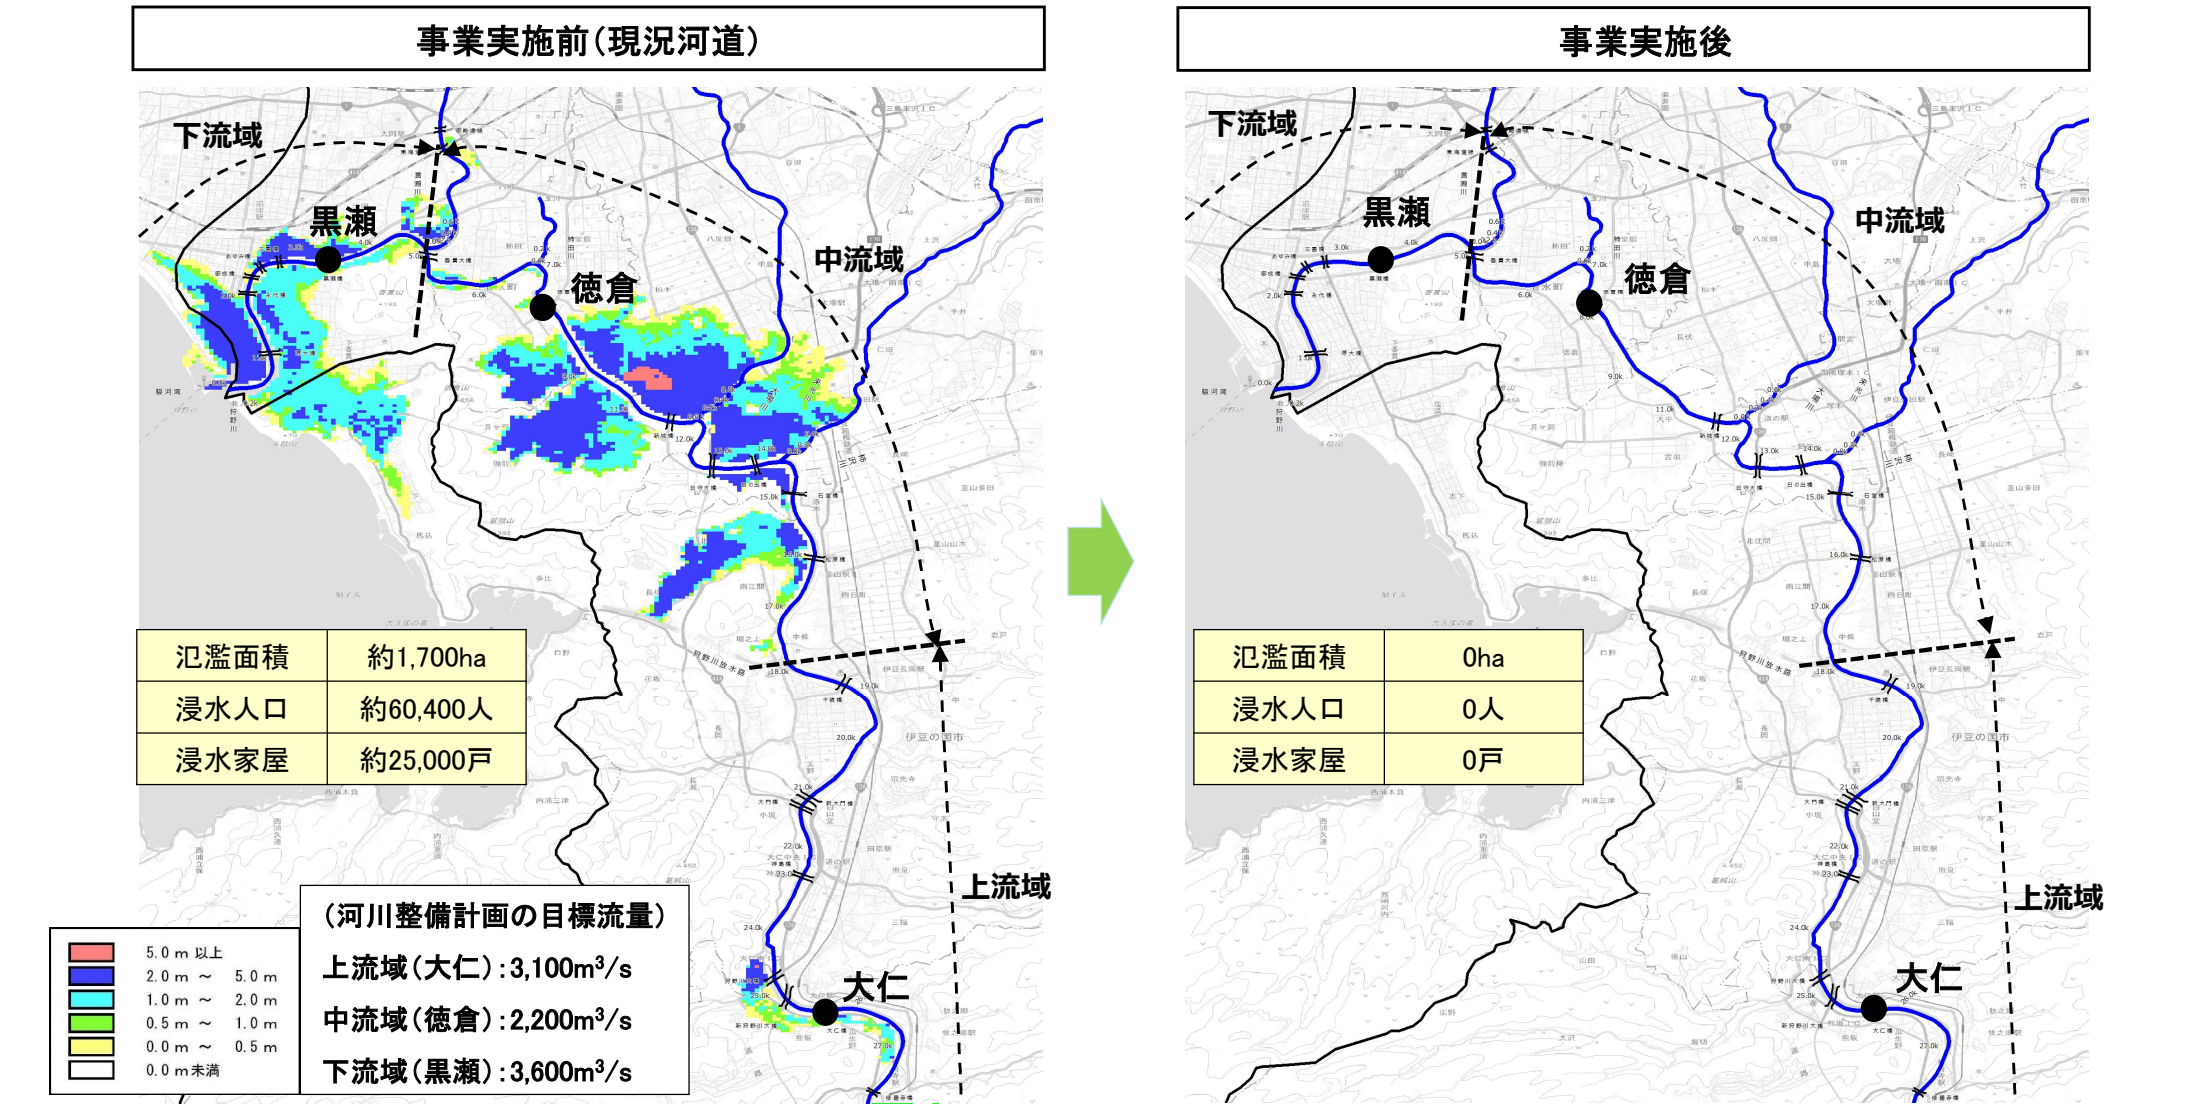

- 事業全体に要する総費用(C)は、約679億円であり、この事業によりもたらされる総便益(B)は約7,185億円となります。
- これをもとに算出される費用対便益比(B/C)は10.6となります。(前回R3評価 B/C = 6.9)
- 前回評価と条件が異なることから参考になりますが、前回評価に比べ費用便益(B/C)が上昇している主な要因は、目標流量の変更に伴い、整備メニューを見直したこと、評価期間・流域資産等が変化したこと、治水経済調査マニュアルの変更に伴い費用から工事諸費・消費税を控除したことによるものと考えています。

感度分析

項目	全体事業評価	前回評価からの 主な変更点
	今回評価(R8) R9 ～ R38	
B/C	10.6	
総便益(B)	約 7,185 億円	・ 目標流量の変更 ・ 評価期間・基準年の変更 ・ 流域資産の変化 ・ 河道評価年次の変更
便益	約 7,180 億円	
一般資産被害	約 3,848 億円	
農作物被害	約 2 億円	
公共土木施設被害	約 2,911 億円	
営業停止被害	約 169 億円	
応急対策費用	約 248 億円	
残存価値	約 5 億円	
総費用(C)	約 679 億円	・ 整備メニュー、事業費の変更 ・ マニュアルの変更
事業費	約 607 億円	
維持管理費	約 72 億円	

(参考)	
全体事業評価	残事業評価
前回評価 (R3)	
H17 ～ R17	
6.9	9.1
約 4,418 億円	約 838 億円
約 4,398 億円	約 835 億円
約 2,335 億円	約 445 億円
約 4 億円	約 0 億円
約 1,822 億円	約 346 億円
約 88 億円	約 16 億円
約 149 億円	約 28 億円
約 21 億円	約 3 億円
約 640 億円	約 92 億円
約 590 億円	約 75 億円
約 51 億円	約 17 億円

- B/Cは現時点の資産状況や予算状況をもとに算出している。
- 今後、社会情勢の変化により、事業費や資産状況が変動する可能性がある。
- そこで、①事業費、②工期、③資産評価単価を±10%変動させた場合のB/Cを算出した。

感度分析	全体事業 (B/C)
残事業費 +10% ～ -10%	9.7 ～ 11.6
残工期 -10% ～ +10%	10.1 ～ 11.0
資産額 -10% ～ +10%	9.6 ～ 11.6

総便益(B)：評価時点を現在価値化の基準時点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象期間にして、年平均被害軽減期待額を割引率を用いて現在価値化したものの総和

残存価値：将来において施設が有している価値

総費用(C)：評価時点を現在価値化の基準時点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から50年間までを評価対象期間にして、建設費と維持管理費を割引率を用いて現在価値化したものの総和

建設費：治水施設の完成に要する費用

維持管理費：治水施設の維持管理に要する費用

割引率：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」により4.0%とした。

※評価基準年:令和8年度(令和8年度現在価値)

※評価対象事業：当面の目標（概ね30年）に対する河川改修事業

※総便益(B)は整備実施による浸水被害軽減額より算出

参考比較


社会的 割引率※	総便益 (B)	総費用 (C)	B/C
4%	約 7,185 億円	約 679 億円	10.6
2%	約 13,178 億円	約 895 億円	14.7
1%	約 19,024 億円	約 1,056 億円	18.0

※R8年度以降の社会的割引率を2%及び1%とした場合のB/Cを算定

■ 近年の水害においては人的被害、交通途絶、ライフライン途絶、サプライチェーンの寸断による経済波及被害、地下施設被害等、社会的影響が非常に大きくなっていることから、「水害の被害指標分析の手引(H25試行版)」により、定量的な推計を行いました。



評価項目	
直接被害	
資産被害	
一般資産被害	家屋、家庭用品、事業所償却資産、事業所在庫資産 農漁家償却資産、農漁家在庫資産
農産物被害	浸水による農作物の被害
公共土木施設等被害	公共土木施設、公共事業施設、農地、農業用施設の浸水被害
①人的被害	
人的被害	死者数、孤立者数、避難者数など
間接被害	
稼働被害	
営業停止被害	家計
	事業所
	公共・公益サービス
応急対策費用	家計
	事業所
	国・地方公共団体
②社会機能低下被害	
医療・社会福祉施設等の機能低下による被害	医療施設、社会福祉施設等
防災拠点施設の機能低下による被害	役所、警察、消防等の防災拠点施設
③波及被害	
交通途絶による波及被害	道路、鉄道、空港、港湾等
ライフラインの停止による波及被害	電力、水道、ガス、通信等
経済被害の域内・域外への波及被害	事業所
精神的被害	
④その他	
地下空間の被害	
文化施設等の被害	
水害廃棄物の発生	
リスクプレミアム	
水害により地域の社会経済構造が変化する被害	
高度化便益	

- 従前より便益として計上している項目
- 追加・修正を行った項目
- 従前より便益として計上されておらず、今回も定量化をしなかった項目

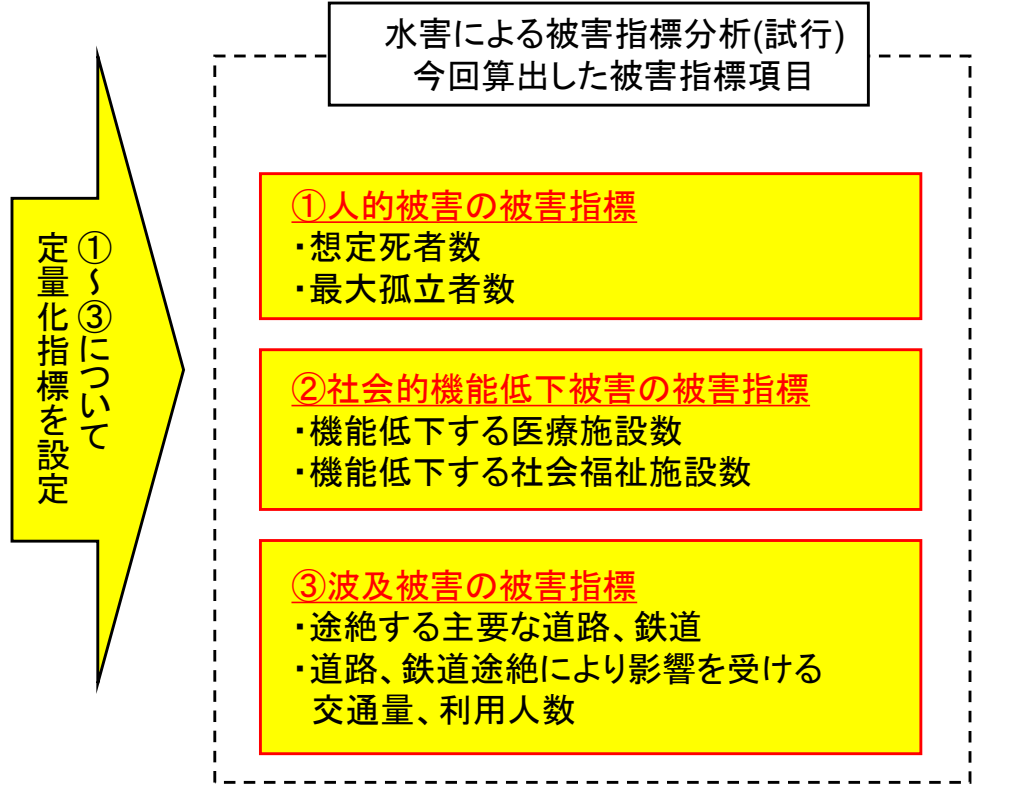

①人的被害の被害指標(想定死者数、最大孤立者数)


■ 河川整備計画目標流量の洪水により想定される浸水が発生した場合、想定死者数は約128人、最大孤立者数は約28,500人と推定されますが、整備を実施することで人的被害は発生しません。

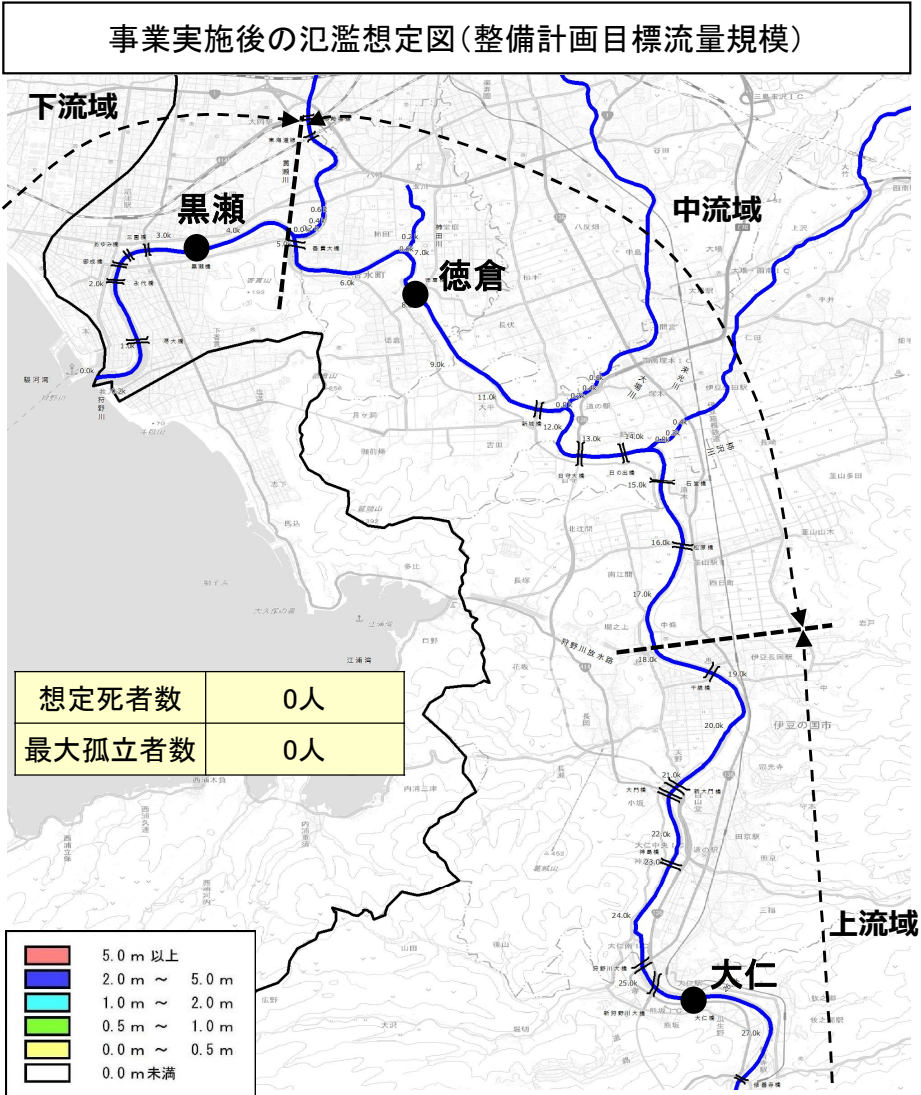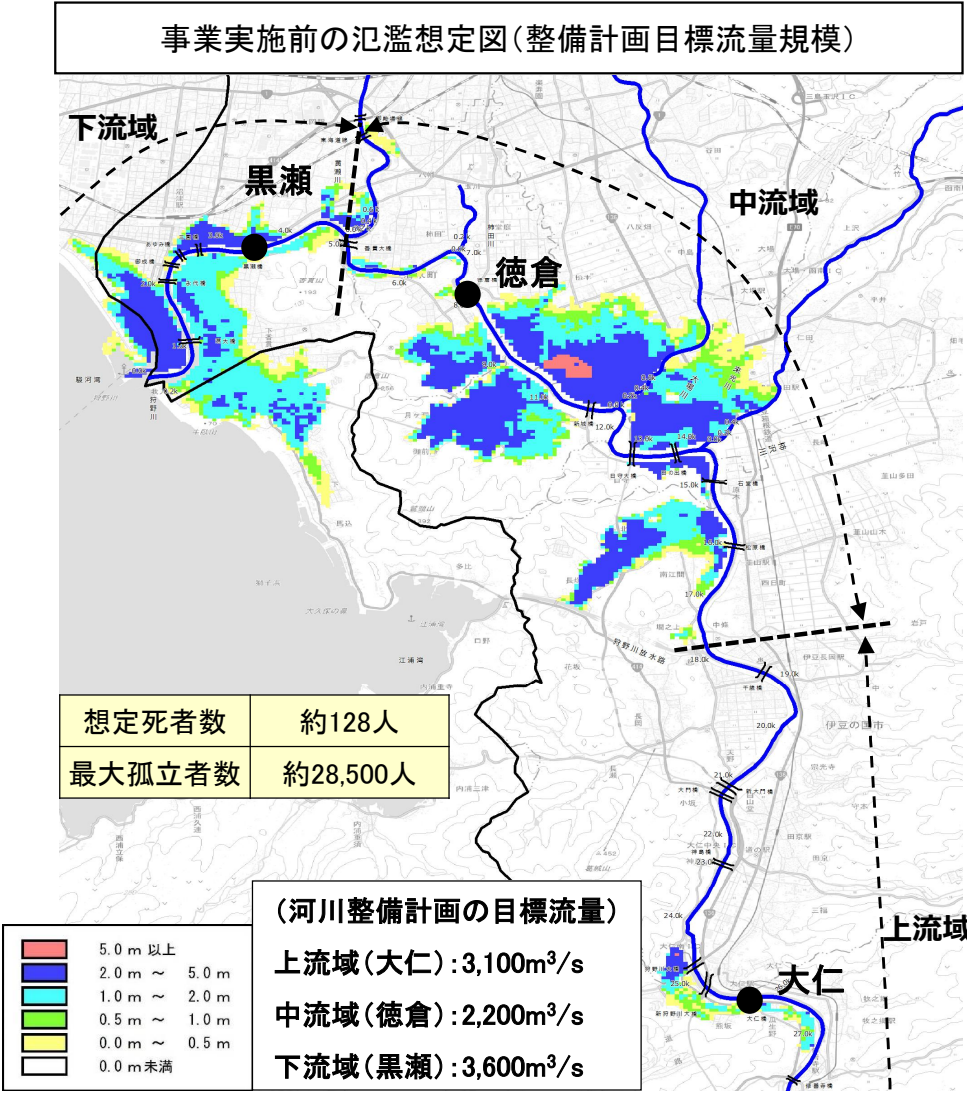


※想定死者数はLIFESimモデルをベースとしたモデルに基づき、年齢別、住居階数別、浸水深別の危険度を勘案して算出した。
※最大孤立者数は、災害時要援護者以外(浸水深50cm以上)、災害時要援護者(浸水深30cm以上)とした。
※避難率:40%

②社会機能低下被害の被害指標(医療施設、社会福祉施設)

■ 河川整備計画目標流量の洪水により想定される浸水が発生した場合、機能低下する医療施設(病院・診療所)は53施設、社会福祉施設は63施設と推定されますが、整備を実施することで解消されます。

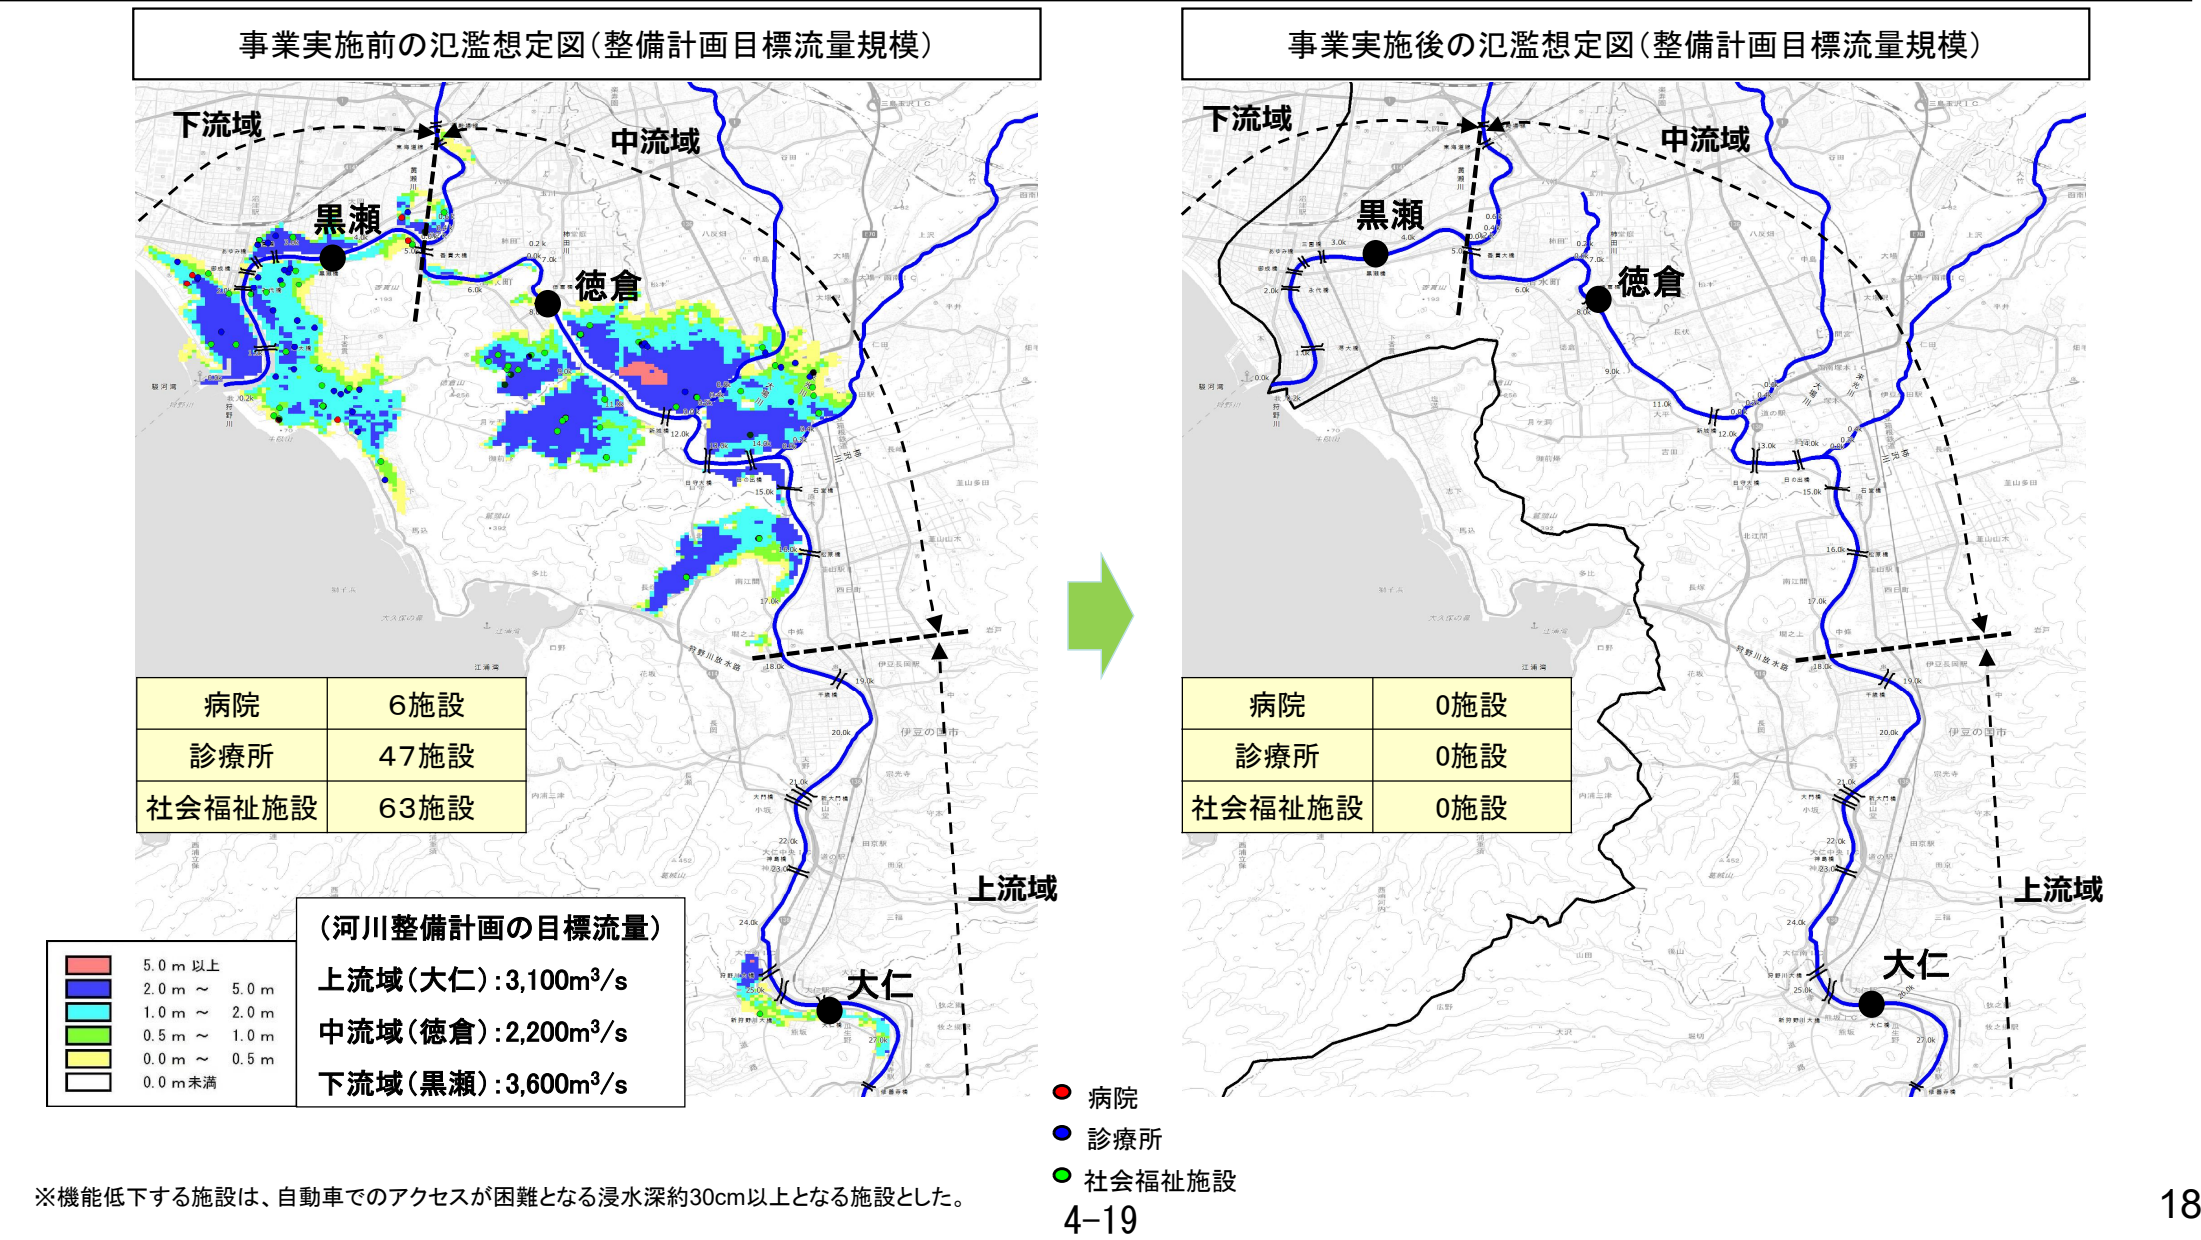

■ 河川整備計画目標流量の洪水により想定される浸水が発生した場合、途絶する主要道路は国道414号(17,681台/24hr)および国道136号(36,527台/日)、主要鉄道は伊豆箱根鉄道(9,825人/日)であり、整備を実施することで交通途絶被害が解消します。



◆コスト縮減の可能性

- 河道掘削により発生する土砂は海岸養浜材や防災ステーション整備時の盛土材等として利活用することを積極的に検討し、コスト縮減を図っていきます。
- 事業実施の各段階において、工法の工夫や新技術の採用などによるコスト縮減や工期短縮等に努めます。
- 樹木伐開に合わせて天地返しや伐採木の配布を積極的に行うことで廃棄物の総量を減らし、コスト縮減を図っていきます。

河道掘削土砂の利活用



海岸養浜への掘削残土の活用



防災ステーション整備への掘削残土の活用

刈草や樹木の無償提供



伐採木の配布による処分料コスト縮減

◆代替案立案の可能性

- 河川整備計画は、流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものであり、現時点においては河川整備計画における河川改修が最も妥当であると考えます。

■ 再評価における県の意見は下記のとおりです。

都道府県	再評価における意見
静岡県	対応方針（原案）のとおり事業を改善継続することについて、異存はありません。 狩野川流域では、令和元年東日本台風や令和3年の豪雨など度重なる浸水被害に見舞われており、気候変動の影響により更なる豪雨の激甚化・頻発化が想定される中、治水対策に対する地域の要請はますます強くなっております。事業の実施に当たっては、関係者との十分な調整やコスト縮減・効率化などを図りながら、計画的かつ効果的な事業推進により、地域社会が事業効果を早期に享受できるようお願いいたします。

3. 対応方針（原案）

当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みや社会情勢の変化などから河川整備計画を変更し、改善継続することが妥当であると考えます。
