


沿道地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス令和6年2月工事便り

発行 第141号 令和6年2月1日
 豊川分室支部工事等安全協議会
 編集長：大林道路（株）
 TEL 053-438-2622、FAX 053-438-2710
 監修：名四国道事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）
 TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974
 いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問い合わせはこちらまでお願いします。

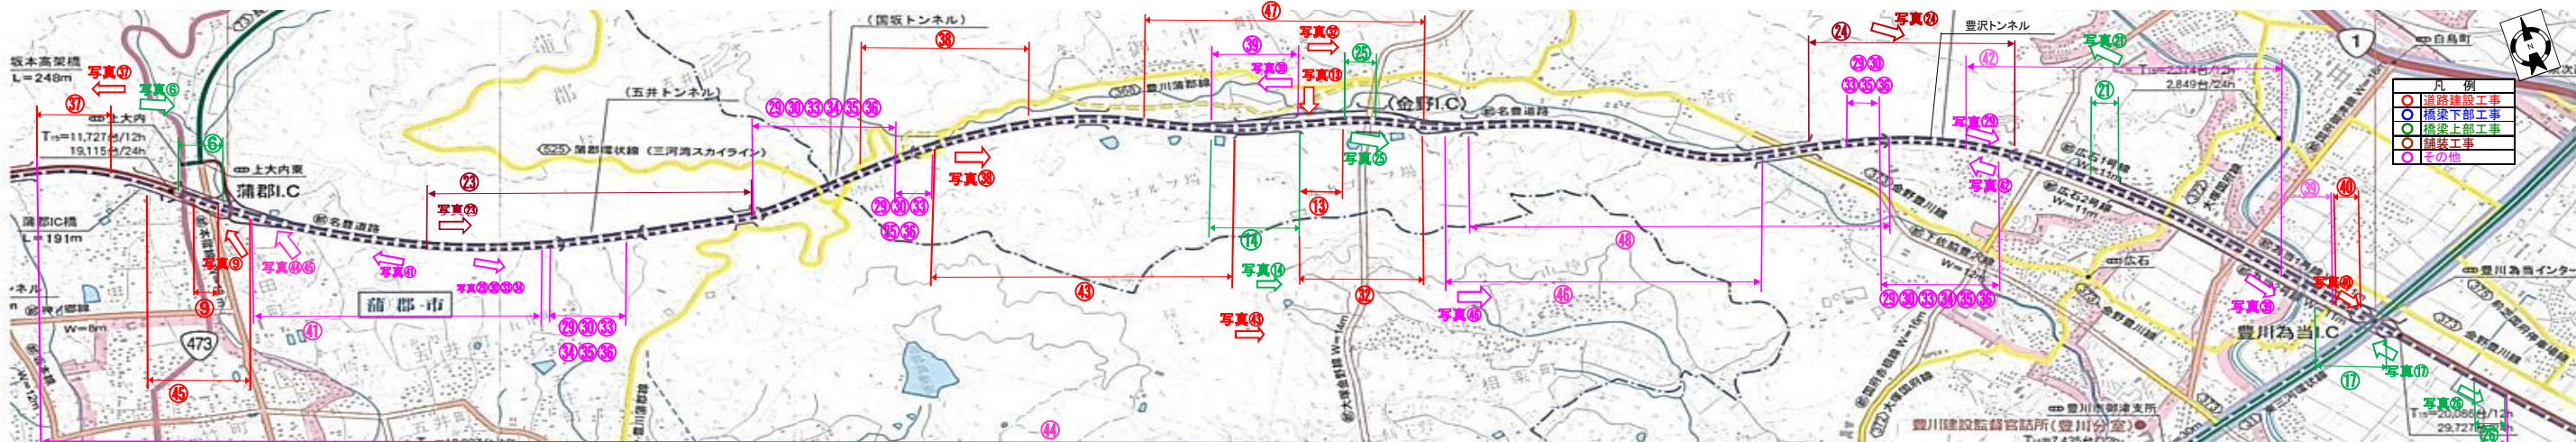

今月の編集長							
6 工事名 令和3年度23号蒲郡BP蒲郡IC橋脚上部工事 工期 令和4年1月7日～令和6年2月29日 施工業者 JFEインフラ（株） TEL 052-561-8622、FAX 052-561-8620 1月末時点進捗率 99% 2月作業予定 後片付け等 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	9 工事名 令和3年度23号蒲郡BP蒲郡IC東道路建設工事 工期 令和4年2月28日～令和6年3月29日 施工業者 （株）加藤建設 TEL 052-383-2985、FAX 052-383-2987 1月末時点進捗率 95% 2月作業予定 道路土工、床版工、排水構造物工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の道路をつくっています。	13 工事名 令和3年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事 工期 令和4年4月1日～令和6年3月27日 施工業者 矢作建設工業（株） TEL 052-935-2352、FAX 052-982-6032 1月末時点進捗率 90% 2月作業予定 擁壁工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。	14 工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野第5橋脚上部工事 工期 令和4年5月25日～令和6年6月18日 施工業者 日本橋梁（株） TEL 052-747-4321、FAX 052-747-4322 1月末時点進捗率 95% 2月作業予定 橋梁付属物工、床版工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	17 工事名 令和4年度23号蒲郡BP為当IC橋脚上部工事 工期 令和4年6月1日～令和6年5月31日 施工業者 三井住友建設鉄構インフラ（株） TEL 0533-95-0305、FAX 0533-95-0306 1月末時点進捗率 84% 2月作業予定 橋梁付属物工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	21 工事名 令和4年度23号蒲郡BP広石第1橋脚上部工事 工期 令和4年9月12日～令和6年5月31日 施工業者 大日本土木（株） TEL 052-201-4244、FAX 052-212-3504 1月末時点進捗率 97% 2月作業予定 床版工、支承工、橋梁付属物工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	24 工事名 令和4年度23号蒲郡BP五井トンネル舗装工事 工期 令和4年11月28日～令和6年2月29日 施工業者 大林道路（株） TEL 053-438-2622、FAX 053-438-2710 1月末時点進捗率 38% 2月作業予定 排水構造物工、舗装工 工事概要 五井地区でバイパス本線の舗装をしています。	
名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

24 工事名 令和4年度23号蒲郡BP豊沢トンネル舗装工事 工期 令和4年12月1日～令和6年2月29日 施工業者 福田道路（株） TEL 052-218-6820、FAX 052-218-6821 1月末時点進捗率 55% 2月作業予定 側帯工 工事概要 豊沢地区でバイパス本線の舗装をしています。	25 工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野第6橋脚上部工事 工期 令和5年1月18日～令和6年5月31日 施工業者 川田工業（株） TEL 0877-32-5115、FAX 0877-32-7267 1月末時点進捗率 84% 2月作業予定 架設工、床版工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	26 工事名 令和4年度23号蒲郡BP為当OFFランプPC上部工事 工期 令和5年1月19日～令和6年3月25日 施工業者 川田建設（株） TEL 052-222-3310、FAX 052-222-3315 1月末時点進捗率 99% 2月作業予定 橋梁足場工、橋梁防護工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。	29 工事名 令和4年度23号蒲郡BPラジオ再放送設備工事 工期 令和5年2月1日～令和6年6月28日 施工業者 イシデンインフラ（株） TEL 052-419-1410、FAX 052-419-1414 1月末時点進捗率 18% 2月作業予定 製作工 工事概要 ラジオ再放送設備をつくっています。	30 工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル機械設備工事 工期 令和5年2月1日～令和6年5月31日 施工業者 （株）ミソタ TEL 0952-45-8806、FAX 0952-45-8314 1月末時点進捗率 43% 2月作業予定 製作工 工事概要 トンネルの機械設備をつくっています。	32 工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野IC東道路建設工事 工期 令和5年3月1日～令和6年3月29日 施工業者 吉川建設（株） TEL 052-211-7700、FAX 052-211-7788 1月末時点進捗率 60% 2月作業予定 擁壁工、排水構造物工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。	33 工事名 令和4年度23号蒲郡BP受変電設備工事 工期 令和5年3月1日～令和6年6月28日 施工業者 （株）野原電建 TEL 058-201-6014、FAX 058-213-6037 1月末時点進捗率 1% 2月作業予定 製作工 工事概要 バイパスの受変電設備をつくっています。
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

* 丸数字は、①番から工事の始まった順番です。
 * 今年度に完成した工事は、欠番です。

裏面へつづく

表面のつづき

<p>③④</p> <p>工事名 令和4年度23号蒲郡BPCCTV設備設置工事 工期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施工業者 朝日電気工業(株) TEL 052-471-3265, FAX 052-471-3456 1月末時点進捗率 16% 2月作業予定 製作工 工事概要 バイパスのCCTV設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>③⑤</p> <p>工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事 工期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施工業者 コイト電気(株) TEL 052-939-3970, FAX 052-939-3971 1月末時点進捗率 50% 2月作業予定 機器製作工 工事概要 バイパスのトンネル防災設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>③⑥</p> <p>工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル照明設備設置工事 工期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施工業者 シークューブ(株) TEL 052-563-5073, FAX 052-563-5074 1月末時点進捗率 71% 2月作業予定 材料製作工 工事概要 バイパスのトンネル照明設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>③⑦</p> <p>工事名 令和4年度23号蒲郡BP清田地区道路建設工事 工期 令和5年3月29日～令和6年3月29日 施工業者 (株)竹中土木 TEL 052-231-2121, FAX 052-231-2529 1月末時点進捗率 75% 2月作業予定 道路土工,擁壁工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>③⑧</p> <p>工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野西道路建設工事 工期 令和5年4月10日～令和6年2月29日 施工業者 ヤハギ道路(株) TEL 0565-46-6211, FAX 0565-46-6233 1月末時点進捗率 89% 2月作業予定 道路土工,擁壁工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線、県道をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>③⑨</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP床版工事 工期 令和5年5月10日～令和6年5月31日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191, FAX 0533-88-5017 1月末時点進捗率 86% 2月作業予定 地覆・壁高欄工 工事概要 豊川市御津町金野と為当町で橋の床版をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>④⑩</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP道路建設工事 工期 令和5年6月24日～令和6年3月29日 施工業者 (株)近藤組 TEL 0566-36-1812, FAX 0566-36-1825 1月末時点進捗率 88% 2月作業予定 躯体工 工事概要 豊川市為当町でON・OFFランプの道路をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
---	--	--	--	--	--	---

<p>④⑪</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP五井清田地区整備工事 工期 令和5年10月5日～令和6年9月30日 施工業者 丸洋建設(株) TEL 0563-54-7412, FAX 0563-54-0280 1月末時点進捗率 12% 2月作業予定 調整池工 工事概要 蒲郡市五井清田地区で整備工事を行っています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>④⑫</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP広石道路建設工事 工期 令和5年10月6日～令和6年9月30日 施工業者 山旺建設(株) TEL 0563-56-3194, FAX 0563-54-0903 1月末時点進捗率 15% 2月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>豊橋側から名古屋側を望む</p>	<p>④⑬</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野道路建設工事 工期 令和5年11月1日～令和6年5月31日 施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-68-6188, FAX 0533-68-6190 1月末時点進捗率 18% 2月作業予定 道路土工・擁壁工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>豊橋側から名古屋側を望む</p>	<p>④⑭</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP標識設置工事 工期 令和5年11月1日～令和6年9月30日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191, FAX 0533-88-5017 1月末時点進捗率 2% 2月作業予定 準備工 工事概要 バイパスに標識を設置しています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>④⑮</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP蒲郡IC西道路建設工事 工期 令和5年11月6日～令和6年9月30日 施工業者 関興業(株) TEL 0566-23-1437, FAX 0566-24-2866 1月末時点進捗率 3% 2月作業予定 調整池工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパスの調整池をつくっています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>④⑯</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP東整備工事 工期 令和5年11月17日～令和6年7月31日 施工業者 日越建設(株) TEL 0532-39-9242, FAX 0532-39-9243 1月末時点進捗率 6% 2月作業予定 道路土工 工事概要 豊川市御津町で整備工事を行っています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>④⑰</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事 工期 令和5年12月12日～令和6年10月31日 施工業者 矢作建設工業(株) TEL 052-935-2352, FAX 052-982-6032 1月末時点進捗率 0% 2月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくります。</p> <p>準備中</p>
---	---	---	---	--	---	---

<p>④⑱</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野東舗装工事 工期 令和5年12月12日～令和6年10月31日 施工業者 東亜道路工業(株) TEL 052-962-1831, FAX 052-962-1850 1月末時点進捗率 2% 2月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の舗装をしています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>

編集長からの一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解 ご協力賜り、心よりお礼申し上げます。

2月度の工事便りの編集長になりました
「大林道路株式会社 現場代理人 権藤」と申します。

私どもが施工している【令和4年度23号蒲郡BP五井トンネル舗装工事】では金野ICから蒲郡ICの区間にある五井トンネル(明かり部を含む)のコンクリート舗装を行う工事を施工しております。

工事期間中は地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、安全第一で工事を進めさせていただきます。引き続き、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。工事中に何かお気づきの点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。



OBAYASHI ROAD



令和4年度23号蒲郡BP五井トンネル舗装工事
大林道路株式会社 権藤 光生

建設クイズ

Q 建設現場では手押しの一輪車のことをある動物に例えます。その動物とは何でしょうか

- ① ネコ
- ② トラ
- ③ ウマ



答えは 左下にあります
