


沿道地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

発行 第143号 令和6年4月1日
 豊川分室支部工事安全協議会
 編集長：川田工業（株）
 TEL 0877-32-5115、FAX 0877-32-7267
 監修：名四国道事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）
 TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974
 いつもご協力ありがとうございます。工事に関するお問合せはこちらまでお願いいたします。

蒲郡バイパス令和6年4月工事便り



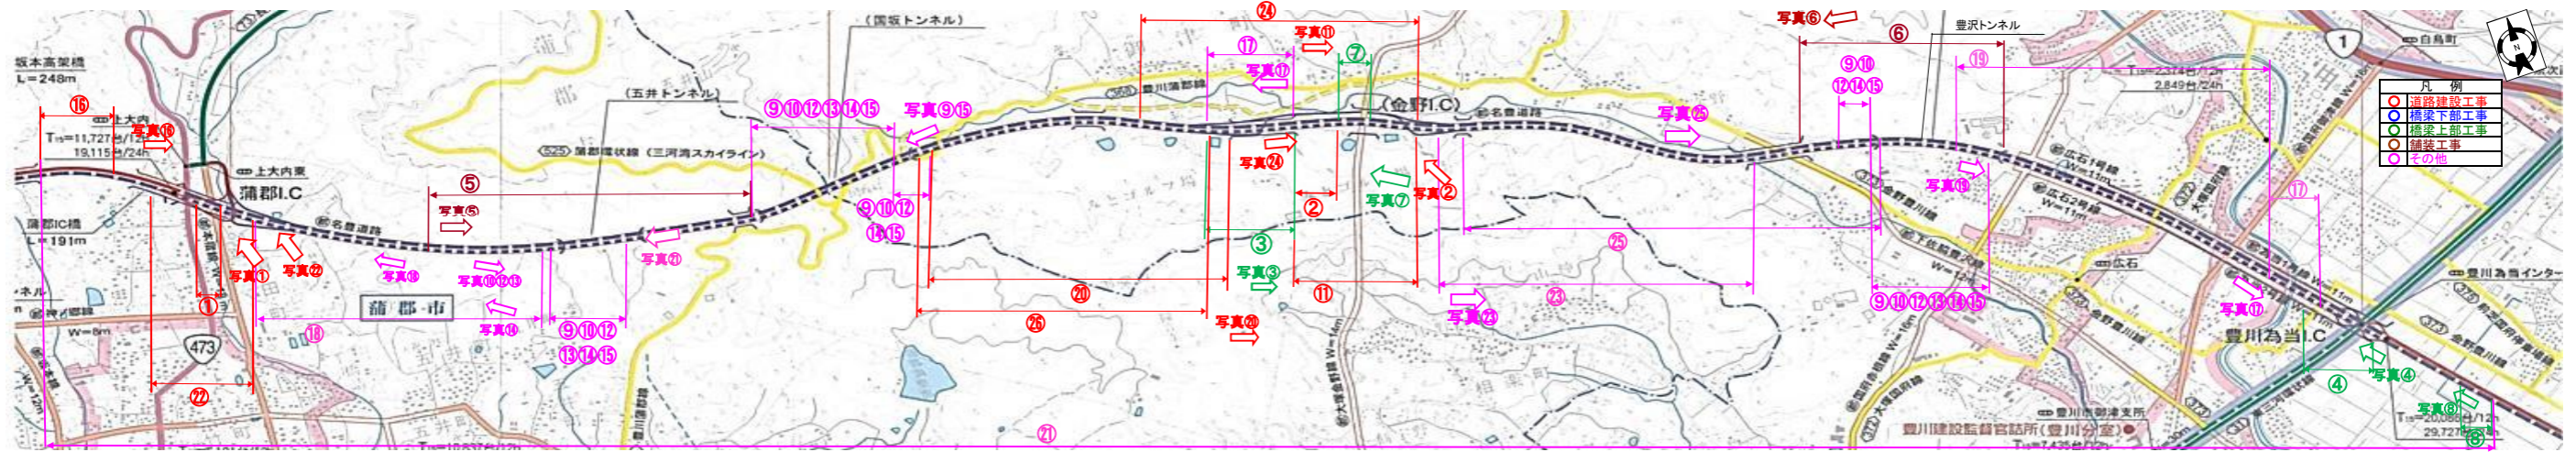






⑦ 今月の編集長						
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
工事名 令和3年度23号蒲郡BP蒲郡IC東道路建設工事 工期 令和4年2月28日～令和6年6月28日 施工業者 (株)加藤建設 TEL 052-383-2985、FAX 052-383-2987 3月末時点進捗率 93% 4月作業予定 道路土工、排水構造物工、橋梁足場工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の道路をつくっています。	工事名 令和3年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事 工期 令和4年4月1日～令和6年7月31日 施工業者 矢作建設工業（株） TEL 052-935-2352、FAX 052-982-6032 3月末時点進捗率 94% 4月作業予定 擁壁工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野第5橋脚上部工事 工期 令和4年5月25日～令和6年6月18日 施工業者 日本橋梁（株） TEL 052-747-4321、FAX 052-747-4322 3月末時点進捗率 97% 4月作業予定 橋梁付属物工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP為当IC橋脚上部工事 工期 令和4年6月1日～令和6年5月31日 施工業者 三井住友建設鉄構インテグレーション（株） TEL 0533-95-0305、FAX 0533-95-0306 3月末時点進捗率 96% 4月作業予定 足場工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP五井トンネル舗装工事 工期 令和4年11月28日～令和6年5月31日 施工業者 大林道路（株） TEL 053-438-2622、FAX 053-438-2710 3月末時点進捗率 59% 4月作業予定 舗装工 工事概要 五井地区でバイパス本線の舗装をしています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP豊沢トンネル舗装工事 工期 令和4年12月1日～令和6年6月28日 施工業者 福田道路（株） TEL 052-218-6820、FAX 052-218-6821 3月末時点進捗率 66% 4月作業予定 排水構造物工 工事概要 豊沢地区でバイパス本線の舗装をしています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野第6橋脚上部工事 工期 令和5年1月18日～令和6年5月31日 施工業者 川田工業（株） TEL 0877-32-5115、FAX 0877-32-7267 3月末時点進捗率 91% 4月作業予定 床版工、地覆壁高欄工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。
豊橋側より名古屋側を望む 工期延期しました！	名古屋側より豊橋側を望む 工期延期しました！	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	溪流施設施工状況	豊橋側より名古屋側を望む

⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
工事名 令和4年度23号蒲郡BP為当OFFランプPC上部工事 工期 令和5年1月19日～令和6年5月31日 施工業者 **川田建設（株）** TEL 052-222-3310、FAX 052-222-3315 3月末時点進捗率 **99%** 4月作業予定 橋梁足場工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BPラジオ再放送設備工事 工期 令和5年2月1日～令和6年6月28日 施工業者 **イシデンインテグレーション（株）** TEL 052-419-1410、FAX 052-419-1414 3月末時点進捗率 **21%** 4月作業予定 製作工、設備設置工 工事概要 ラジオ再放送設備をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル機械設備工事 工期 令和5年2月1日～令和6年5月31日 施工業者 **(株)ミソタ** TEL 0952-45-8806、FAX 0952-45-8314 3月末時点進捗率 **70%** 4月作業予定 製作工、設備設置工 工事概要 トンネルの機械設備をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野IC東道路建設工事 工期 令和5年3月1日～令和6年7月26日 施工業者 **吉川建設（株）** TEL 052-211-7700、FAX 052-211-7788 3月末時点進捗率 **68%** 4月作業予定 擁壁工、排水構造物工、踏掛版工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP受変電設備工事 工期 令和5年3月1日～令和6年6月28日 施工業者 **(株)野原電建** TEL 058-201-6014、FAX 058-213-6037 3月末時点進捗率 **90%** 4月作業予定 製作工、配管配線工 工事概要 バイパスの受変電設備をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BP CCTV設備設置工事 工期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施工業者 **朝日電気工業（株）** TEL 052-471-3265、FAX 052-471-3456 3月末時点進捗率 **15%** 4月作業予定 製作工 工事概要 バイパスのCCTV設備をつくっています。	工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事 工期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施工業者 **コイト電気（株）** TEL 052-939-3970、FAX 052-939-3971 3月末時点進捗率 **51%** 4月作業予定 機器製作工 工事概要 バイパスのトンネル防災設備をつくっています。
豊橋側より名古屋側を望む **工期延期しました！**	製作工一部完了状況	製作工一部完了状況	名古屋側より豊橋側を望む **工期延期しました！**	発電機室機器搬入状況	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

* 丸数字は、①番から工事の始まった順番です。
 * 今年度に完成した工事は、欠番です。

裏面へつづく

表面のつづき

<p>15</p> <p>工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル照明設備設置工事 工期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施工業者 シーキューブ(株) TEL052-563-5073, FAX052-563-5074 3月末時点進捗率 75% 4月作業予定 トンネル照明設備設置工 工事概要 バイパスのトンネル照明設備をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>16</p> <p>工事名 令和4年度23号蒲郡BP清田地区道路建設工事 工期 令和5年3月29日～令和6年6月28日 施工業者 (株)竹中土木 TEL 052-231-2121, FAX 052-231-2529 3月末時点進捗率 92% 4月作業予定 道路土工、法面工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>17</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP床版工事 工期 令和5年5月10日～令和6年5月31日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191, FAX0533-88-5017 3月末時点進捗率 82% 4月作業予定 地覆壁高欄工 工事概要 豊川市御津町金野と為当町で橋の床版をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>18</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP五井清田地区整備工事 工期 令和5年10月5日～令和6年9月30日 施工業者 丸洋建設(株) TEL 0563-54-7412, FAX 0563-54-0280 3月末時点進捗率 11% 4月作業予定 調整池工 工事概要 蒲郡市五井清田地区で整備工事を行っています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>19</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP広石道路建設工事 工期 令和5年10月6日～令和6年9月30日 施工業者 山旺建設(株) TEL 0563-56-3194, FAX 0563-54-0903 3月末時点進捗率 21% 4月作業予定 左側側道工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>20</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野道路建設工事 工期 令和5年11月1日～令和6年5月31日 施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-68-6188, FAX 0533-68-6190 3月末時点進捗率 30% 4月作業予定 道路土工・擁壁工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>豊橋側から名古屋側を望む</p>	<p>21</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP標識設置工事 工期 令和5年11月1日～令和6年9月30日 施工業者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191, FAX 0533-88-5017 3月末時点進捗率 8% 4月作業予定 大型標識工 工事概要 バイパスに標識を設置しています。</p>  <p>豊橋側から名古屋側を望む</p>
---	--	---	---	---	--	---

工期延期しました！

<p>22</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP蒲郡IC西道路建設工事 工期 令和5年11月6日～令和6年9月30日 施工業者 関興業(株) TEL 0566-23-1437, FAX 0566-24-2866 3月末時点進捗率 19% 4月作業予定 調整池工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパスの調整池をつくっています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>23</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP東整備工事 工期 令和5年11月17日～令和6年7月31日 施工業者 日建建設(株) TEL 0532-39-9242, FAX 0532-39-9243 3月末時点進捗率 32% 4月作業予定 道路土工、法面工 工事概要 豊川市御津町で整備工事を行っています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>24</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事 工期 令和5年12月12日～令和6年10月31日 施工業者 矢作建設工業(株) TEL 052-935-2352, FAX 052-982-6032 3月末時点進捗率 3% 4月作業予定 地盤改良工、法面工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>25</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野東舗装工事 工期 令和5年12月12日～令和6年10月31日 施工業者 東亜道路工業(株) TEL 052-962-1831, FAX 052-962-1850 3月末時点進捗率 15% 4月作業予定 道路土工、排水構造物工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の舗装をしています。</p>  <p>名古屋側から豊橋側を望む</p>	<p>26</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野西舗装工事 工期 令和6年2月20日～令和6年12月27日 施工業者 フジタ道路(株) TEL 059-367-7165, FAX 059-367-7166 3月末時点進捗率 0% 4月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の舗装をします。</p> <p>準備中</p>	<p>27</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP清田地区舗装工事 工期 令和6年3月1日～令和6年12月27日 施工業者 大有建設(株) TEL 0568-81-0240, FAX 0568-81-7632 3月末時点進捗率 0% 4月作業予定 準備工 工事概要 蒲郡市清田地区でバイパス本線の舗装をします。</p> <p>準備中</p>	<p>28</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野IC舗装工事 工期 令和6年3月1日～令和6年12月27日 施工業者 岐建(株) TEL 0584-81-2121, FAX 0584-81-2364 3月末時点進捗率 0% 4月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の舗装をします。</p> <p>準備中</p>
---	--	---	--	--	--	---

新規工事です！

新規工事です！

新規工事です！

<p>29</p> <p>工事名 令和5年度23号蒲郡BP為当舗装工事 工期 令和6年3月1日～令和6年12月27日 施工業者 世紀東急工業(株) TEL 0567-68-1704, FAX 0567-68-8189 3月末時点進捗率 0% 4月作業予定 準備工 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の舗装をします。</p> <p>準備中</p>

新規工事です！

3月末で完成した工事

工事名	施工業者
令和4年度 23号蒲郡BP広石第1橋PC上部工事	大日本土木(株)
令和4年度 23号蒲郡BP金野西道路建設工事	ヤハギ道路(株)
令和5年度 23号蒲郡BP道路建設工事	(株)近藤組

編集長からの一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しましては地域の皆様のご理解ご協力を賜わり、心より御礼申し上げます。

令和6年4月度の工事便り編集長になりました
「川田工業株式会社 担当技術者 小鹿」と申します。

私どもが現在施工している【令和4年度23号蒲郡BP金野第6橋鋼上部工事】では、豊川市御津町においてバイパス本線の鋼橋架設から床版コンクリートの打設を行います。
現在、鋼橋架設の施工完了し、床版コンクリートの打設を行っております。

工事期間中は地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、安全第一で工事を進めさせていただきます。引き続きご理解ご協力の程宜しくお願い致します。
工事中に何かお気づきの点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。



令和4年度 23号蒲郡BP金野第6橋鋼上部工事
川田工業株式会社 担当技術者 小鹿 竜昇

建設クイズ

Q.
鋼橋には食べ物の名前が使われている構造があります。
その食べ物とは何でしょう？

- ① パスタ 
- ② ラーメン 
- ③ うどん 

答えは 左下にあります
