


沿道地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス令和5年11月工事便り

発行 第138号 令和5年11月1日  
 豊川分室支部工事等安全協議会  
 編集長：藤城建設（株）  
 TEL 0532-31-4131, FAX 0532-31-4147  
 監修 名古屋事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）  
 TEL 0533-31-2951, FAX 0533-76-2974  
 いづれに工事の進捗状況が異なります。工事する関係会社により多少の誤りがあります。

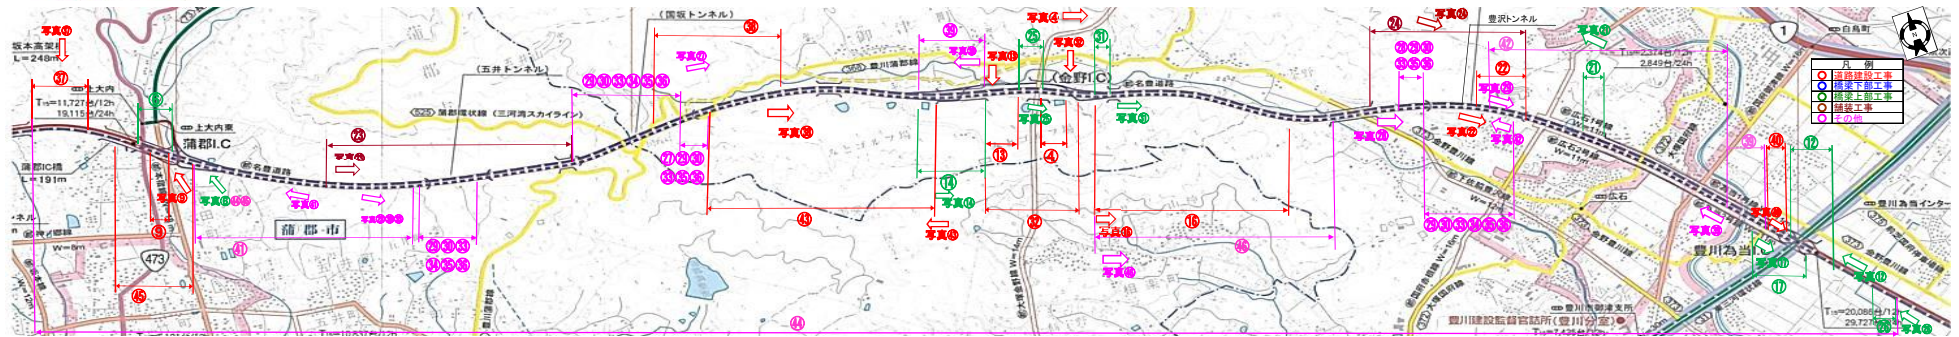

④	⑥	⑨	⑫	⑬	⑭	⑯
<b>工事名</b> 令和3年度23号蒲郡BP金野IC東道路建設工事 <b>工期</b> 令和3年8月17日～令和5年10月31日 <b>施工業者</b> 木村建設（株） TEL 0533-75-8530, FAX 0533-75-6531 <b>10月末時点進捗率</b> 100% <b>11月作業予定</b> — <b>工事概要</b> 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくりました。	<b>工事名</b> 令和3年度23号蒲郡BP蒲郡IC橋脚上部工事 <b>工期</b> 令和4年1月7日～令和5年12月22日 <b>施工業者</b> JFEインフラ（株） TEL 052-561-8622, FAX 052-561-8620 <b>10月末時点進捗率</b> 96% <b>11月作業予定</b> 橋梁付属物工,準備工 <b>工事概要</b> 蒲郡市清田町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	<b>工事名</b> 令和3年度23号蒲郡BP蒲郡IC東道路建設工事 <b>工期</b> 令和4年2月28日～令和5年12月22日 <b>施工業者</b> (株)加藤建設 TEL 052-383-2985, FAX 052-383-2987 <b>10月末時点進捗率</b> 76% <b>11月作業予定</b> 道路土工,擁壁工,床版工 <b>工事概要</b> 蒲郡市清田町でバイパス本線の道路をつくりました。	<b>工事名</b> 令和3年度23号蒲郡BP為当高架橋PC上部工事 <b>工期</b> 令和4年4月1日～令和5年12月22日 <b>施工業者</b> 日本高庄コンクリート（株） TEL 03-6206-2461, FAX 03-6206-2441 <b>10月末時点進捗率</b> 99% <b>11月作業予定</b> 橋梁付属物工 <b>工事概要</b> 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	<b>工事名</b> 令和3年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事 <b>工期</b> 令和4年4月1日～令和6年3月27日 <b>施工業者</b> 矢作建設工業（株） TEL 052-935-2952, FAX 052-982-6032 <b>10月末時点進捗率</b> 74% <b>11月作業予定</b> 擁壁工 <b>工事概要</b> 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくりました。	<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP金野第5橋脚上部工事 <b>工期</b> 令和4年5月25日～令和6年6月18日 <b>施工業者</b> 日本橋梁（株） TEL 052-747-4321, FAX 052-747-4322 <b>10月末時点進捗率</b> 70% <b>11月作業予定</b> 橋梁付属物工,床版工 <b>工事概要</b> 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	<b>工事名</b> 令和3年度23号蒲郡BP金野東地区道路建設工事 <b>工期</b> 令和4年6月1日～令和5年11月30日 <b>施工業者</b> 藤城建設（株） TEL 0532-31-4131, FAX 0532-31-4147 <b>10月末時点進捗率</b> 99% <b>11月作業予定</b> 準備工,法面工 <b>工事概要</b> 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくりました。
名古屋側より豊橋側を望む 完成しました。	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む


今月の編集長

⑰	⑰	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP為当IC橋脚上部工事 <b>工期</b> 令和4年6月1日～令和6年5月31日 <b>施工業者</b> 三井住友建設鉄構インフラ（株） TEL 0533-95-0306, FAX 0533-95-0306 <b>10月末時点進捗率</b> 69% <b>11月作業予定</b> 床版工 <b>工事概要</b> 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP石第1橋PC上部工事 <b>工期</b> 令和4年9月12日～令和6年5月31日 <b>施工業者</b> 大日本土木（株） TEL 052-201-4244, FAX 052-212-3504 <b>10月末時点進捗率</b> 78% <b>11月作業予定</b> 床版工,支承工,橋梁付属物工 <b>工事概要</b> 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP豊沢道路建設工事 <b>工期</b> 令和4年9月16日～令和5年11月30日 <b>施工業者</b> (株)近藤組 TEL 0566-36-1812, FAX 0566-36-1825 <b>10月末時点進捗率</b> 99% <b>11月作業予定</b> グラウンド・コート施設工 <b>工事概要</b> 豊川市御津町で御津高校のグラウンド復旧工事を行っています。	<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP五井トンネル舗装工事 <b>工期</b> 令和4年11月28日～令和6年2月29日 <b>施工業者</b> 大林道路（株） TEL 053-438-2622, FAX 053-438-2710 <b>10月末時点進捗率</b> 29% <b>11月作業予定</b> 排水構造物工,道路付属物工 <b>工事概要</b> 五井地区でバイパス本線の舗装しています。	<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP豊沢トンネル舗装工事 <b>工期</b> 令和4年12月1日～令和6年2月29日 <b>施工業者</b> 福田道路（株） TEL 052-218-6820, FAX 052-218-6821 <b>10月末時点進捗率</b> 71% <b>11月作業予定</b> 側帯工 <b>工事概要</b> 豊沢地区でバイパス本線の舗装しています。	<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP金野第6橋脚上部工事 <b>工期</b> 令和5年1月18日～令和6年5月31日 <b>施工業者</b> 川田工業（株） TEL 0877-32-5115, FAX 0877-32-7267 <b>10月末時点進捗率</b> 65% <b>11月作業予定</b> 工場製作工,架設工 <b>工事概要</b> 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	<b>工事名</b> 令和4年度23号蒲郡BP為当OFランプPC上部工事 <b>工期</b> 令和5年1月19日～令和6年3月25日 <b>施工業者</b> 川田建設（株） TEL 052-222-3310, FAX 052-222-3315 <b>10月末時点進捗率</b> 76% <b>11月作業予定</b> 横組工 <b>工事概要</b> 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくっています。	
名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

\* 丸数字は、①番から工事の始まった順番です。  
 \* 今年度に完成した工事は、欠番です。

裏面へつづく

表面のつづき

<p>⑦ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP国坂トンネル電気室構築工事 工 期 令和5年2月1日～令和5年10月31日 施 工 者 (株) ヒラオ工務店 TEL 0568-32-6919, FAX 0568-33-7899 10月末時点進捗率 100% 11月作業予定 ー 工事概要 国坂トンネルの電気室をつくりました。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 完了しました!</p>	<p>⑧ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP豊川トンネル電気室構築工事 工 期 令和5年2月1日～令和5年10月31日 施 工 者 生川建設(株) TEL 059-355-2320, FAX 059-355-2325 10月末時点進捗率 100% 11月作業予定 ー 工事概要 豊川トンネルの電気室をつくりました。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む 完了しました!</p>	<p>⑨ 工事名 令和4年度23号蒲郡BPラジオ再放送設備工事 工 期 令和5年2月1日～令和6年6月28日 施 工 者 インデンティヴ コリアツグ(株) TEL 052-419-1410, FAX 052-419-1414 10月末時点進捗率 11% 11月作業予定 準備工 工事概要 ラジオ再放送設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 工期を延長しました。</p>	<p>⑩ 工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル機械設備工事 工 期 令和5年2月1日～令和6年5月31日 施 工 者 (株) ミソタ TEL 052-45-8806, FAX 052-45-8314 10月末時点進捗率 26% 11月作業予定 工場製作工 工事概要 トンネルの機械設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 工期を延長しました。</p>	<p>⑪ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野7橋PC上部工事 工 期 令和5年3月1日～令和5年12月27日 施 工 者 昭和コンクリート工業(株) TEL 052-589-8761, FAX 052-589-8760 10月末時点進捗率 92% 11月作業予定 床版工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑫ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野C東西道路建設工事 工 期 令和5年3月1日～令和6年3月29日 施 工 者 吉川建設(株) TEL 052-211-7700, FAX 052-211-7788 10月末時点進捗率 41% 11月作業予定 道路土工,擁壁工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑬ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP受変電設備工事 工 期 令和5年3月1日～令和6年6月28日 施 工 者 (株) 野原電建 TEL 058-201-6014, FAX 058-213-6037 10月末時点進捗率 1% 11月作業予定 準備工 工事概要 バイパスの受変電設備をつくります。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 工期を延長しました。</p>
---	--	--	---	---	--	--

<p>⑭ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP CCTV設備設置工事 工 期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施 工 者 朝日電気工業(株) TEL 052-471-3265, FAX 052-471-3456 10月末時点進捗率 12% 11月作業予定 準備工 工事概要 バイパスのCCTV設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 工期を延長しました。</p>	<p>⑮ 工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事 工 期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施 工 者 コイト電工(株) TEL 052-939-3970, FAX 052-939-3971 10月末時点進捗率 32% 11月作業予定 機器製作工 工事概要 バイパスのトンネル防災設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 工期を延長しました。</p>	<p>⑯ 工事名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル照明設備設置工事 工 期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施 工 者 シーキューブ(株) TEL 052-563-5073, FAX 052-563-5074 10月末時点進捗率 15% 11月作業予定 材料製作工 工事概要 バイパスのトンネル照明設備をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 工期を延長しました。</p>	<p>⑰ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP清田地区道路建設工事 工 期 令和5年3月29日～令和6年3月29日 施 工 者 (株) 竹中土木 TEL 052-231-2121, FAX 052-231-2529 10月末時点進捗率 65% 11月作業予定 道路土工,擁壁工 工事概要 蒲都市清田町でバイパス本線の道路をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑱ 工事名 令和4年度23号蒲郡BP金野西道路建設工事 工 期 令和5年4月10日～令和6年2月29日 施 工 者 ヤハギ道路(株) TEL 0565-46-6211, FAX 0565-46-6233 10月末時点進捗率 57% 11月作業予定 道路土工,擁壁工,排水構築物工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線,県道をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑲ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP床版工事 工 期 令和5年5月10日～令和6年5月31日 施 工 者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191, FAX 0533-88-5017 10月末時点進捗率 51% 11月作業予定 床版工 工事概要 豊川市御津町金野と為当町で橋の床版をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑳ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP道路建設工事 工 期 令和5年6月24日～令和6年3月29日 施 工 者 (株) 近藤組 TEL 0566-36-1812, FAX 0566-36-1825 10月末時点進捗率 26% 11月作業予定 道路土工,躯体工 工事概要 豊川市を道くつてON・OFFランプの道路をつくっています。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
---	---	--	--	---	--	--

<p>㉑ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP五井清田地区整備工事 工 期 令和5年10月5日～令和6年9月30日 施 工 者 丸洋建設(株) TEL 0563-54-7412, FAX 0563-54-0280 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 蒲都市五井清田地区で整備工事を行います。</p> <p>準備中</p>	<p>㉒ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP広右道路建設工事 工 期 令和5年10月6日～令和6年9月30日 施 工 者 山旺建設(株) TEL 0563-56-3194, FAX 0563-54-0903 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくります。</p> <p>準備中</p>	<p>㉓ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP金野西道路建設工事 工 期 令和5年11月1日～令和6年5月31日 施 工 者 鈴中工業(株) TEL 0533-68-6188, FAX 0533-68-6190 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくります。</p> <p>準備中</p>	<p>㉔ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP標識設置工事 工 期 令和5年11月1日～令和6年9月30日 施 工 者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191, FAX 0533-88-5017 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 バイパスに標識を設置します。</p> <p>準備中</p>	<p>㉕ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP蒲郡C西道路建設工事 工 期 令和5年11月6日～令和6年9月30日 施 工 者 関興業(株) TEL 0566-23-1437, FAX 0566-24-2866 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 蒲都市清田町でバイパスの調整池をつくります。</p> <p>準備中</p>	<p>㉖ 工事名 令和5年度23号蒲郡BP東整備工事 工 期 令和5年11月17日～令和6年7月31日 施 工 者 日起建設(株) TEL 0532-39-9242, FAX 0532-39-9243 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町で整備工事を行います。</p> <p>準備中</p>
--	---	--	--	---	---

新規工事です!

新規工事です!

新規工事です!

新規工事です!

新規工事です!

新規工事です!

編集長からのひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に關しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

11月度の工事便り編集長になりました「藤城建設株式会社 監理技術者 山口」と申します。

私もが施工している【令和3年度 23号蒲郡BP金野東地区道路建設工事】では、豊川市御津町金野地区においてバイパス本線の切土・盛土・法面保護の施工を行っております。

現在、切土・盛土は完了し、切土部の法面保護(法神工・鉄筋擁壁)の施工を行っております。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもありますが、安全第一で工事を進めさせていただきます。引き続きご理解ご協力の程宜しくお願い致します。工事中に何かお気づきな点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

建設クイズ

Q 法面作業時に法面にぶらさがり作業を行います。墜落防止のために使用する墜落防止器具の別名を、何というでしょう。

① テロップ  
② スリップ  
③ ロリッパ

正解は ぶらさり器【墜落防止用具類】

FUJISHIRO  
令和3年度 23号蒲郡BP金野東地区道路建設工事  
藤城建設株式会社 監理技術者 山口 幹也

㊦ ㊧のマーク
