




沿線地域の皆さまへ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス 令和2年11月 工事便り

発行 第102号 令和2年11月1日 豊川分室支部工事等安全協議会  
 編集長：鈴木工業(株) 鶴飼 貴之  
 TEL 0533-76-5353、FAX 0533-76-5354  
 監修：名古屋事務所豊川分室(豊川建設監督官事務所)  
 TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

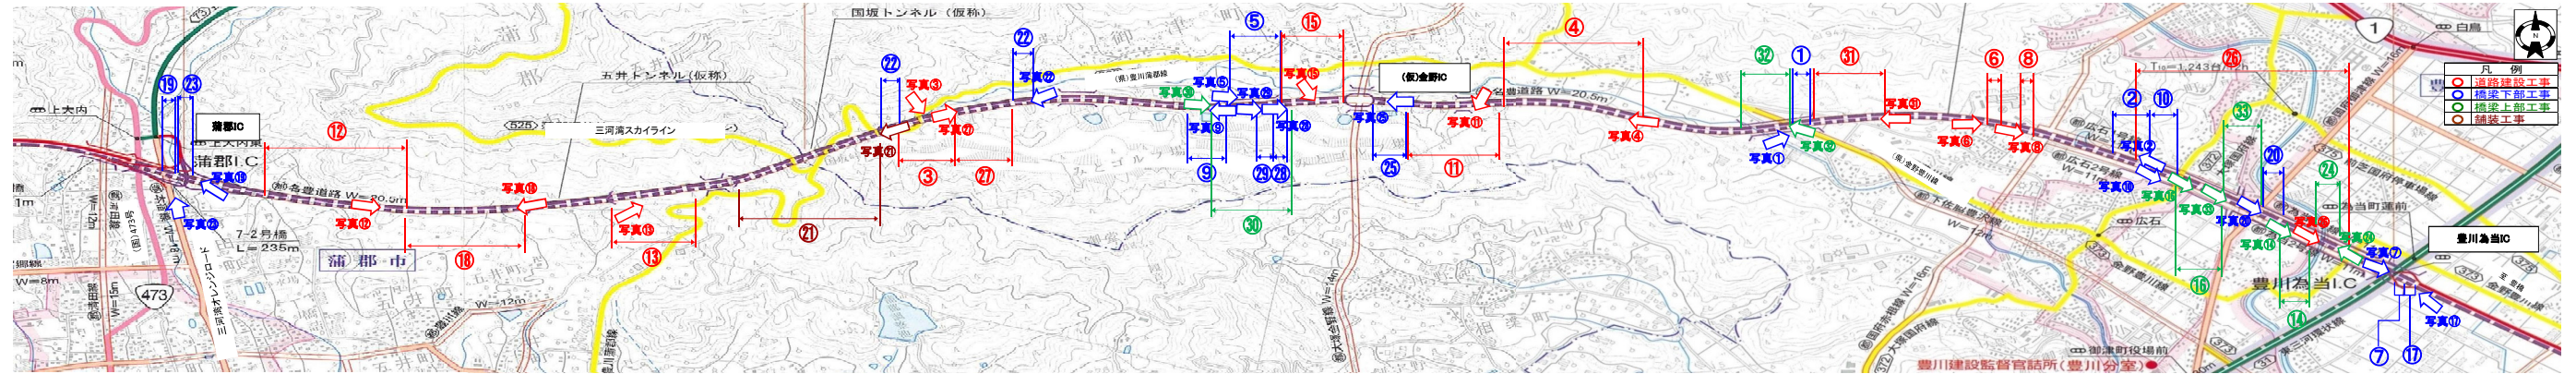

<p>① 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP金野高架橋下部工事        工期 令和元年8月20日～令和2年11月16日        施工業者 山旺建設(株)        TEL 0533-95-8177、FAX 0533-95-8178        10月末時点進捗率 100%        11月作業予定 -        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋台をつくらしました。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む(金野地区)</p>	<p>② 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP広石第1橋下部工事        工期 令和元年10月21日～令和3年3月31日        施工業者 石黒建設(株)        TEL 0533-95-9970、FAX 0533-95-9971        10月末時点進捗率 58%        11月作業予定 橋台工、擁壁工、RC橋脚工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋台・橋脚をつくっています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>③ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP国坂金野地区道路建設工事        工期 令和元年11月5日～令和3年1月14日        施工業者 鈴木工業(株)        TEL 0533-76-5353、FAX 0533-76-5354        10月末時点進捗率 98%        11月作業予定 法面工、仮設工        工事概要 豊川市御津町で工事用道路をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>④ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP金野豊沢道路建設工事        工期 令和元年11月11日～令和3年1月29日        施工業者 丸洋建設(株)        TEL 0533-75-6618、FAX 0533-75-6619        10月末時点進捗率 82%        11月作業予定 道路土工、調整池工、土砂流出防止対策工、排水構造物工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑤ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP金野Cランプ橋下部工事        工期 令和元年10月29日～令和2年12月18日        施工業者 (株)近藤組        TEL 0533-65-8163、FAX 0533-65-8176        10月末時点進捗率 97%        11月作業予定 RC橋脚工        工事概要 豊川市御津町でバイパスランプの橋脚をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑥ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP豊沢西道路建設工事        工期 令和元年12月1日～令和3年2月26日        施工業者 (株)加藤建設        TEL 0533-74-8193、FAX 0533-74-8312        10月末時点進捗率 75%        11月作業予定 カルバート工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路(ボックスカルバート)をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑦ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP為当高架橋西側下部工事        工期 令和2年1月7日～令和3年2月26日        施工業者 佐藤鉄工(株)        TEL 076-462-9228、FAX 076-462-9258        10月末時点進捗率 65%        11月作業予定 工場製作、橋脚架設工        工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
--	--	---	---	--	--	--

<p>⑧ 完成しました!        工事名 令和元年度 23号蒲郡BP豊沢東道路建設工事        工期 令和2年2月29日～令和3年9月30日        施工業者 TSUCHIYA(株)        TEL 0533-95-5566、FAX 0533-95-5567        10月末時点進捗率 21%        11月作業予定 カルバート工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路(ボックスカルバート)をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑨ 今月の進捗        工期を延長しました        工事名 令和元年度 23号蒲郡BP金野地区橋梁下部工事        工期 令和2年3月1日～令和3年6月1日        施工業者 鈴木工業(株)        TEL 0533-76-5353、FAX 0533-76-5354        10月末時点進捗率 49%        11月作業予定 橋台工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑩ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP広石地区橋梁下部工事        工期 令和2年4月1日～令和3年2月26日        施工業者 太啓建設(株)        TEL 050-5371-6723、FAX 050-5371-6724        10月末時点進捗率 3%        11月作業予定 場所打杭工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑪ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP金野東道路建設工事        工期 令和2年3月31日～令和3年3月29日        施工業者 (株)ヒメノ        TEL 0533-95-7550、FAX 0533-95-7560        10月末時点進捗率 25%        11月作業予定 道路土工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑫ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP五井西地区道路建設工事        工期 令和2年3月16日～令和3年3月26日        施工業者 石黒建設(株)        TEL 0533-95-7176、FAX 0533-95-7177        10月末時点進捗率 28%        11月作業予定 道路土工、擁壁工、排水構造物工、カルバート工        工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線の道路をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑬ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP五井東地区道路建設工事        工期 令和2年3月9日～令和3年3月26日        施工業者 小原建設(株)        TEL 0533-95-8807、FAX 0533-95-8808        10月末時点進捗率 38%        11月作業予定 道路土工、擁壁工、排水構造物工        工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線の道路をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑭ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP為当第3橋脚上部工事        工期 令和2年2月26日～令和4年1月28日        施工業者 日立造船(株)        TEL 052-581-0161、FAX 052-582-6371        10月末時点進捗率 10%        11月作業予定 工場製作        工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
---	---	---	--	---	---	--

<p>⑮ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP金野C西道路建設工事        工期 令和2年3月31日～令和3年3月26日        施工業者 (株)ヒメノ        TEL 0533-95-7550、FAX 0533-95-7560        10月末時点進捗率 31%        11月作業予定 道路土工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑯ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP広石第3橋PC上部工事        工期 令和2年4月1日～令和3年2月26日        施工業者 (株)ピーエス三菱        TEL 052-221-8489、FAX 052-211-5596        10月末時点進捗率 73%        11月作業予定 上部工架設、床版工        工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁を架けています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑰ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP為当高架橋架設下部工事        工期 令和2年3月6日～令和3年2月26日        施工業者 宇野重工(株)        TEL 052-586-1336、FAX 052-581-0874        10月末時点進捗率 60%        11月作業予定 工場製作、架設工        工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑱ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP五井道路建設工事        工期 令和2年3月24日～令和3年3月26日        施工業者 (株)近藤組        TEL 0533-95-8390、FAX 0533-95-8391        10月末時点進捗率 57%        11月作業予定 道路土工、排水構造物工、法面工        工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線の道路をつくっています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑲ 工事名 令和元年度 23号蒲郡BP蒲郡C西橋梁下部工事        工期 令和2年3月24日～令和3年3月26日        施工業者 日建建設(株)        TEL 0533-95-2150、FAX 0533-95-2151        10月末時点進捗率 60%        11月作業予定 RC橋脚工、図架工        工事概要 蒲郡市蒲田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑳ 工事名 令和2年度 23号蒲郡BP為当第1橋下部工事        工期 令和2年4月29日～令和3年3月26日        施工業者 長坂建設興業(株)        TEL 0533-95-0721、FAX 0533-95-0722        10月末時点進捗率 54%        11月作業予定 RC橋脚工        工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>㉑ 工事名 令和2年度 23号蒲郡BP国坂トンネル舗装工事        工期 令和2年4月29日～令和3年3月26日        施工業者 大林道路(株)        TEL 0533-95-5571、FAX 0533-95-5572        10月末時点進捗率 34%        11月作業予定 コンクリート舗装工(上層路盤、中間層)        工事概要 豊川市御津町でトンネルの舗装をしています。</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>
---	--	--	--	---	--	---



<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP国坂金野地区橋梁下部工事 工期 令和2年6月23日～令和4年2月28日 施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-76-5353、FAX 0533-76-5354 10月末時点進捗率 15% 11月作業予定 道路土工(掘削、法面整形、土工処理)、橋台工(深礎杭)、仮設工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋台をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP蒲郡IC東橋梁下部工事 工期 令和2年6月23日～令和3年12月24日 施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-65-7737、FAX 0533-65-7738 10月末時点進捗率 13% 11月作業予定 橋台工 工事概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の橋脚をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP為当ランプ橋梁上部工事 工期 令和2年7月17日～令和3年6月30日 施工業者 JFEエンジニアリング(株) TEL 052-561-8611、FAX 052-561-8620 10月末時点進捗率 16% 11月作業予定 工場製作 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP金野第7橋下部工事 工期 令和2年8月1日～令和3年12月24日 施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0563-35-0501、FAX 0563-35-2567 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 伐採工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋台をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP広石為当道路建設工事 工期 令和2年8月18日～令和3年12月24日 施工業者 (株)近藤組 TEL 0533-95-9201、FAX 0533-95-9202 10月末時点進捗率 1% 11月作業予定 場所打杭工 工事概要 豊川市御津町から豊川市為当町でバイパスの側道擁壁及び橋台をつくっています。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>工事名 令和2年度 23号名豊道路建設工事 工期 令和2年10月16日～令和3年10月29日 施工業者 関興業(株) TEL 0566-23-1437、FAX 0566-24-2866 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくります。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP金野第5橋東下部工事 工期 令和2年10月1日～令和4年12月16日 施工業者 藤城建設(株) TEL 0532-31-4131、FAX 0532-2-4390 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくります。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!</p>
<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP金野第5橋西下部工事 工期 令和2年10月20日～令和4年12月16日 施工業者 鈴中工業(株) TEL 052-222-7701、FAX 052-222-7702 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋脚をつくります。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP金野ICランプ橋梁上部工事 工期 令和2年9月15日～令和4年1月28日 施工業者 日本車輛製造(株) TEL 052-882-3320、FAX 052-883-2540 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくります。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP豊沢TN西道路建設工事 工期 令和2年10月30日～令和4年2月28日 施工業者 木村建設(株) TEL 0566-41-1818、FAX 0566-43-0063 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 準備工 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の擁壁をつくります。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む 新規工事です!</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP金野高架橋梁上部工事 工期 令和2年9月29日～令和4年5月20日 施工業者 高田機工(株) TEL 052-228-8610、FAX 052-228-8618 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 工場製作 工事概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくります。</p>  <p>豊橋側より名古屋側を望む 新規工事です!</p>	<p>工事名 令和2年度 23号蒲郡BP為当第1橋梁上部工事 工期 令和2年9月30日～令和5年2月24日 施工業者 宮地エンジニアリング(株) TEL 052-219-0690、FAX 052-222-0128 10月末時点進捗率 0% 11月作業予定 工場製作 工事概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくります。</p>  <p>名古屋側より豊橋側を望む 新規工事です!</p>		



## 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

11月度の工事便りの編集長になりました 鈴中工業株式会社 現場代理人の 鶴飼と申します。

私どもが行います『令和元年度 23号蒲郡BP金野地区橋梁下部工事』は、御津町において、バイパスランプ線の橋台2基と本線の道路土工、それに伴う擁壁工事の施工を行う工事です。

現在までに、橋台の深礎杭(写真1)と擁壁の場所打杭(写真2)の施工が完了し、今は橋台2基の躯体部の施工を行っています。

今後は橋台躯体部・擁壁・本線道路土工の施工を行っていきます。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、安全第一で施工してまいります。ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。工事中に何かお気付きな点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

◎令和元年度 23号蒲郡BP金野地区橋梁下部工事  
鈴中工業株式会社 現場代理人 鶴飼 貴之

価値あるものを未来へ  
SUZUNAKA 鈴中工業株式会社



☆深礎杭施工(写真1)



☆場所打杭施工(写真2)



杭施工完了全景(Bランプ)



私たちが現場を管理しています



建設クイズ

下のイラストの重機。みなさんも建設現場などでよく見かけられると思いますが、ここでクイズです!

Q 今日建設現場では、どのような名称で呼ばれているでしょうか?



- ① 油圧ショベル
- ② パワーショベル
- ③ ユンボ
- ④ バックホー

答えは左下にあります。
