

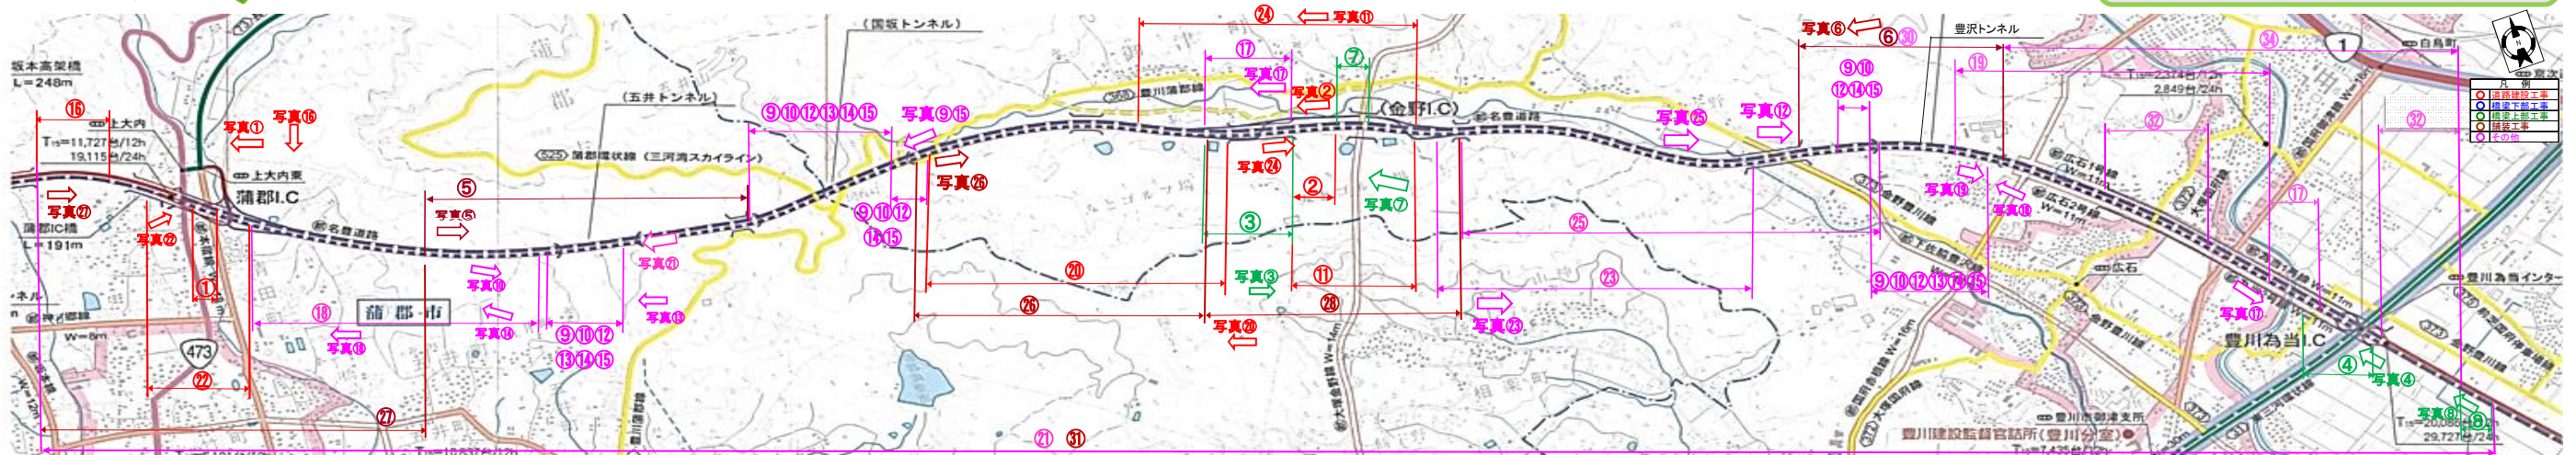
沿道地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。



蒲郡バイパス令和6年6月工事便り

発行 第145号 令和6年6月1日
豊川分室支部工事等安全協議会
編集長：イシデンエツ・コアリツ（株）
TEL 052-419-1410、FAX 052-419-1414

監修：名四国道事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974
いつもご協力ありがとうございます。工事に資するお問合せはこちらまでお願いいたします。



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
工 事 名 令和3年度23号蒲郡BP蒲郡IC東道路建設工事 工 期 令和4年2月28日～令和6年6月28日 施 工 業 者 (株)加藤建設 TEL 052-383-2985、FAX 052-383-2987 5月末時点 進捗率 98% 6月作業予定 法面工 工 事 概要 蒲郡市清田町でバイパス本線の道路をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む	工 事 名 令和3年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事 工 期 令和4年4月1日～令和6年7月31日 施 工 業 者 矢作建設工業（株） TEL 052-935-2352、FAX 052-982-6032 5月末時点 進捗率 97% 6月作業予定 擁壁工 工 事 概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP金野第5橋梁上部工事 工 期 令和4年5月25日～令和6年6月18日 施 工 業 者 日本橋梁（株） TEL 052-747-4321、FAX 052-747-4322 5月末時点 進捗率 99% 6月作業予定 橋梁足場工、後片付け 工 事 概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。  名古屋側より豊橋側を望む	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP為当IC橋梁上部工事 工 期 令和4年6月1日～令和6年5月31日 施 工 業 者 三井住友建設鉄構インフラ（株） TEL 0533-95-0305、FAX 0533-95-0306 5月末時点 進捗率 100% 6月作業予定 ー 工 事 概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくりました。  豊橋側より名古屋側を望む 完成しました！	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP五井トンネル舗装工事 工 期 令和4年11月28日～令和6年8月31日 施 工 業 者 大林道路（株） TEL 053-438-2622、FAX 053-438-2710 5月末時点 進捗率 85% 6月作業予定 舗装工 工 事 概要 五井地区でバイパス本線の舗装をしています。  名古屋側より豊橋側を望む 工期を延長しました。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP豊沢トンネル舗装工事 工 期 令和4年12月1日～令和6年6月28日 施 工 業 者 福田道路（株） TEL 052-218-6820、FAX 052-218-6821 5月末時点 進捗率 78% 6月作業予定 排水構造物工 工 事 概要 豊沢地区でバイパス本線の舗装をしています。  豊橋側より名古屋側を望む	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP金野第6橋梁上部工事 工 期 令和5年1月18日～令和6年6月30日 施 工 業 者 川田工業（株） TEL 0877-32-5115、FAX 0877-32-7267 5月末時点 進捗率 99% 6月作業予定 後片付け 工 事 概要 豊川市御津町でバイパス本線の橋桁をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む 工期を延長しました。

⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP為当OFFランプPC上部工事 工 期 令和5年1月19日～令和6年5月31日 施 工 業 者 川田建設（株） TEL 052-222-3310、FAX 052-222-3315 5月末時点 進捗率 100% 6月作業予定 ー 工 事 概要 豊川市為当町でバイパス本線の橋桁をつくりました。  豊橋側より名古屋側を望む 完成しました！	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPラジオ再放送設備工事 工 期 令和5年2月1日～令和6年6月28日 施 工 業 者 イシデンエツ・コアリツ（株） TEL 052-419-1410、FAX 052-419-1414 5月末時点 進捗率 32% 6月作業予定 製作工、設備設置工 工 事 概要 ラジオ再放送設備をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル機械設備工事 工 期 令和5年2月1日～令和6年9月12日 施 工 業 者 (株)ミソタ TEL 0952-45-8806、FAX 0952-45-8314 5月末時点 進捗率 78% 6月作業予定 製作工、設備設置工 工 事 概要 トンネルの機械設備をつくっています。  配水管布設状況 工期を延長しました。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP金野IC東道路建設工事 工 期 令和5年3月1日～令和6年7月26日 施 工 業 者 吉川建設（株） TEL 052-211-7700、FAX 052-211-7788 5月末時点 進捗率 83% 6月作業予定 擁壁工、排水構造物工、道路土工 工 事 概要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP受変電設備工事 工 期 令和5年3月1日～令和6年6月28日 施 工 業 者 (株)野原電建 TEL 058-201-6014、FAX 058-213-6037 5月末時点 進捗率 93% 6月作業予定 製作工、配管配線工 工 事 概要 バイパスの受変電設備をつくっています。  国坂電気室配電盤設置状況	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP CCTV設備設置工事 工 期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施 工 業 者 朝日電気工業（株） TEL 052-471-3265、FAX 052-471-3456 5月末時点 進捗率 25% 6月作業予定 製作工 工 事 概要 バイパスのCCTV設備をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事 工 期 令和5年3月2日～令和6年6月28日 施 工 業 者 コイト電気（株） TEL 052-939-3970、FAX 052-939-3971 5月末時点 進捗率 60% 6月作業予定 機器製作工 工 事 概要 バイパスのトンネル防災設備をつくっています。  豊橋側より名古屋側を望む

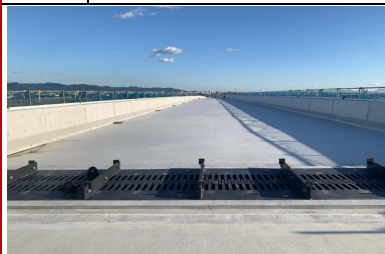

* 丸数字は、①番から工事の始まった順番です。
* 今年度に完成した工事は、欠番です。

裏面へつづく

表面のつづき

⑮		⑯		⑰		⑱		㉑		㉒		㉓	
工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル照明設備設置工事		工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP清田地区道路建設工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP床版工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP五井清田地区整備工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP広石道路建設工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野道路建設工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP標識設置工事	
工 期 令和5年3月2日～令和6年7月31日		工 期 令和5年3月29日～令和6年6月28日		工 期 令和5年5月10日～令和6年5月31日		工 期 令和5年10月5日～令和6年9月30日		工 期 令和5年10月6日～令和6年9月30日		工 期 令和5年11月1日～令和6年8月31日		工 期 令和5年11月1日～令和6年9月30日	
施 工 業 者 シーキューブ（株） TEL052-563-5073、FAX052-563-5074		施 工 業 者 （株）竹中土木 TEL 052-231-2121、FAX 052-231-2529		施 工 業 者 岡田建設（株） TEL 0533-87-5191、FAX0533-88-5017		施 工 業 者 丸洋建設（株） TEL 0563-54-7412、FAX 0563-54-0280		施 工 業 者 山旺建設（株） TEL 0563-56-3194、FAX 0563-54-0903		施 工 業 者 鈴中工業（株） TEL 0533-68-6188、FAX 0533-68-6190		施 工 業 者 岡田建設（株） TEL 0533-87-5191、FAX 0533-88-5017	
5月末時点 進捗率 91%		5月末時点 進捗率 98%		5月末時点 進捗率 100%		5月末時点 進捗率 31%		5月末時点 進捗率 38%		5月末時点 進捗率 58%		5月末時点 進捗率 53%	
6月作業予定 トンネル照明設備設置工		6月作業予定 道路土工、法面工		6月作業予定 —		6月作業予定 道路土工、排水構造物工		6月作業予定 道路土工		6月作業予定 道路土工、防護柵工、排水構造物工		6月作業予定 大型標識工	
工 事 概 要 バイパスのトンネル照明設備をつくっています。		工 事 概 要 蒲郡市清田町でバイパス本線の道路をつくっています。		工 事 概 要 豊川市御津町金野と為当町で橋の床版をつくりました。		工 事 概 要 蒲郡市五井清田地区で整備工事を行っています。		工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。		工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。		工 事 概 要 バイパスに標識を設置しています。	
													
豊橋側より名古屋側を望む		名古屋側より豊橋側を望む		名古屋側より豊橋側を望む		豊橋側より名古屋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		豊橋側から名古屋側を望む		豊橋側から名古屋側を望む	

②③		②④		②⑤		②⑥		②⑦		②⑧	
工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP蒲郡IC西道路建設工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP東整備工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野東舗装工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野西舗装工事		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP清田地区舗装工事	
工 期 令和5年11月6日～令和6年9月30日		工 期 令和5年11月17日～令和6年7月31日		工 期 令和5年12月12日～令和6年10月31日		工 期 令和5年12月12日～令和6年10月31日		工 期 令和6年2月20日～令和6年12月27日		工 期 令和6年3月1日～令和6年12月27日	
施 工 業 者 関興業（株） TEL 0566-23-1437、FAX 0566-24-2866		施 工 業 者 日起建設（株） TEL 0532-39-9242、FAX 0532-39-9243		施 工 業 者 矢作建設工業（株） TEL 052-935-2352、FAX 052-982-6032		施 工 業 者 東亜道路工業（株） TEL 052-962-1831、FAX 052-962-1850		施 工 業 者 フジタ道路（株） TEL 059-367-7165、FAX 059-367-7166		施 工 業 者 大有建設（株） TEL 0568-81-0240、FAX 0568-81-7632	
5月末時点 進捗率 27%		5月末時点 進捗率 65%		5月末時点 進捗率 9%		5月末時点 進捗率 21%		5月末時点 進捗率 5%		5月末時点 進捗率 10%	
6月作業予定 調整池工		6月作業予定 道路土工、法面工、排水構造物工		6月作業予定 道路土工、擁壁工		6月作業予定 道路土工、排水構造物工		6月作業予定 排水構造物工、道路土工		6月作業予定 道路土工、排水構造物工	
工 事 概 要 蒲郡市清田町でバイパスの調整池をつくっています。		工 事 概 要 豊川市御津町で整備工事をして います。		工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の 道路をつくっています。		工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の 舗装をしています。		工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の 舗装をしています。		工 事 概 要 蒲郡市清田地区でバイパス本線の の舗装をしています。	
											
名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		準備中	

㉙	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP為当舗装工事 工 期 令和6年3月1日～令和6年12月27日 施 工 業 者 世紀東急工業（株） TEL 0567-68-1704、FAX 0567-68-8189 5月末時点 進捗率 1% 6月作業予定 道路土工 工 事 概要 豊川市為当町でバイパス本線の 舗装をしています。	㉚	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP 通信設備工事 工 期 令和6年3月1日 ～令和7年1月31日 施 工 業 者 日本無線（株） TEL 052-959-5902 FAX 052-959-5908 5月末時点 進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概要 バイパスの通信設 備をつくります。	㉛	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP 照明設備工事 工 期 令和6年2月21日 ～令和7年1月31日 施 工 業 者 シーキューブ（株） TEL052-563-5073 FAX052-563-5074 5月末時点 進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概要 バイパスの照明設 備をつくります。	㉜	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP 東地区通車壁設置工事 工 期 令和6年4月1日 ～令和7年4月30日 施 工 業 者 （株）ヒメノ TEL 052-937-8411 FAX 052-937-8412 5月末時点 進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概要 バイパスの遮断壁 をつくります。	㉝	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP 西地区通車壁設置工事 工 期 令和6年4月1日 ～令和7年4月30日 施 工 業 者 太啓建設（株） TEL 0565-31-1273 FAX 0565-33-8868 5月末時点 進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概要 バイパスの遮断壁 をつくります。	㉞	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP 名豊道路整備工事 工 期 令和6年4月1日 ～令和7年2月28日 施 工 業 者 石原建設（株） TEL 052-300-1496 FAX 052-300-1497 5月末時点 進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概要 豊川市御津町～為 当町で整備工事を します。
											
豊橋側より名古屋側を望む		準備中		準備中		準備中		準備中		準備中	

新規工事です！

新規工事です！

新規工事です！

編集長からの一言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

令和6年6月度の工事便り編集長になりました、「イシデンエンジニアリング株式会社 現場代理人 杉木」と申します。

私どもが現在施工している【令和4年度 23号蒲郡BPラジオ再放送設備工事】では、主に今回開通する区間の3つのトンネル内（五井トンネル、国坂トンネル、豊沢トンネル）にラジオ放送が聞こえるようにする工事を施工しております。

現在、トンネル内のアンテナとなるケーブルを敷設する工事が完了し、今後、機器を設置していく予定です。

工事期間中、地元の方々には何かと御迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、全業者一丸となって「安全第一」で工事を進めさせていただいております。引き続き、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。

工事中に何かお気づきの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

令和4年度 23号蒲郡BPラジオ再放送設備工事
イシデンエンジニアリング株式会社 現場代理人 杉木 明文

建設クイズ

アンテナについて

Q、テレビ用のアンテナとして使用されている商品名はどれ？

①アクション ②ラブストーリー ③ロマンス



答えは 左下にあります
