




沿道地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス令和6年10月工事便り



発行 第149号 令和6年10月1日
豊川分室支部工事等安全協議会
編集長:コイト電工(株)
TEL 052-939-3970 FAX 052-939-3971
監修:名四国道事務所豊川分室(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951 FAX 0533-76-2974
いつもご協力ありがとうございます。工事に関する問合せはこちらまでお願いします。

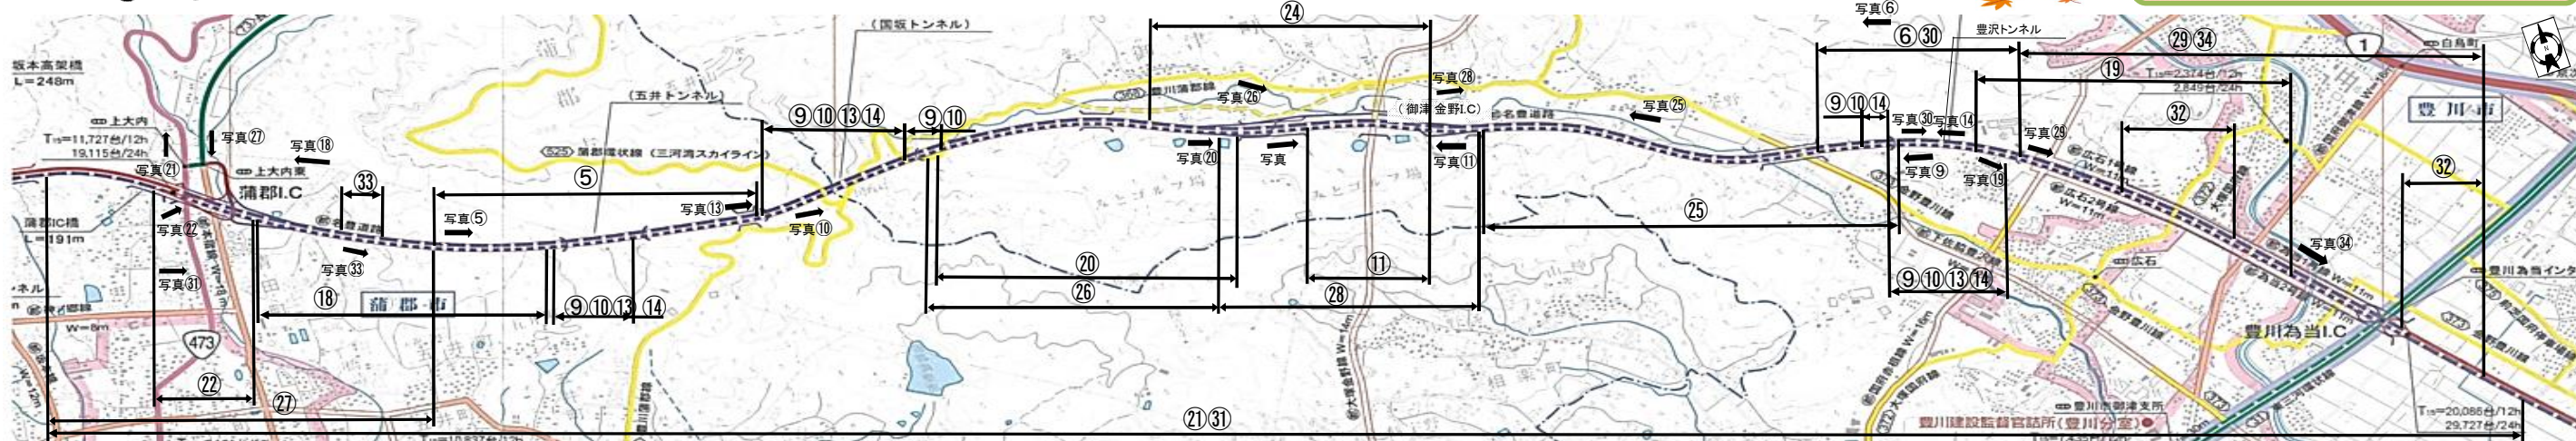


⑤	⑥	⑨	⑩	⑪	⑬	⑬	⑬
工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP五井トンネル舗装工事 工 期 令和4年11月28日～令和6年10月31日 施 工 業 者 大林道路(株) TEL 053-438-2622 FAX 053-438-2710 9月末時点 進捗率 99% 10月作業予定 防護柵工 工 事 概 要 五井地区でバイパス本線の舗装をしています。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP豊沢トンネル舗装工事 工 期 令和4年12月1日～令和6年9月30日 施 工 業 者 福田道路(株) TEL 052-218-6820 FAX 052-218-6821 9月末時点 進捗率 100% 10月作業予定 — 工 事 概 要 豊沢地区でバイパス本線の舗装をしました。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPラジオ再放送設備工事 工 期 令和5年2月1日～令和6年11月7日 施 工 業 者 イシデンエンジニアリング(株) TEL 052-419-1410 FAX 052-419-1414 9月末時点 進捗率 97% 10月作業予定 製作工,設備設置工 工 事 概 要 ラジオ再放送設備をつくっています。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル機械設備工事 工 期 令和5年2月1日～令和6年10月31日 施 工 業 者 (株)ミソタ TEL 052-228-2601 FAX 052-228-2602 9月末時点 進捗率 98% 10月作業予定 製作工,設備設置工 工 事 概 要 トンネルの機械設備をつくっています。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP金野IC東道路建設工事 工 期 令和5年3月1日～令和6年9月20日 施 工 業 者 吉川建設(株) TEL 052-211-7700 FAX 052-211-7788 9月末時点 進捗率 100% 10月作業予定 — 工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくりました。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPCCTV設備設置工事 工 期 令和5年3月2日～令和6年11月7日 施 工 業 者 朝日電気工業(株) TEL 052-471-3265 FAX 052-471-3456 9月末時点 進捗率 95% 10月作業予定 CCTV設備工 工 事 概 要 バイパスのカメラ設備をつくっています。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事 工 期 令和5年3月2日～令和6年11月7日 施 工 業 者 コイト電工(株) TEL 052-939-3970 FAX 052-939-3971 9月末時点 進捗率 91% 10月作業予定 非常警報装置設置工 工 事 概 要 バイパスのトンネル防災設備をつくっています。	工 事 名 令和4年度23号蒲郡BP金野IC西道路建設工事 工 期 令和5年11月6日～令和7年3月31日 施 工 業 者 関興業(株) TEL 0566-23-1437 FAX 0566-24-2866 9月末時点 進捗率 67% 10月作業予定 調整池工 工 事 概 要 蒲都市清田町でバイパスの調整池をつくっています。
名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む 完成しました!	五井トンネル名古屋側坑口明かり部(案内表示板)	豊沢トンネル電気室 工期を延長しました。	豊橋側より名古屋側を望む 完成しました!	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む

⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬	⑬
工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP五井清田地区整備工事 工 期 令和5年10月5日～令和6年12月27日 施 工 業 者 丸洋建設(株) TEL 0563-54-7412 FAX 0563-54-0280 9月末時点 進捗率 72% 10月作業予定 道路土工,排水構造物工 工 事 概 要 蒲都市五井清田地区で整備工事を行っています。	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP広石道路建設工事 工 期 令和5年10月6日～令和6年12月20日 施 工 業 者 山旺建設(株) TEL 0563-56-3194 FAX 0563-54-0903 9月末時点 進捗率 81% 10月作業予定 道路土工,擁壁工 工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野道路建設工事 工 期 令和5年11月1日～令和6年10月31日 施 工 業 者 鈴中工業(株) TEL 0533-68-6188 FAX 0533-68-6190 9月末時点 進捗率 98% 10月作業予定 片付け 工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP標識設置工事 工 期 令和5年11月1日～令和6年12月27日 施 工 業 者 岡田建設(株) TEL 0533-87-5191 FAX 0533-88-5017 9月末時点 進捗率 40% 10月作業予定 大型標識工 工 事 概 要 バイパスに標識を設置しています。	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP蒲郡IC西道路建設工事 工 期 令和5年11月6日～令和7年3月31日 施 工 業 者 関興業(株) TEL 0566-23-1437 FAX 0566-24-2866 9月末時点 進捗率 67% 10月作業予定 調整池工 工 事 概 要 蒲都市清田町でバイパスの調整池をつくっています。	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野IC道路建設工事 工 期 令和5年12月12日～令和6年12月27日 施 工 業 者 矢作建設工業(株) TEL 052-935-2352 FAX 052-982-6032 9月末時点 進捗率 47% 10月作業予定 道路土工,法面工,排水構造物工 工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の道路をつくっています。	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野東舗装工事 工 期 令和5年12月12日～令和6年12月27日 施 工 業 者 東亜道路工業(株) TEL 052-962-1831 FAX 052-962-1850 9月末時点 進捗率 79% 10月作業予定 舗装工 工 事 概 要 豊川市御津町でバイパス本線の舗装をしています。	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野IC西道路建設工事 工 期 令和5年11月6日～令和7年3月31日 施 工 業 者 関興業(株) TEL 0566-23-1437 FAX 0566-24-2866 9月末時点 進捗率 67% 10月作業予定 調整池工 工 事 概 要 蒲都市清田町でバイパスの調整池をつくっています。
豊橋側より名古屋側を望む 工期を延長しました。	名古屋側から豊橋側を望む 工期を延長しました。	名古屋側から豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む 工期を延長しました。	名古屋側から豊橋側を望む	名古屋側から豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む 工期を延長しました。	豊橋側より名古屋側を望む

* 丸数字は、①番から工事の始まった順番です。
* 今年度に完成した工事は、欠番です。

裏面へつづく

表面のつづき

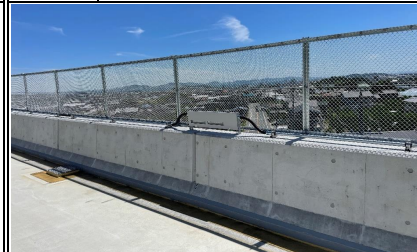②⑥		②⑦		②⑧		②⑨		③⑩		③⑪		③⑫	
工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野西舗装工事 工 期 令和6年2月20日～令和6年12月27日 施 工 業 者 フジタ道路（株） TEL 059-367-7165 FAX 059-367-7166 9月末時点 進捗率 45% 10月作業予定 排水構造物工,道路土工 工 事 概要 豊川市御津町でバイパス本線の 舗装をしています。		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP清田地区舗装工事 工 期 令和6年3月1日～令和6年12月27日 施 工 業 者 大有建設（株） TEL 0568-81-0240 FAX 0568-81-7632 9月末時点 進捗率 59% 10月作業予定 道路土工,排水構造物工 工 事 概要 蒲郡市清田地区でバイパス本線の 舗装をしています。		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP金野IC舗装工事 工 期 令和6年3月1日～令和6年12月27日 施 工 業 者 岐建（株） TEL 0584-81-2121 FAX 0584-81-2364 9月末時点 進捗率 20% 10月作業予定 道路土工,舗装工,排水構造物工 工 事 概要 豊川市御津町でバイパス本線の 舗装をしています。		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP為当舗装工事 工 期 令和6年3月1日～令和6年12月27日 施 工 業 者 世紀東急工業（株） TEL 0567-68-1704 FAX 0567-68-8189 9月末時点 進捗率 55% 10月作業予定 舗装工 工 事 概要 豊川市為当町でバイパス本線の 舗装をしています。		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP通信設備工事 工 期 令和6年3月1日～令和7年1月31日 施 工 業 者 日本無線（株） TEL 052-959-5902 FAX 052-959-5908 9月末時点 進捗率 58% 10月作業予定 工場製作工,道路情報設備工 工 事 概要 バイパスの通信設備をつくって います。		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP照明設置工事 工 期 令和6年2月21日～令和7年1月31日 施 工 業 者 シーキューブ（株） TEL 052-563-5073 FAX 052-563-5074 9月末時点 進捗率 25% 10月作業予定 道路照明設備工 工 事 概要 バイパスの照明設備をつくって います。		工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP東地区遮音壁設置工事 工 期 令和6年4月1日～令和7年4月30日（※） 施 工 業 者 （株）ヒメノ TEL 052-937-8411 FAX 052-937-8412 9月末時点 進捗率 6% 10月作業予定 準備工 工 事 概要 バイパス東部地区の遮音壁をつ くります。	
													
名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		名古屋側から豊橋側を望む		準備中	

（※）本線以外の施工期間を含みます。

③③	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP西地区遮音壁設置工事 工 期 令和6年4月1日～令和7年4月30日(※) 施 工 業 者 太啓建設(株) TEL 0565-31-1273 FAX 0565-33-8868 9月末時点 進捗率 4% 10月作業予定 遮音壁工 工 事 概 要 バイパス西部地区の遮音壁をつ くっています。	③④	工 事 名 令和5年度23号蒲郡BP名豊道路整備工事 工 期 令和6年4月1日～令和7年2月28日 施 工 業 者 石黒建設(株) TEL 052-300-1496 FAX 052-300-1497 9月末時点 進捗率 56% 10月作業予定 調整池工,擁壁工 工 事 概 要 豊川市御津町～為当町で整備工 事をしています。
			
豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側から名古屋側を望む		

（※）本線以外の施工期間を含みます。




のきまぐれ 用語解説

（写真はイメージです。）

* 支承

橋の上部構造（主桁・主構）と下部構造（橋台や橋脚）の間に設置する部材のこと。
別名、沓（しゅう・くつ）とも言い、英語では(Bridge)Bearingと呼ぶ。
桁が温度により伸び縮みしたり、活荷重によってたわむのを受けるための部材で、常に橋桁を支えているので、非常に重要な部位である。
※活荷重（かつかじゅう）は、車が走るによってかかる重さ、力学における荷重の一つで一定の場所に留まらないもの。荷重とは、物体に働く力のこと。

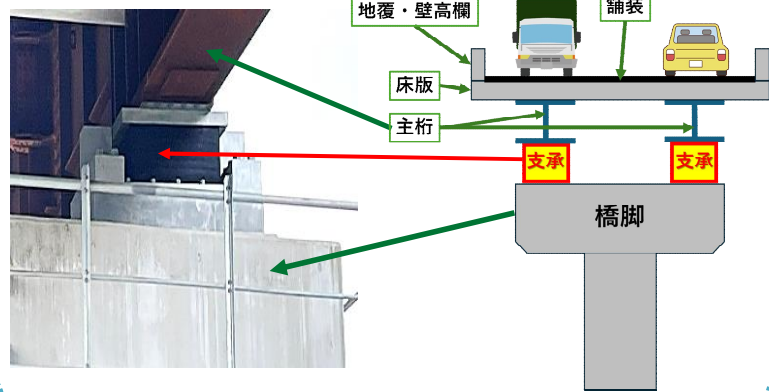

編集長からのひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しまして地域の皆様のご理解ご協力を賜り心より御礼申し上げます。

令和6年10月度の工事便り編集長になりました
「コイト電工株式会社 現場代理人 吉田」と申します。

私どもが現在施工している【令和4年度国道23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事】では、今回開通する区間のトンネル（五井トンネル、国坂トンネル、豊沢トンネル）にて、トンネル内の車両事故や火災などの非常時に使用される緊急用の設備を設置しております。

トンネル内の火災や事故を、迅速かつ正確に把握し道路管理者やトンネル利用者、消防機関などに伝えることで、被害拡大や二次災害の発生を防止することを目的としています。

現在、トンネル内機器（押ボタン通報装置、非常電話等）の設置が完了し、今後各トンネル入り口に警報表示板を設置する予定です。

工事期間中、地元の方々には何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、全業者一丸となって「安全第一」で、工事を進めさせていただいております。
引き続き、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

工事中に何かお気づきの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



令和4年度国道23号蒲郡BPトンネル防災設備設置工事
コイト電工株式会社現場代理人 吉田 颯太

クイズの答え：②ピクトグラム又はピクトグラ

建設クイズ

誘導表示板、非常口等で使用されている
下記の図の名称は何でしょうか？

- ① バリアフリーデザイン
- ② ピクトグラム
- ③ ヒストグラム
- ④ キログラム



出口
EXIT
左



答えは 左下にあり
