


国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和8年6月 工事便り 1/2



こちらのQRコードから過去の工事便りもご覧になれます ↓

(名四国道事務所HP)

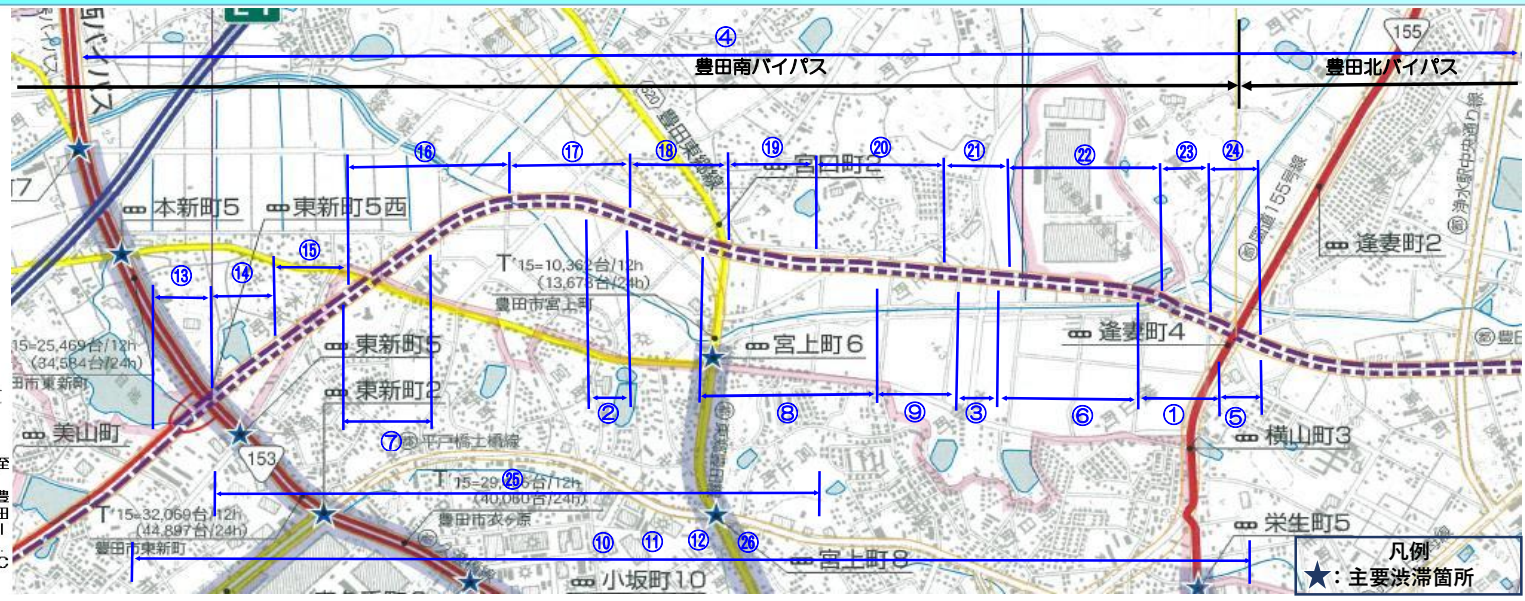

発刊 第73号 令和8年6月1日

豊田支部工事等安全協議会
編集長：太啓建設株式会社
天王東地区作業所
TEL 0565-31-1273
FAX 050-5526-0686

監修：名四国道事務所 豊田出張所
TEL 0565-32-7581
FAX 0565-32-7586

①		② 工事が完成しました		③ 工事が完成しました		④		⑤		⑥	
工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP西山地区道路建設工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP宮口西地区道路建設工事	工 事 名	令和6年度 155号豊田南BP宮口上地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 豊田出張所管内整備工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP貞宝地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事
工 期	令和6年12月27日 ～ 令和8年6月30日	工 期	令和7年4月1日 ～ 令和8年5月29日	工 期	令和7年4月10日 ～ 令和8年6月10日	工 期	令和7年7月17日 ～ 令和8年8月31日	工 期	令和7年7月18日 ～ 令和8年9月30日	工 期	令和7年7月25日 ～ 令和8年6月8日
施 工 業 者	ヤハギ道路株式会社	施 工 業 者	中部土木株式会社	施 工 業 者	太啓建設株式会社	施 工 業 者	朝日工業株式会社	施 工 業 者	株式会社光建	施 工 業 者	株式会社ヒメノ
TEL	0565-41-6105 FAX 0565-41-6105	TEL	0565-42-5610 FAX 0565-42-5611	TEL	0565-31-1271 FAX 0565-33-8868	TEL	0565-41-3520 FAX 0565-41-3521	TEL	0565-41-8221 FAX 0565-41-8225	TEL	0565-63-5880 FAX 0565-63-5881
5月末時点進捗率	98%	5月末時点進捗率	100%	5月末時点進捗率	100%	5月末時点進捗率	87%	5月末時点進捗率	64%	5月末時点進捗率	96%
6月作業予定	舗装工、排水構造物工	6月作業予定	工事が完了しました。ご協力頂き誠にありがとうございました。	6月作業予定	工事が完了しました。ご協力頂き誠にありがとうございました。	6月作業予定	除草工	6月作業予定	舗装工、排水構造物工、緑石工	6月作業予定	道路土工、下層路盤工
工 事 概 要	豊田市逢妻町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。	工 事 概 要	豊田市宮口町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。	工 事 概 要	豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。市道豊田西部線との交差点をつくっています。	工 事 概 要	豊田市東新町～扶桑町で豊田南北バイパスの整備をしています。豊田北バイパスの維持管理のための除草を行います。	工 事 概 要	豊田市貞宝町～逢妻町で国道155号の切り直し車線をつますくにもとめています。	工 事 概 要	豊田市丸根町～横山町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。
市道貞宝線OFFランプ		豊田IC側から豊田動ノIC側を望む		市道豊田西部線		豊田市上原町		国道155号北側から南側を望む 国道155号東側調整池を望む		豊田IC側から豊田動ノIC側を望む	
⑦		⑧		⑨		⑩		⑪		⑫	
工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP田町地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP天王西地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP天王東地区道路建設工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP CCTV設備工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP通信設備工事	工 事 名	令和7年度 155号豊田南BP電気設備工事
工 期	令和7年9月8日 ～ 令和8年6月26日	工 期	令和7年9月8日 ～ 令和8年8月24日	工 期	令和7年9月8日 ～ 令和8年6月26日	工 期	令和7年10月1日 ～ 令和8年12月18日	工 期	令和7年11月4日 ～ 令和8年12月18日	工 期	令和7年11月18日 ～ 令和8年12月18日
施 工 業 者	株式会社近藤組	施 工 業 者	ヤハギ道路株式会社	施 工 業 者	太啓建設株式会社	施 工 業 者	NDS株式会社	施 工 業 者	朝日電気工業株式会社	施 工 業 者	NDS株式会社
TEL	0565-41-5068 FAX 0565-41-5068	TEL	0565-41-6105 FAX 0565-41-6105	TEL	0565-31-1273 FAX 050-5526-0686	TEL	052-445-2133 FAX 052-445-2140	TEL	052-471-3263 FAX 052-486-2568	TEL	052-445-2133 FAX 052-445-2140
5月末時点進捗率	87%	5月末時点進捗率	62%	5月末時点進捗率	90%	5月末時点進捗率	35%	5月末時点進捗率	51%	5月末時点進捗率	6%
6月作業予定	道路土工・擁壁工・排水構造物工・情報ボックス工	6月作業予定	道路土工、構造物撤去工、排水構造物工、地盤改良工	6月作業予定	舗装工、防護柵工	6月作業予定	埋設配管工	6月作業予定	高度情報化設備工	6月作業予定	受変電設備工
工 事 概 要	豊田市本新町～宮口町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。	工 事 概 要	豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスの土台となる盛土、県道豊田東線との交差点をつくっています。	工 事 概 要	豊田市天王町～丸根町で豊田南バイパスの土台となる盛土を行っています。	工 事 概 要	豊田市東新町～逢妻町で道路の様子を確認するためのカメラを取り付けています。	工 事 概 要	豊田市東新町～逢妻町で道路情報を伝える表示板を取り付けています。	工 事 概 要	豊田市東新町～逢妻町で道路照明を取り付けています。
豊田IC側から豊田動ノIC側を望む		豊田IC側から豊田動ノIC側を望む		豊田動ノIC側から豊田IC側を望む		国道155号 東新町5丁目		豊田動ノIC側から豊田IC側を望む		国道153号 西側から東側を望む	

国道155号 豊田南バイパス・国道153号 豊田北バイパス 令和8年6月 工事便り 2/2

⑬	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP東新地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 フジタ道路株式会社 TEL 0565-42-2771 FAX 0565-42-2772 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 準備工、防護柵撤去 工 事 概 要 豊田市柿本町～東新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	⑭	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP本新南地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 岐建株式会社 TEL 後日記載 FAX 後日記載 5月末時点進捗率 2% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	⑮	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP本新北地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 岐建株式会社 TEL 後日記載 FAX 後日記載 5月末時点進捗率 2% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市東新町～本新町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	⑯	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP田町地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 大有建設株式会社 TEL 050-5865-7528 FAX 050-5865-7529 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 排水構造物工 工 事 概 要 豊田市田町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。
							
豊田IC側から豊田動/IC側を望む		豊田IC側から豊田動/IC側を望む		豊田IC側から豊田動/IC側を望む		豊田IC側から豊田動/IC側を望む	

⑰	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP宮口西地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 東亜道路工業株式会社 TEL 050-5865-7270 FAX 050-5865-7271 5月末時点進捗率 5% 6月作業予定 道路土工 工 事 概 要 豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	⑱	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP宮口東地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 大有建設株式会社 TEL 050-5865-7528 FAX 050-5865-7529 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 道路土工、排水構造物工 工 事 概 要 豊田市田町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	⑲	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP天王西地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 常盤工業株式会社 TEL 052-803-3431 FAX 052-803-4394 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市宮口町～天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	⑳	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP天王中地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 大林道路株式会社 TEL 0565-24-3663 FAX 0565-24-8494 5月末時点進捗率 1% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市天王町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	㉑	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP天王東地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 日本道路株式会社 TEL 0566-62-6588 FAX 0566-62-6801 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市天王町～貞宝町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。	㉒	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP横山西地区舗装工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 東亜道路工業株式会社 TEL 050-5865-7270 FAX 050-5865-7271 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市丸根町～貞宝町で豊田南バイパスのアスファルト舗装工事をおこないます。
											
豊田IC側から豊田動/IC側を望む		豊田IC側から豊田動/IC側を望む		豊田IC側から豊田動/IC側を望む		豊田IC側から豊田動/IC側を望む		市道豊田西部線		豊田IC側から豊田動/IC側を望む	

㉓	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP豊田管内道路建設工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和9年2月26日 施 工 業 者 太啓建設株式会社 TEL 0560-37-7571 FAX 0560-37-7573 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市逢妻町で豊田南バイパスの土台となる盛土や擁壁をつくります。	㉔	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP逢妻東地区道路建設工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 中部土木株式会社 TEL 0565-42-5610 FAX 0565-42-5611 5月末時点進捗率 3% 6月作業予定 準備工、道路土工 工 事 概 要 豊田市逢妻町で豊田南バイパスの擁壁工事、アスファルト舗装工事をおこないます。	㉕	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP豊田西部道路建設工事 工 期 令和8年4月1日 ～ 令和9年2月26日 施 工 業 者 中日建設株式会社 TEL 052-321-6501 FAX 052-321-6946 5月末時点進捗率 0% 6月作業予定 擁壁工 工 事 概 要 豊田市東新町～天王町において豊田南バイパスを支えるための擁壁をつくります。	㉖	工 事 名 令和7年度 155号豊田南BP標識設置工事 工 期 令和8年3月30日 ～ 令和8年12月11日 施 工 業 者 木村建設株式会社 TEL 後日記載 FAX 後日記載 5月末時点進捗率 2% 6月作業予定 準備工 工 事 概 要 豊田市東新町～逢妻町で豊田南バイパスをより安全にご利用していただくための大型標識を設置します。
		 国道155号北側					
豊田IC側から豊田動/IC側を望む		豊田動/IC側から豊田IC側を望む 国道155号北側		豊田動/IC側から豊田IC側を望む		国道153号 東側から西側を望む	



編集長からひと言

平素は、豊田南・北バイパス工事に関しまして、地域の皆様にはご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

令和8年6月度の工事便りの編集長になりました『令和7年度 155号豊田南BP天王東地区道路建設工事』を施工しております、太啓建設(株) 現場代理人です。本工事では、天王地区において豊田南バイパス本線の排水構造物の設置や舗装、防護柵の設置を行っています。

工事期間中は地元の方々には何かとご負担をおかけしますが、引き続き豊田南・北バイパス工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
