

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


蒲郡バイパス 工事便り



発行 第2号
平成24年7月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長:(株)近藤組 杉江 俊太郎
TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463


監修:名四国道蒲郡建設監督官詰所
TEL 0533-67-0286、FAX 0533-67-0287

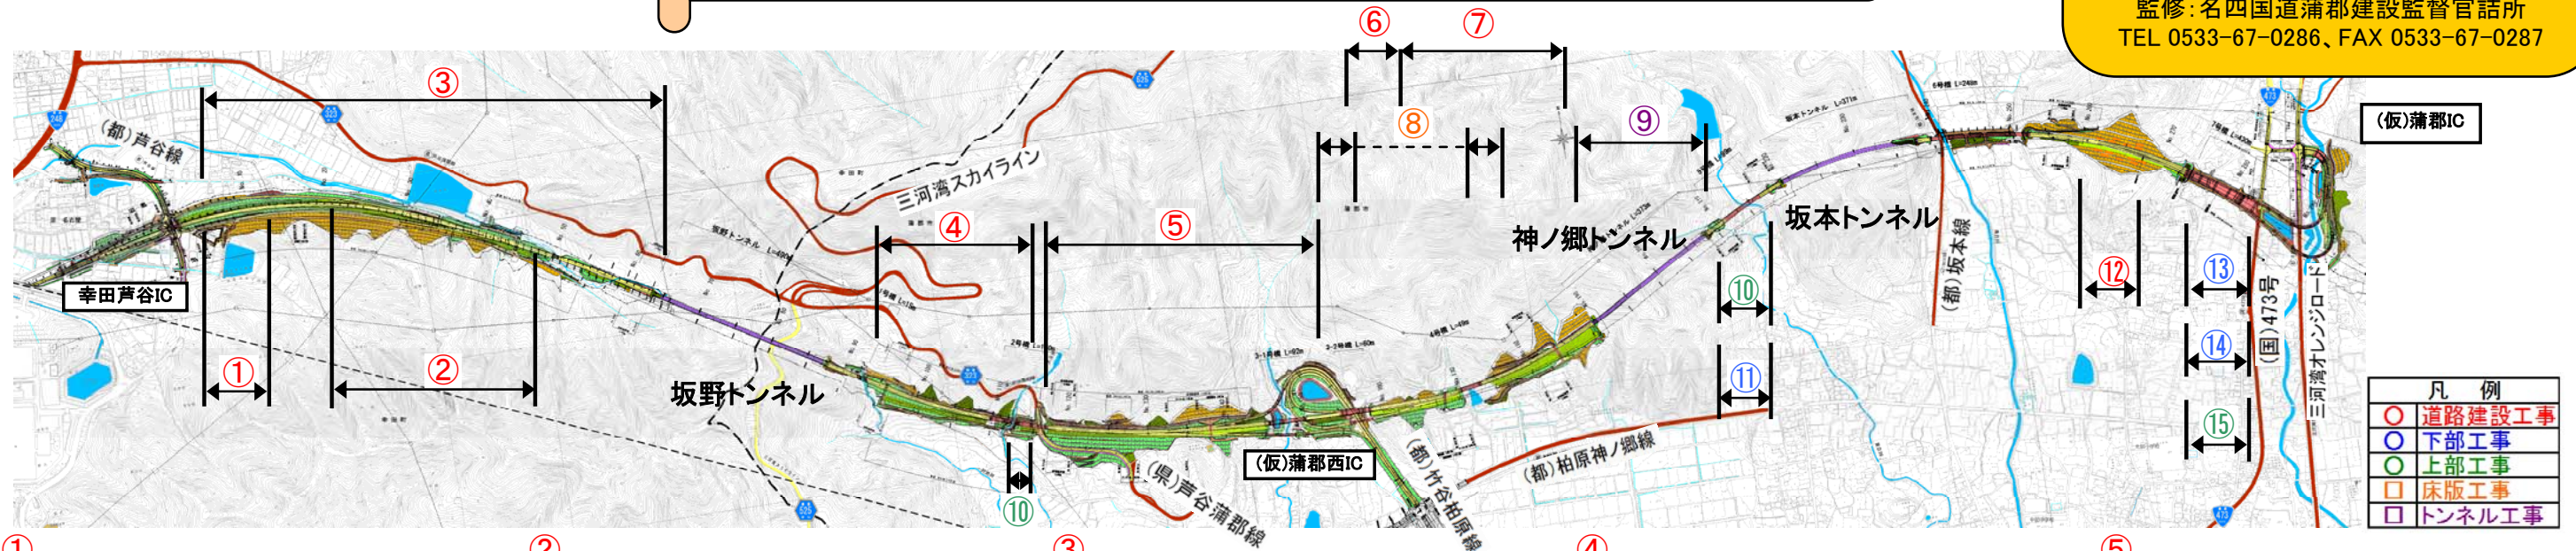




幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル東側区間

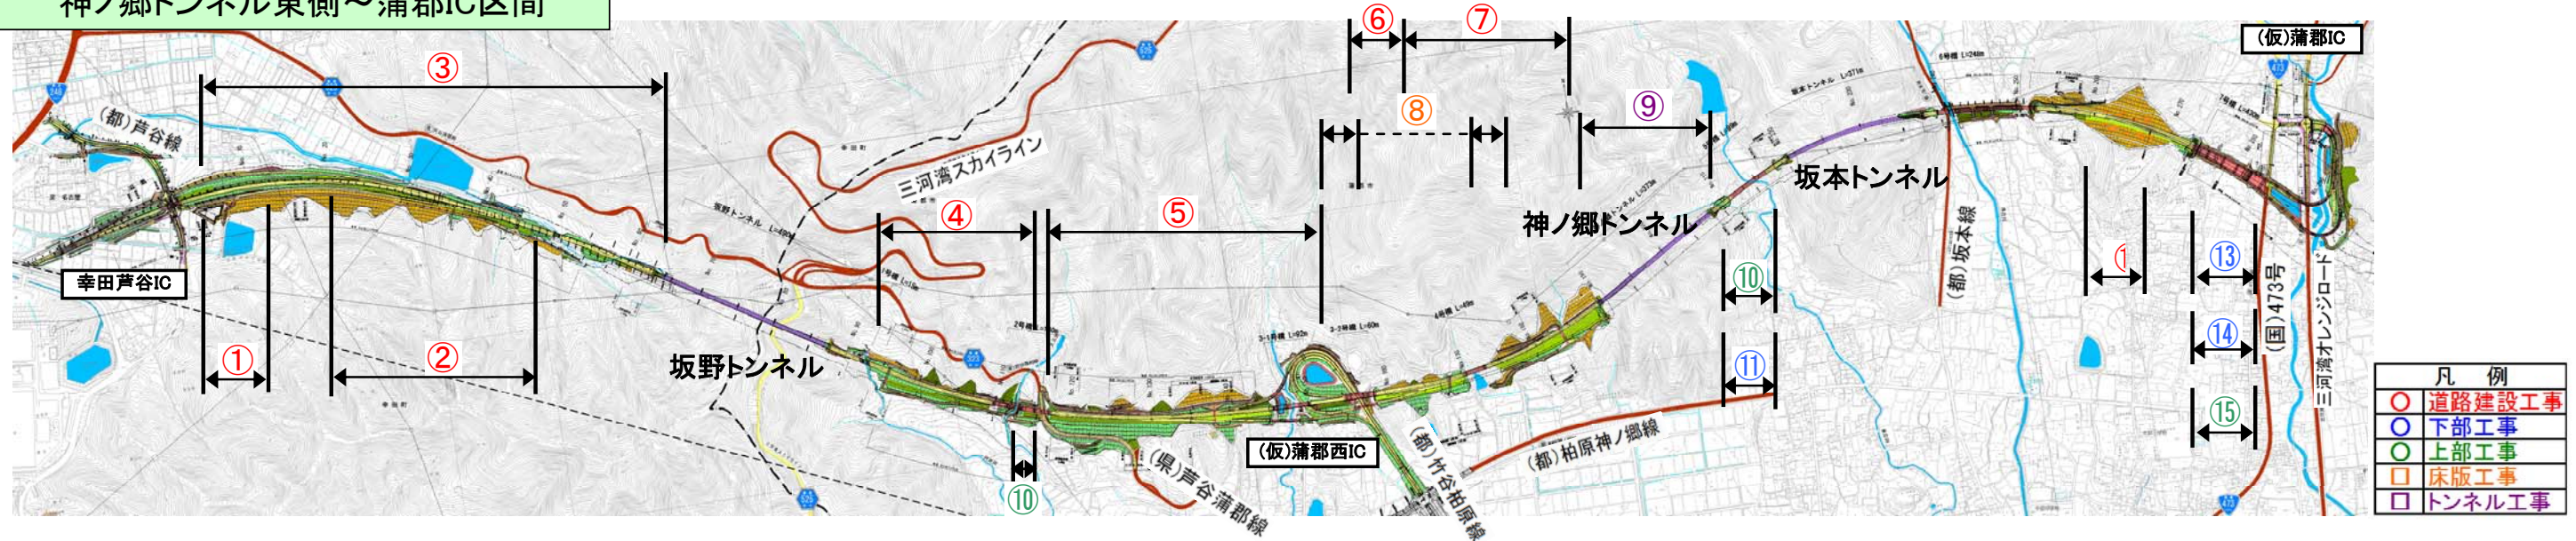

①	②	③	④	⑤
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP芦谷東道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事
工期 平成24年3月30日～平成24年10月31日	工期 平成24年3月7日～平成24年10月30日	工期 平成23年8月11日～平成24年8月31日	工期 平成24年3月13日～平成24年10月31日	工期 平成24年3月28日～平成24年10月31日
施工業者 (株)近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463	施工業者 (株)近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463	施工業者 朝日工業(株) TEL 0564-62-1556、FAX 0564-62-8438	施工業者 中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101	施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386
5月末時点進捗率 3%	5月末時点進捗率 7%	5月末時点進捗率 59%	5月末時点進捗率 0%	5月末時点進捗率 0%
7月作業内容 掘削工、残土処理工	7月作業内容 掘削工、残土処理工、重力式擁壁工	7月作業内容 補強土壁工、路体盛土	7月作業内容 擁壁工、路床盛土工	7月作業内容 重力式擁壁工、補強土壁工
				
幸田芦谷ICを望む	名古屋側より豊橋側を望む:着手前	幸田芦谷ICを望む	豊橋側より名古屋側を望む:着手前	豊橋側より名古屋側を望む:着手前
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取西地区道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事	工事名 平成21年度 23号蒲郡BP神ノ郷トンネル工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
工期 平成23年11月18日～平成24年11月30日	工期 平成23年9月17日～平成24年12月20日	工期 平成23年9月16日～平成24年11月22日	工期 平成22年3月11日～平成24年10月3日	工期 平成24年2月25日～平成25年2月28日
施工業者 TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113	施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520	施工業者 神野建設(株) TEL 0533-67-1622、FAX 0533-67-1644	施工業者 (株)フジタ TEL 0533-66-0950、FAX 0533-67-1320	施工業者 (株)安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465
5月末時点進捗率 31%	5月末時点進捗率 45%	5月末時点進捗率 63%	5月末時点進捗率 92%	5月末時点進捗率 1%
7月作業内容 盛土工、補強土壁工	7月作業内容 道路土工、擁壁工、法面工	7月作業内容 大型ブロック積工	7月作業内容 終点側坑門工、付替水路、法面工 他	7月作業内容 主桁架設工、橋面工
				
名古屋側より調整池部を望む	擁壁工を望む	(仮)蒲郡西ICランプ橋を望む	神ノ郷トンネル内	柏原2号橋(側道上り線):着手前(工場製作中)

神ノ郷トンネル東側～蒲郡IC区間



⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
工 事 名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事	工 事 名 平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事	工 事 名 平成22年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事	工 事 名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事	工 事 名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事
工 期 平成23年9月23日～平成25年2月22日	工 期 平成23年10月21日～平成24年12月20日	工 期 平成23年1月23日～平成24年6月27日	工 期 平成24年2月3日～平成24年10月31日	工 期 平成24年3月1日～平成25年3月18日
施 工 業 者 株式会社三菱 TEL 0533-66-3570、FAX 0533-66-3580	施 工 業 者 吉川建設株式会社 TEL 0533-69-8060、FAX 0533-69-8052	施 工 業 者 榎森組 TEL 0533-66-6236、FAX 0533-66-6237	施 工 業 者 榎新井組 TEL 0533-95-4621、FAX 0533-95-4622	施 工 業 者 榎横河ブリッジ TEL 06-6479-8588、TEL 06-6441-7527
5月末時点 進捗率 40%	5月末時点 進捗率 35%	5月末時点 進捗率 99%	5月末時点 進捗率 1%	5月末時点 進捗率 20%
7月作業内容 橋脚工、橋台工、農業用水工	7月作業内容 掘削工、残土処理工	7月作業内容 完成	7月作業内容 場所打杭工、床掘工(土留・仮締切工)	7月作業内容 工場製作中
				
坂本トンネルより名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	A1橋台：豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む：着手前	豊橋側より名古屋側を望む：着手前(工場製作中)

編集長からひと言



日頃より、国道23号蒲郡BPの工事にご協力頂き厚く御礼申し上げます。

私の担当する「平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事」は樹木の伐採が完了し、主な作業となる切土工事を施工中であります。これから約4ヶ月の間、土を搬出していきますが、工事用車両の運行は交通ルールを厳守し、一般車両・歩行者を最優先とし安全運転に努めます。

現在、蒲郡BP工事関係車両はオレンジ色のプレート掲げて走行しています。オレンジ色のプレート掲げた車両が地元の皆様を始め、第三者の通行の妨げとならない様、日々教育・指導していきますのでご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

また芦谷地区においては自然環境の保全を大きく設計に取り入れており、その例の一つが『斜路付側溝』というもので、カエルやカメ等の小動物が側溝の中に落ちてしまっても、自力で容易に這い上がる構造となっております。(右写真参照) これからも環境保全を常に意識した施工を進めていきます。よろしくお願い致します。

