

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。


# 蒲郡バイパス 工事便り

幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル東側区間

発行 第5号  
平成24年10月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長: 鈴木工業(株) 高橋幸男  
TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520

監修: 名四国道蒲郡建設監督官詰所  
TEL 0533-67-0286、FAX 0533-67-0287

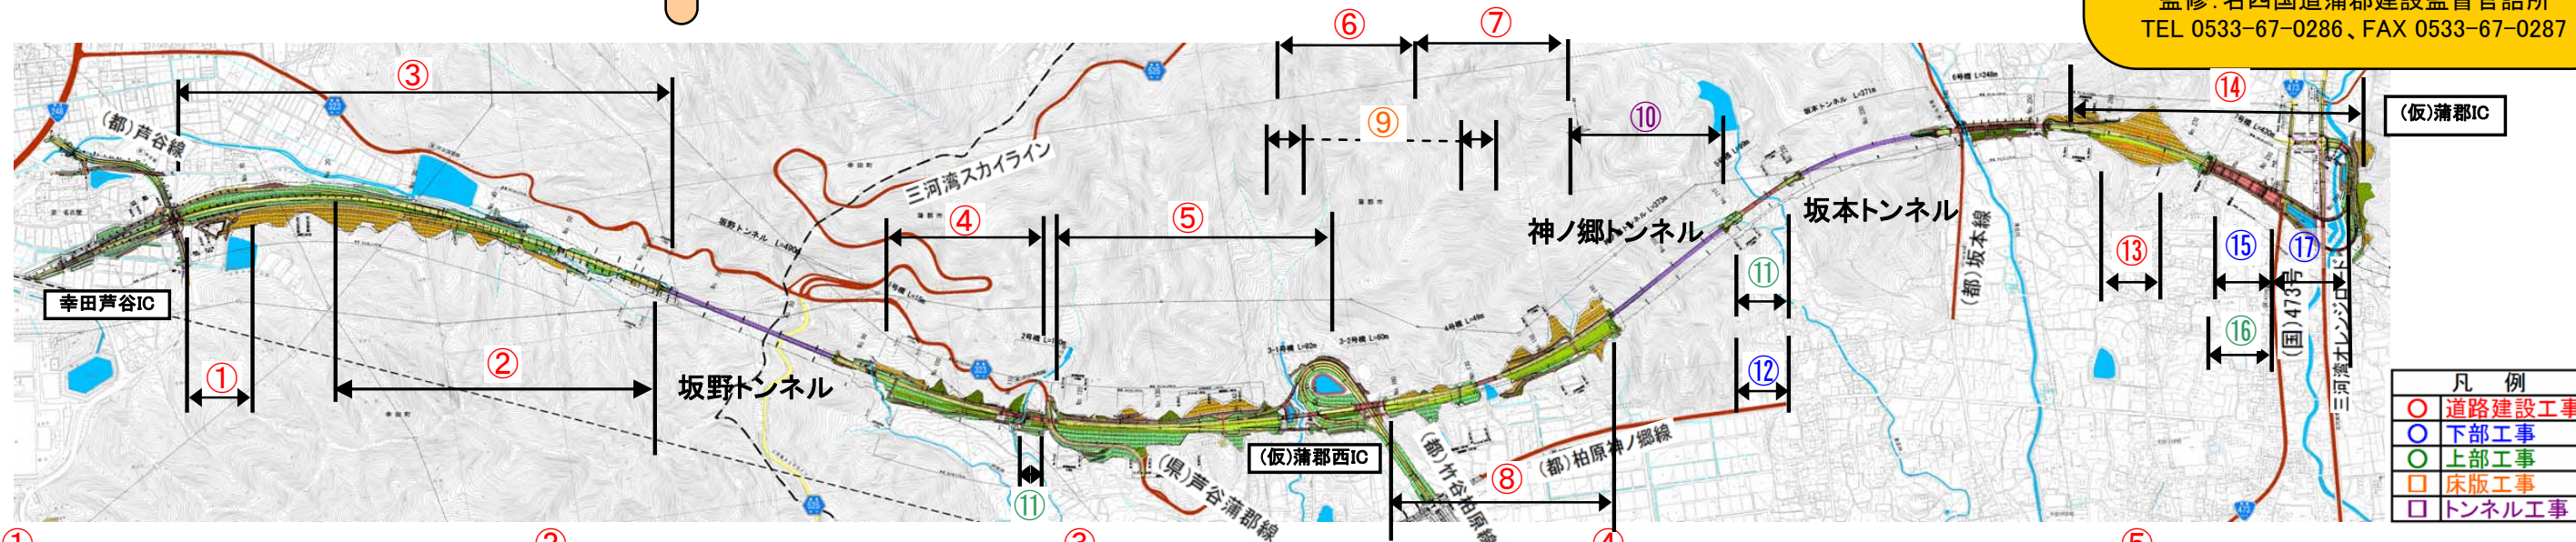


①	②	③	④	⑤
工事名	平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事	平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事	平成23年度 23号蒲郡BP芦谷東道路建設工事	平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事
工期	平成24年3月30日～平成24年10月31日	平成24年3月7日～平成24年10月30日	平成23年8月11日～平成24年8月31日	平成24年3月13日～平成24年10月31日
施工業者	株近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463	株近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463	朝日工業(株) TEL 0564-62-1556、FAX 0564-62-8438	中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101
8月末時点進捗率	36%	67%	100%	45%
10月作業内容	掘削工、残土運搬工	掘削工、残土運搬工、擁壁工、排水処理工	工事完成	擁壁工、盛土工、場所打杭工
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	幸田芦谷ICから豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

完成しました！

⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事	平成23年度 23号蒲郡BP上名取西地区道路建設工事	平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事	平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事
工期	平成23年11月18日～平成24年11月30日	平成23年9月17日～平成24年12月20日	平成24年9月7日～平成25年3月15日	平成23年9月16日～平成24年11月22日
施工業者	TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113	鈴木工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520	黒柳建設(株)	神野建設(株) TEL 0533-67-1622、FAX 0533-67-1644
8月末時点進捗率	57%	78%	0%	89%
10月作業内容	盛土工、排水工	道路土工、法面工	準備中	踏掛板工
(仮)蒲郡西ICを望む	名古屋側より豊橋側を望む	準備中	(仮)蒲郡西ICランプ橋を望む	神ノ郷トンネル名古屋側を望む

新規工事です！

神ノ郷トンネル東側～蒲郡IC区間

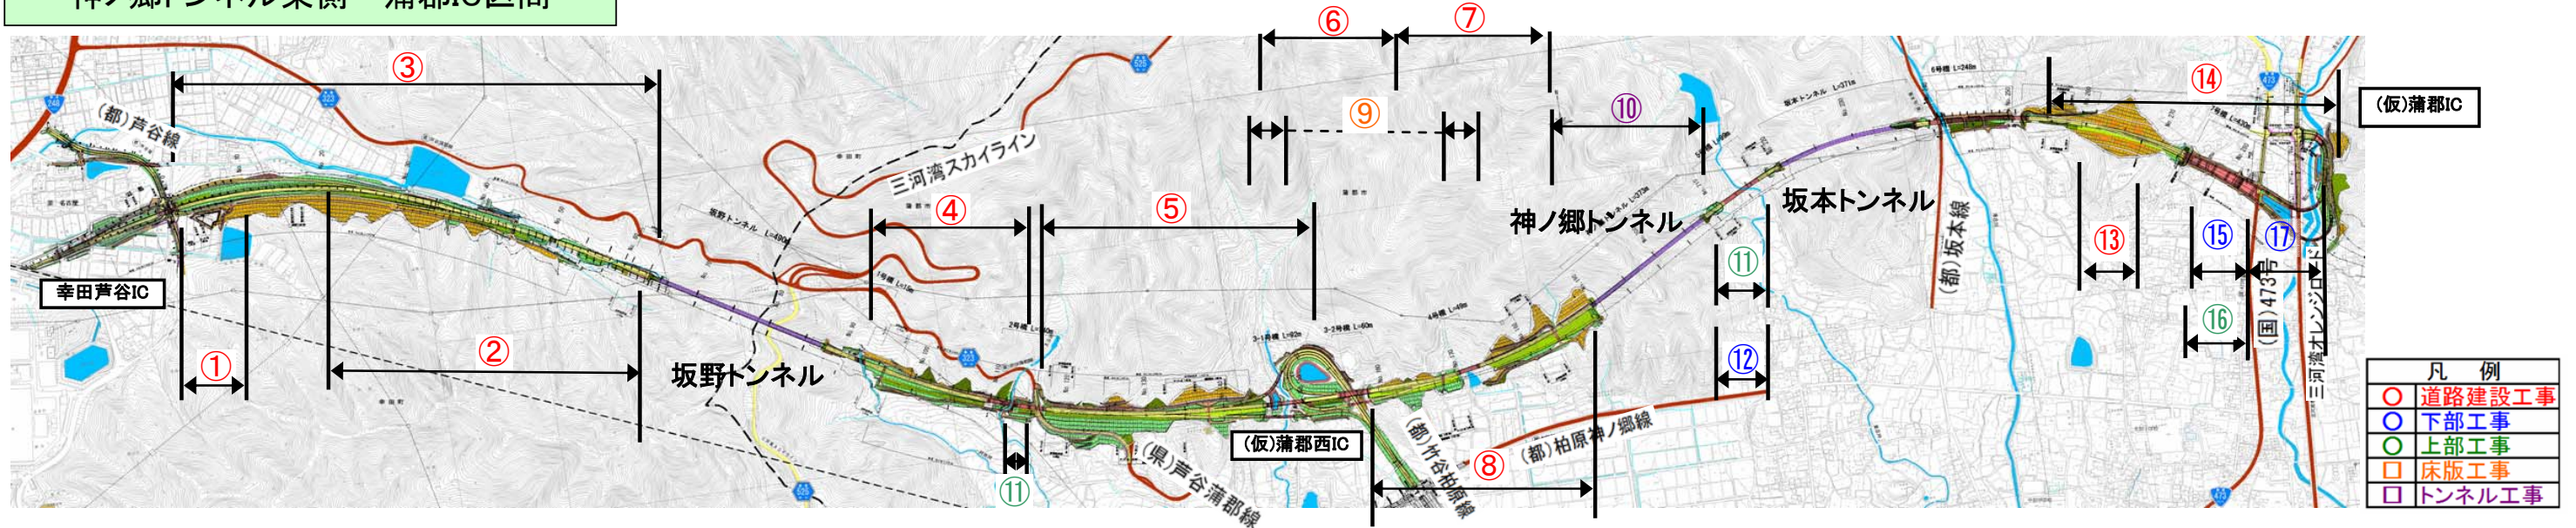

⑪	工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
	工期	平成24年2月25日～平成25年2月28日
	施工業者	株式会社日鋼工業 TEL 0533-69-1464, FAX 0533-69-1465
	8月末時点進捗率	12%
	10月作業内容	工場製作中(神ノ郷高架橋上部工)
	柏原側道橋を望む	

⑫	工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事
	工期	平成23年9月23日～平成25年2月22日
	施工業者	株式会社エス三菱 TEL 0533-66-3570, FAX 0533-66-3580
	8月末時点進捗率	59%
	10月作業内容	橋台工、盛土工
	坂本トンネルより名古屋側を望む	

⑬	工事名	平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
	工期	平成23年10月21日～平成24年12月20日
	施工業者	吉川建設株式会社 TEL 0533-69-8060, FAX 0533-69-8052
	8月末時点進捗率	67%
	10月作業内容	掘削工、残土運搬工、工事用道路工
	名古屋側より豊橋側を望む	

⑭	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田東建設工事
	工期	平成24年7月27日～平成25年3月25日
	施工業者	(株)ヒメノ TEL 0533-68-5502, FAX 0533-68-5508
	8月末時点進捗率	1%
	10月作業内容	準備工
	(仮)蒲郡ICランプ部を望む:着手前	

⑮	工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事
	工期	平成24年2月3日～平成24年12月28日
	施工業者	株式会社新井組 TEL 0533-95-4621, FAX 0533-95-4622
	8月末時点進捗率	49%
	10月作業内容	橋脚躯体工
	名古屋側より豊橋側を望む	

⑯	工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事
	工期	平成24年3月1日～平成25年3月18日
	施工業者	株式会社横河ブリッジ TEL 06-6479-8588, TEL 06-6441-7527
	8月末時点進捗率	64%
	10月作業内容	工場製作中
	名古屋側より豊橋側を望む:着手前(工場製作中)	

⑰	工事名	平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ下部工事
	工期	平成24年9月14日～平成25年3月22日
	施工業者	朝日工業株式会社
	8月末時点進捗率	0%
	10月作業内容	準備工
	準備中	

新規工事です！

編集長からひと言



平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、格別のご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。

私共の担当する工事は、(仮)蒲郡西ICから神ノ郷トンネル付近までの延長約600mが工事区間となります。

主な工事内容は盛土工約40,000m<sup>3</sup>、植生工約5,000m<sup>2</sup>、鉄筋挿入工約1,200m、擁壁工(重力式擁壁工7箇所、補強土壁工5箇所)で、擁壁をつくり盛土をして道路の形に造成する工事です。

山あいの場所なので皆様からは見えづらい場所となっており、どこで工事しているのかとされているかもしれません。



鉄筋挿入工施工状況

工事完了まで残りわずかですが、ご迷惑をおかけしないよう引き続き工事を進めて参りたいと思います。

また、工事の施工に際して、林道中田亀山2号線の通行止にご理解ご協力いただき、この場をお借りしてお礼申し上げます。

各地区共に工事は最盛期に入って、工事関係車両の出入りも多くなってきます。お気付きの点があれば気軽にお申し付けください。

なお、安全には十分注意して、早期完成を目指し努力して参りますので、引き続きご理解ご協力のほど、宜しくお願い致します。
