


沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 工事便り

幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル西側区間

発行 第6号
平成24年11月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長:吉川建設(株) 三輪 芳久
TEL 0533-69-8060、FAX 0533-69-8052
監修:名四国道蒲郡建設監督官詰所
TEL 0533-67-0286、FAX 0533-67-0287

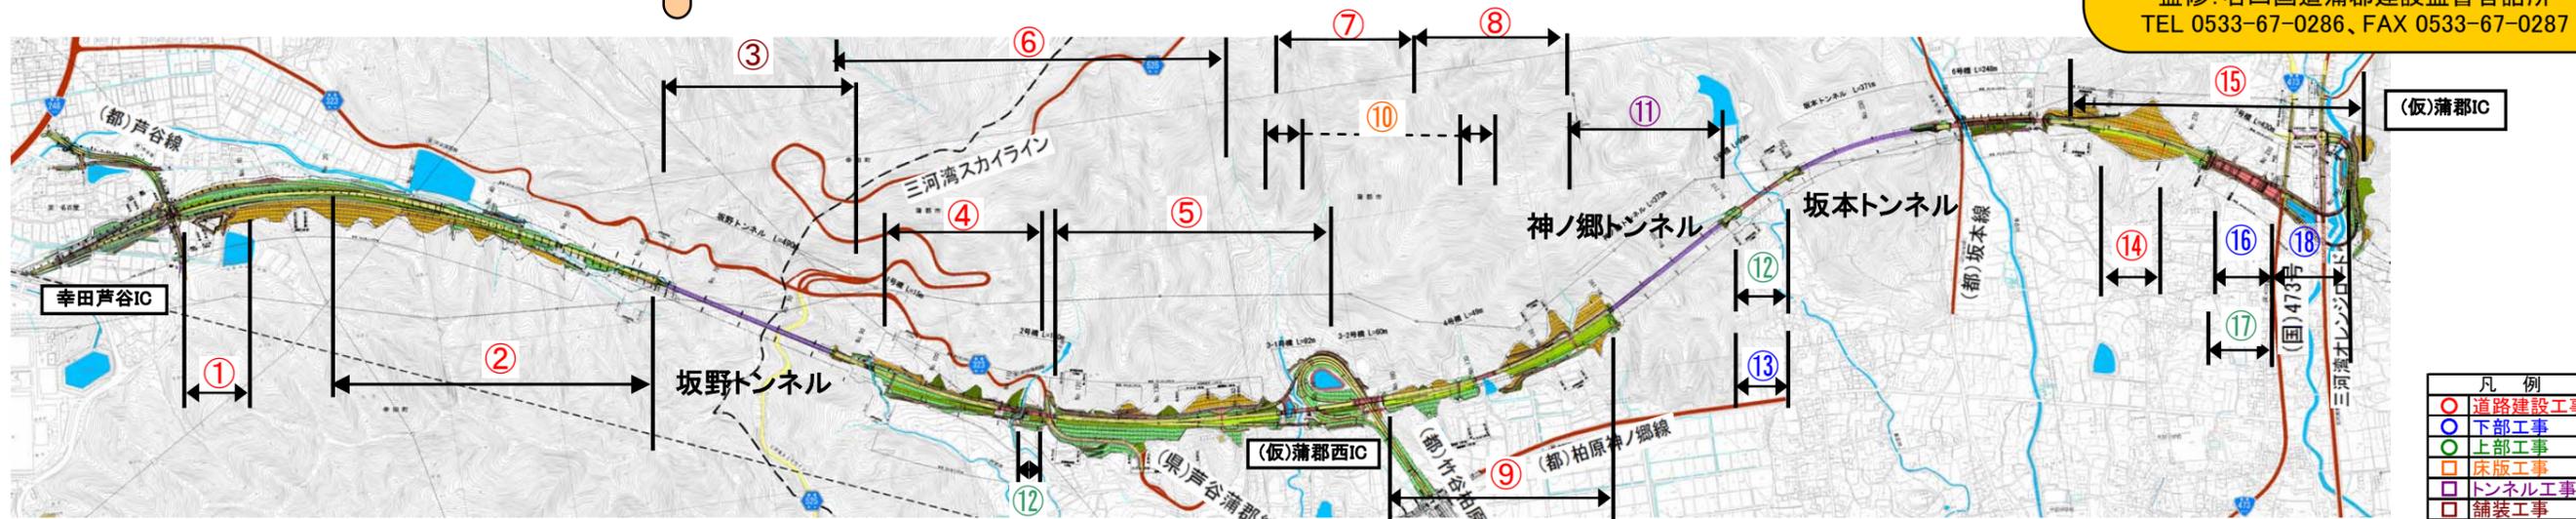


<p>①</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月30日～平成24年10月31日平成25年1月31日</p> <p>施工業者 ㈱近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463</p> <p>9月末時点進捗率 49%</p> <p>10月作業内容 掘削工、残土運搬工、排水工</p> <p>幸田芦谷ICより豊橋側を望む</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月7日～平成24年10月30日平成25年1月31日</p> <p>施工業者 ㈱近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463</p> <p>9月末時点進捗率 69%</p> <p>10月作業内容 掘削工、残土運搬工、法面工、擁壁工、排水処理工</p> <p>芦谷地区の切土を望む</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP坂野トンネル舗装工事</p> <p>工期 平成24年9月25日～平成25年3月22日</p> <p>施工業者 世紀東急工業(株)</p> <p>9月末時点進捗率 0%</p> <p>10月作業内容 準備工</p> <p>坂野トンネル名古屋側を望む:着手前</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月13日～平成24年10月31日平成25年1月31日</p> <p>施工業者 中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101</p> <p>9月末時点進捗率 64%</p> <p>10月作業内容 擁壁工、盛土工、電気室、排水処理工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑤</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月28日～平成25年2月28日</p> <p>施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386</p> <p>9月末時点進捗率 24%</p> <p>10月作業内容 調整池工、擁壁工、踏掛版工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
--	--	--	--	---

新規工事です！

<p>⑥</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月22日～平成25年3月15日</p> <p>施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520</p> <p>9月末時点進捗率 0%</p> <p>10月作業内容 道路土工、法面工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む:着手前</p>	<p>⑦</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事</p> <p>工期 平成23年11月18日～平成24年11月30日平成25年3月25日</p> <p>施工業者 TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113</p> <p>9月末時点進捗率 62%</p> <p>10月作業内容 盛土工、排水工、擁壁工</p> <p>(仮)蒲郡西ICを望む</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取西地区道路建設工事</p> <p>工期 平成23年9月17日～平成24年12月20日</p> <p>施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520</p> <p>9月末時点進捗率 94%</p> <p>10月作業内容 道路土工、法面工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月7日～平成25年3月15日</p> <p>施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612</p> <p>9月末時点進捗率 0%</p> <p>10月作業内容 準備工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む:着手前</p>	<p>⑩</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事</p> <p>工期 平成23年9月16日～平成24年11月22日</p> <p>施工業者 神野建設(株) TEL 0533-67-1622、FAX 0533-67-1644</p> <p>9月末時点進捗率 91%</p> <p>10月作業内容 踏掛板工、情報管路工</p> <p>(仮)蒲郡西ICランプ橋を望む</p>
--	--	--	--	---

新規工事です！

神ノ郷トンネル西側～蒲郡IC区間

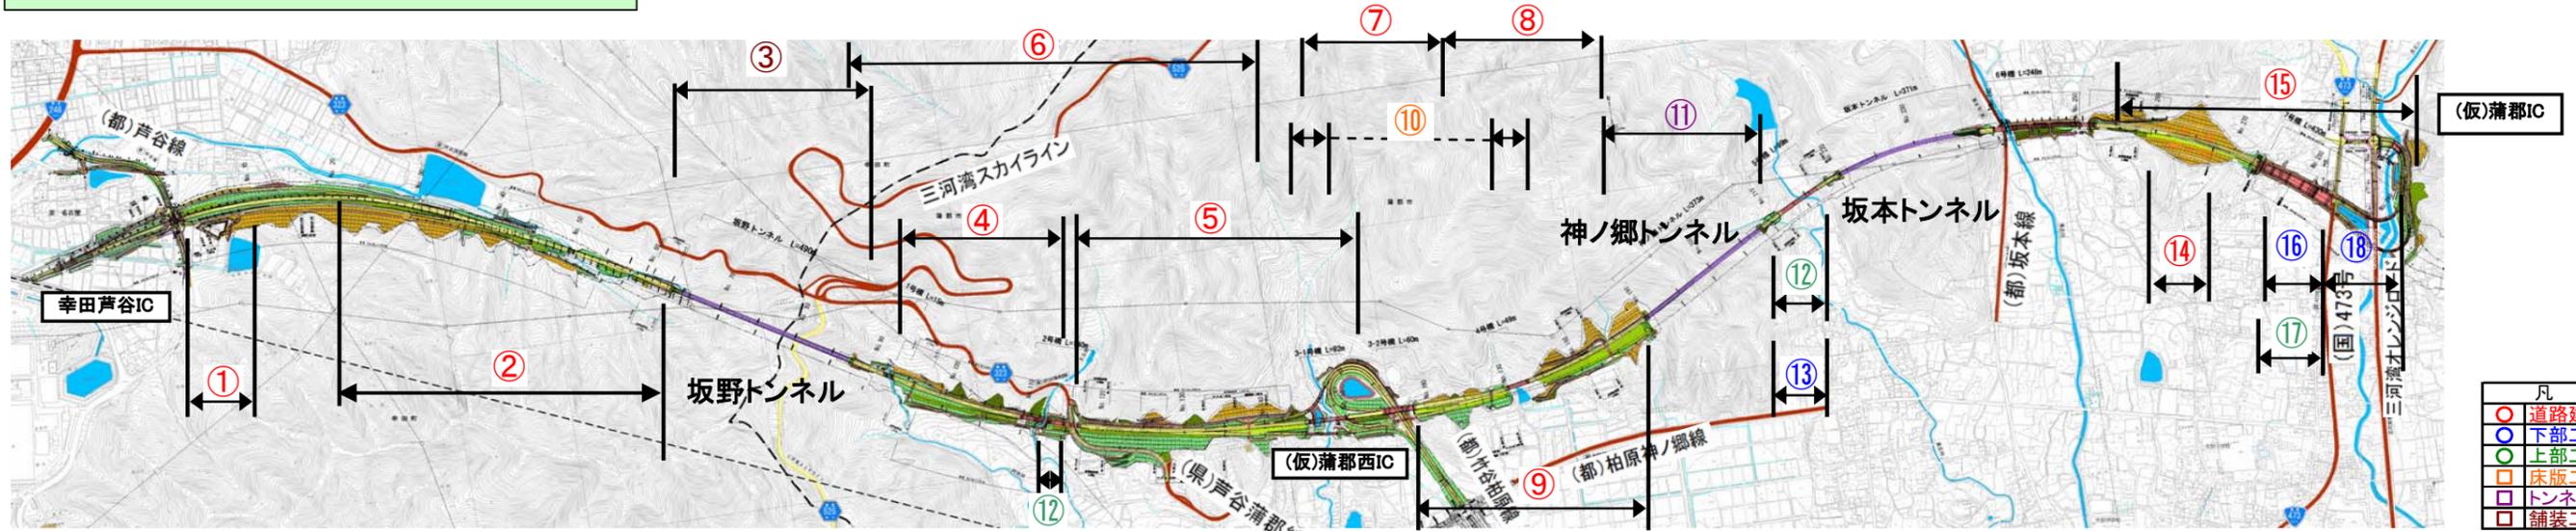

⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
工事名 平成21年度 23号蒲郡BP神ノ郷トンネル工事 工期 平成22年3月11日～平成24年10月3日 施工業者 ㈱フジタ TEL 0533-66-0950、FAX 0533-67-1320 9月末時点進捗率 100% 10月作業内容 工事完成  神ノ郷トンネル豊橋側を望む	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事 工期 平成24年2月25日～平成25年2月28日 施工業者 ㈱安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465 9月末時点進捗率 13% 10月作業内容 工場製作中(神ノ郷高架橋上部工)  柏原側道橋を望む	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事 工期 平成23年9月23日～平成25年2月22日 施工業者 ㈱ピーエス三菱 TEL 0533-66-3570、FAX 0533-66-3580 9月末時点進捗率 72% 10月作業内容 橋台工、擁壁工  坂本トンネルより名古屋側を望む	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事 工期 平成23年10月21日～平成24年12月20日 施工業者 吉川建設㈱ TEL 0533-69-8060、FAX 0533-69-8052 9月末時点進捗率 72% 10月作業内容 掘削工、残土運搬工、工事用道路工、排水処理工  名古屋側より豊橋側を望む	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成24年7月27日～平成25年3月25日 施工業者 (株)ヒメノ TEL0533-68-5502、FAX0533-68-5508 9月末時点進捗率 2% 10月作業内容 排水処理工  (仮)蒲郡ICランプ部を望む:着手前

完成しました!

⑯	⑰	⑱
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事 工期 平成24年2月3日～平成24年12月28日 施工業者 ㈱新井組 TEL 0533-95-4621、FAX 0533-95-4622 9月末時点進捗率 66% 10月作業内容 橋脚躯体工  名古屋側より豊橋側を望む	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事 工期 平成24年3月1日～平成25年3月18日 施工業者 ㈱横河ブリッジ TEL 06-6479-8588、TEL 06-6441-7527 9月末時点進捗率 65% 10月作業内容 工場製作中  豊橋側より名古屋側を望む:着手前(工場製作中)	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ下部工事 工期 平成24年9月14日～平成25年3月22日 施工業者 朝日工業㈱ TEL 0533-95-4305、FAX 0533-95-4306 9月末時点進捗率 0% 10月作業内容 準備工  名古屋側より豊橋側を望む:着手前

編集長からひと言



平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、格別のご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
 私共の担当する『平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事』は、切土工事と残土運搬が主となる工事です。
 工事完成までに約13万m³(大型ダンプ26000台分)の土を掘削・搬出する工事で、9月末現在で計画の約80%の土を掘削・搬出しました。
 毎日沢山の大型ダンプで運搬しており、皆様方には、大変ご迷惑を御掛けしております。
 近頃は、「山の形がだいぶ変わってきましたね」とよく声を掛けられます。地元の方々の感心の高い工事を施工している事を再度認識し、安全意識を高く持ち施工して行きたいと思っております。
 今後とも、オレンジ色のプレート掲げた大型ダンプで土を搬出致しますので、お気付きの点があれば気軽にお申し付けください。



ブルドーザー(こんなに大きな機械を使用しています。)

工事完成までの2カ月半、安全には十分注意して、早期完成を目指し努力して参りますので、引き続きご理解ご協力のほど、宜しくお願い致します。

平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
 現場代理人 三輪 芳久
