

# 蒲郡バイパス 工事便り

幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル西側区間

## 新年明けましておめでとうございます。

沿線の皆さまには、日頃から国道23号蒲郡バイパスに対するご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。


おかげさまで「蒲郡バイパス工事便り」第8号を発刊することとなりました。引き続き開通まで月1回を目標に、沿線地域の皆さまに工事状況を「蒲郡バイパス工事便り」に載せお伝えします。

なお、名四国道蒲郡建設監督官詰所につきまして、平成24年12月17日より豊川市御津町に移転をしました。それに合わせ連絡先も変わりました。引続きよろしくお願ひします。

**発行 第8号**  
平成25年1月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長: 榊安部日鋼工業 羽田野 博行  
TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465

監修: 名四国道蒲郡建設監督官詰所  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

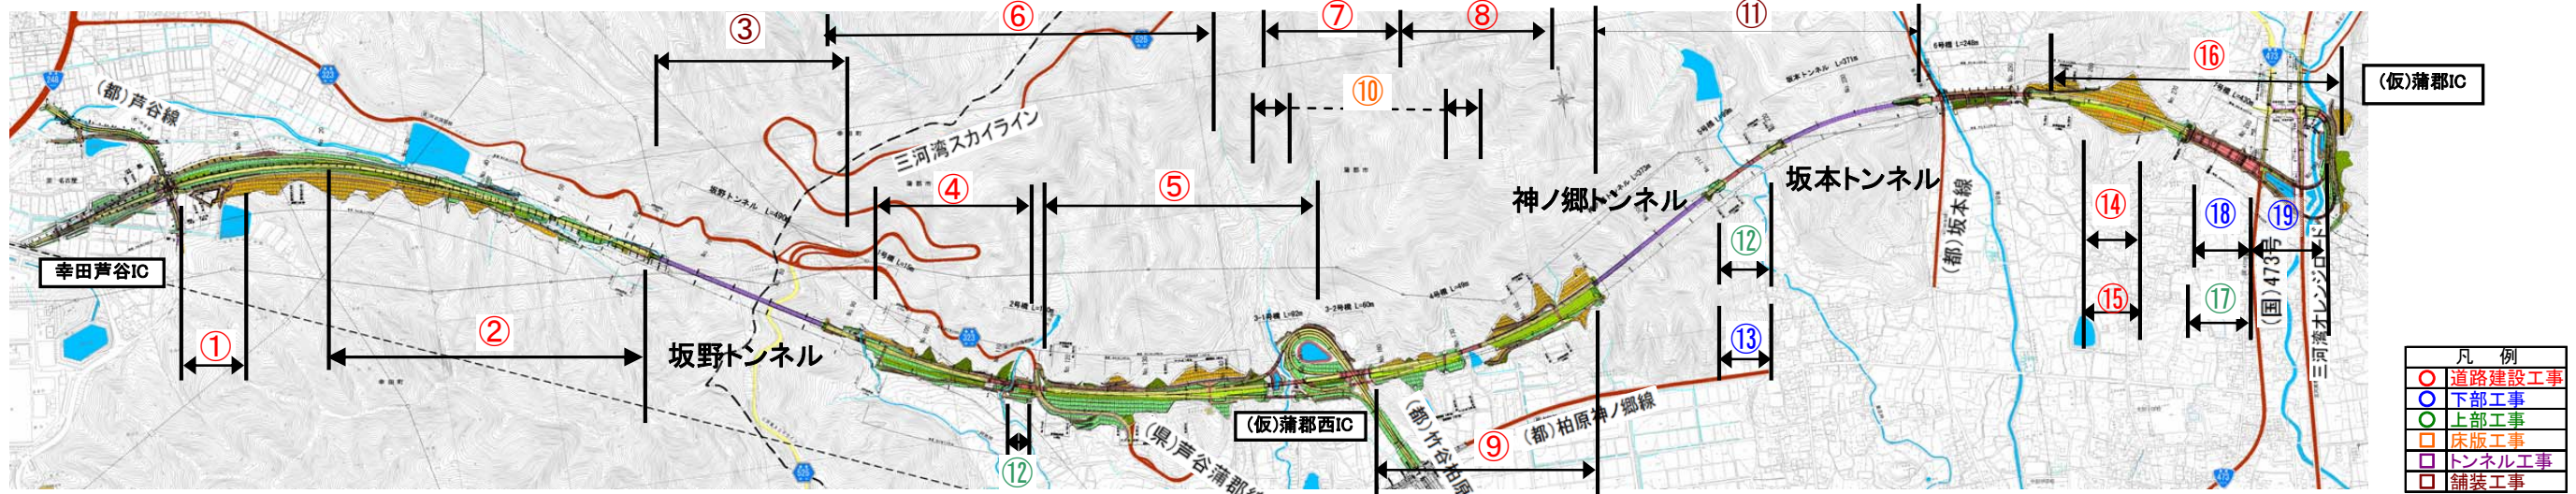


<p>①</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月30日～平成25年1月31日</p> <p>施工業者 榊近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463</p> <p>11月末時点進捗率 <b>65%</b></p> <p>12月作業内容 伐採工、掘削工、残土運搬工、排水工</p> <p>幸田芦谷ICより豊橋側を望む</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月7日～平成25年1月31日</p> <p>施工業者 榊近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463</p> <p>11月末時点進捗率 <b>97%</b></p> <p>12月作業内容 法面工</p> <p>芦谷地区の切土を望む</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP坂野トンネル舗装工事</p> <p>工期 平成24年9月25日～平成25年3月22日</p> <p>施工業者 世紀東急工業(株) TEL 0564-64-2697、FAX 0564-64-2698</p> <p>11月末時点進捗率 <b>2%</b></p> <p>12月作業内容 準備工、排水構造物工、情報ボックス工、配水管工</p> <p>坂野トンネル名古屋側を望む</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月13日～平成25年1月31日</p> <p>施工業者 中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101</p> <p>11月末時点進捗率 <b>86%</b></p> <p>12月作業内容 電気室、踏掛版工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑤</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月28日～平成25年2月28日</p> <p>施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386</p> <p>11月末時点進捗率 <b>44%</b></p> <p>12月作業内容 調整池工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>
--	--	---	---	---

<p>⑥</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月22日～平成25年3月15日</p> <p>施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520</p> <p>11月末時点進捗率 <b>16%</b></p> <p>12月作業内容 盛土工、排水構造物工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む: 着手前</p>	<p>⑦</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事</p> <p>工期 平成23年11月18日～平成25年3月25日</p> <p>施工業者 TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113</p> <p>11月末時点進捗率 <b>74%</b></p> <p>12月作業内容 路体・路床・盛土工、補強土壁工、排水構造物工</p> <p>(仮)蒲郡西ICを望む</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取西地区道路建設工事</p> <p>工期 平成23年9月17日～平成24年12月20日</p> <p>施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520</p> <p>11月末時点進捗率 <b>100%</b></p> <p>12月作業内容 工事完成</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月7日～平成25年3月15日</p> <p>施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612</p> <p>11月末時点進捗率 <b>15%</b></p> <p>12月作業内容 仮橋撤去工、掘削工、残土運搬工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑩</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP上名取橋床版工事</p> <p>工期 平成23年9月16日～平成24年11月22日</p> <p>施工業者 神野建設(株) TEL 0533-67-1622、FAX 0533-67-1644</p> <p>11月末時点進捗率 <b>100%</b></p> <p>12月作業内容 工事完成</p> <p>(仮)蒲郡西ICランプ橋を望む</p>
---	---	--	--	---

完成しました！

完成しました！

神ノ郷トンネル西側～蒲郡IC区間

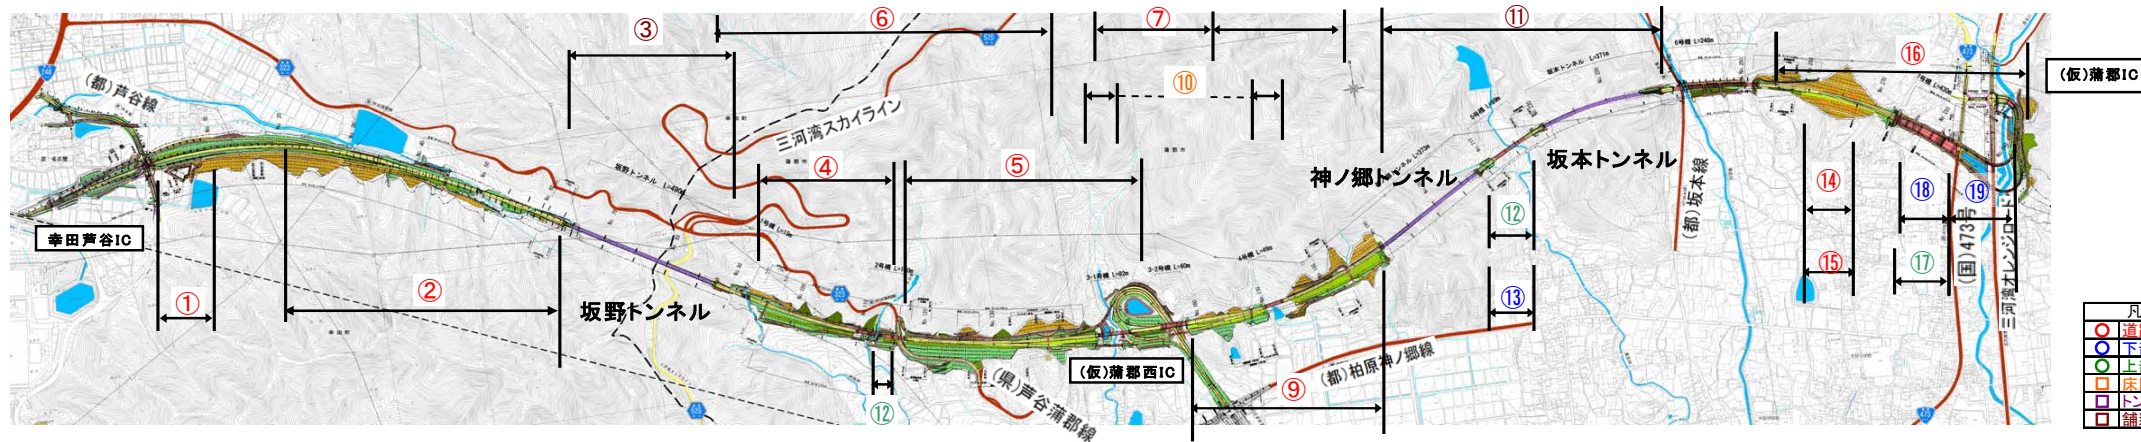

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP神ノ郷・坂本トンネル舗装工事
工期	平成24年11月30日～平成25年3月29日
施工業者	福田道路(株) TEL0533-95-4803,FAX0533-95-4806
11月末時点進捗率	0%
12月作業内容	準備工
神ノ郷トンネル豊橋側を望む:着手前	

新規工事です！

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
工期	平成24年2月25日～平成25年2月28日
施工業者	㈱安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464, FAX 0533-69-1465
11月末時点進捗率	32%
12月作業内容	主桁製作工(工場)、支保工
豊橋側より名古屋側を望む	

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事
工期	平成23年9月23日～平成25年2月22日
施工業者	㈱ピーエス三菱 TEL 0533-66-3570, FAX 0533-66-3580
11月末時点進捗率	79%
12月作業内容	橋台工、擁壁工
坂本トンネルより名古屋側を望む	

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
工期	平成24年11月9日～平成25年12月3日
施工業者	TSUCHIYA(株) TEL 0533-68-7776, FAX 0533-68-7776
11月末時点進捗率	0%
12月作業内容	準備工
名古屋側より豊橋側を望む	

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
工期	平成23年10月21日～平成24年12月20日
施工業者	吉川建設(株) TEL 0533-69-8060, FAX 0533-69-8052
11月末時点進捗率	94%
12月作業内容	掘削工、残土運搬工
名古屋側より豊橋側を望む	

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事
工期	平成24年7月27日～平成25年3月25日
施工業者	(株)ヒメノ TEL0533-68-5502,FAX0533-68-5508
11月末時点進捗率	15%
12月作業内容	伐採工、切土工
(仮)蒲郡ICランプ部を望む	

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事
工期	平成24年2月3日～平成25年3月26日
施工業者	㈱新井組 TEL 0533-95-4621, FAX 0533-95-4622
11月末時点進捗率	85%
12月作業内容	橋脚躯体工
名古屋側より豊橋側を望む	

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事
工期	平成24年3月1日～平成25年3月18日
施工業者	㈱横河ブリッジ TEL 06-6479-8588, TEL 06-6441-7527
11月末時点進捗率	71%
12月作業内容	工場製作中
豊橋側より名古屋側を望む:着手前(工場製作中)	

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ下部工事
工期	平成24年9月14日～平成25年3月22日
施工業者	朝日工業(株) TEL 0533-95-4305, FAX 0533-95-4306
11月末時点進捗率	28%
12月作業内容	橋台・橋脚基礎工
豊橋側より名古屋側を望む	

編集長から一言



平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。  
 私どもの工事は、神ノ郷地区におきまして、神ノ郷トンネルと坂本トンネルの間に架かる「長さ99mのコンクリート橋」の建設を行う工事です。  
 新年1月の正月休み明けから、桁の架設工事を順次施工させて頂きます。この工事では、長さ約35mの桁を5分割し、最大8mのブロック桁として岐阜の工場よりトレーラーで運搬し、現地において接合することにより1本の桁とします。1本の桁となった時の重量は、約90tになります。この約90tの桁を、左下の写真のような大型クレーン(当工事では500tクレーンを使用)で、2月初旬にかけて架設していきます。  
 架設作業中の1月28日・29日には、地元の小中学生を招きまして、総勢約200名の「現場見学会」を予定しております。約1ヶ月間にわたり、コンクリート橋の架設工事を行っていますので、興味のある方は、是非見に来て下さい。  
 架設工事の中には、大型車両の通行が多くなり、地域の皆様方にはご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、安全通行に努めて参りますので、何卒ご協力の程よろしくお願い致します。

平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事  
 監理技術者 羽田野 博行

大型クレーン(参考写真)
