

幸田芦谷IC～神ノ郷区間


沿線地域の皆さま方へ

蒲郡バイパス 工事便り

発行 第9号
平成25年2月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長:TSUCHIYA(株) 高橋 政勝
TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113


監修:名四国道蒲郡建設監督官詰所
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

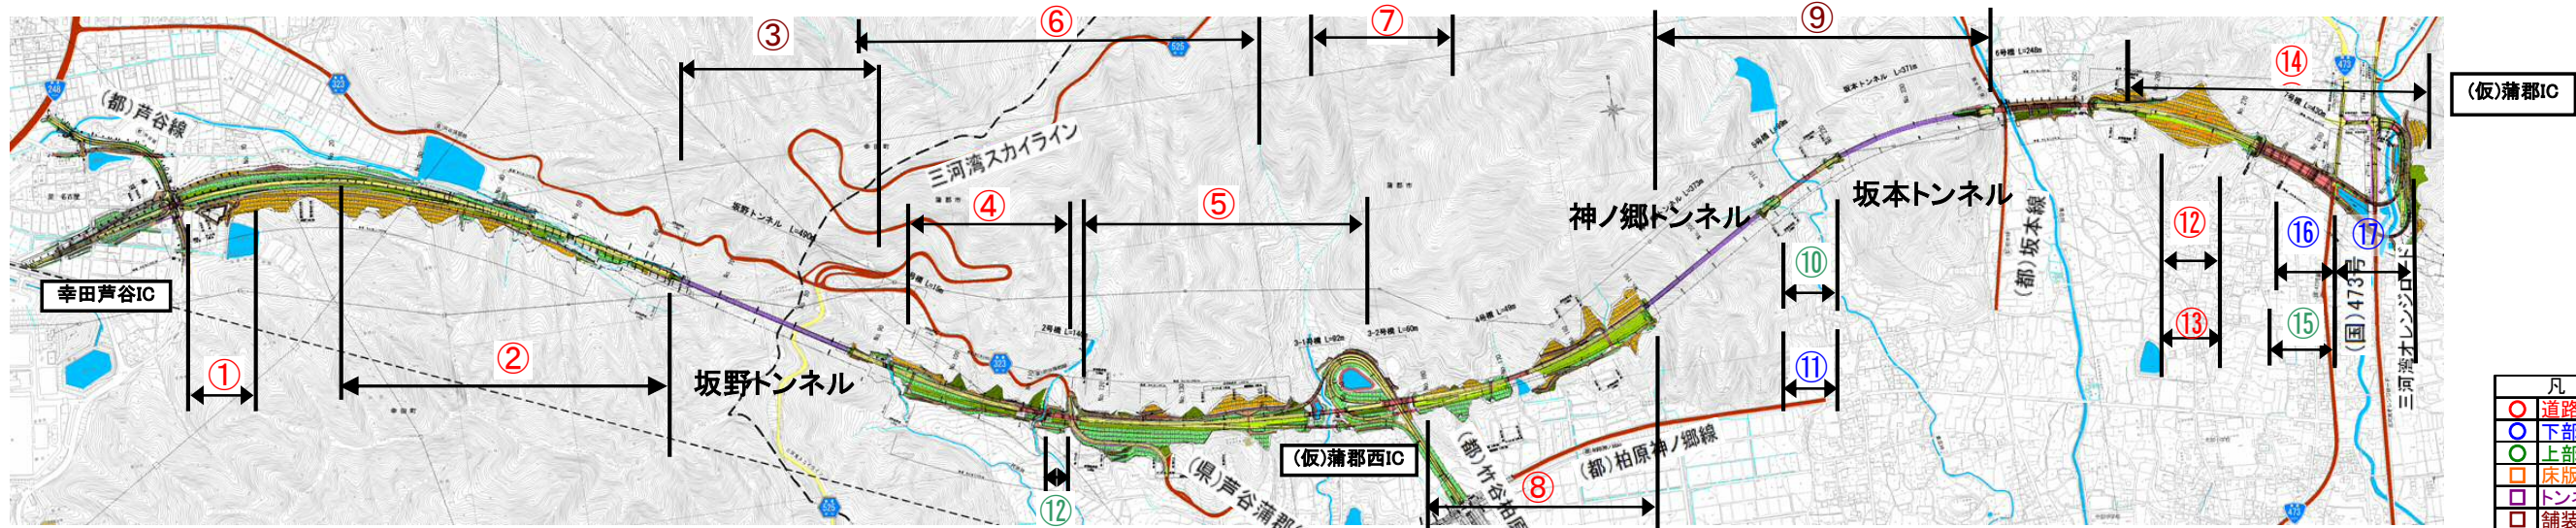

①	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事 工 期平成24年3月30日～平成25年1月31日 3月28日 施 工 業者(株)近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463 12月末時点進捗率70% 1月作業内容掘削工、残土運搬工、排水工  幸田芦谷ICより豊橋側を望む	②	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事 工 期平成24年3月7日～平成25年1月31日 施 工 業者(株)近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463 12月末時点進捗率100% 1月作業内容  芦谷地区の切土を望む	③	工 事 名平成24年度 23号蒲郡BP坂野トンネル舗装工事 工 期平成24年9月25日～平成25年3月22日 施 工 業者世紀東急工業(株) TEL 0564-64-2697、FAX 0564-64-2698 12月末時点進捗率38% 1月作業内容情報ボックス工、配水管工、舗装工  坂野トンネル豊橋側を望む	④	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事 工 期平成24年3月13日～平成25年1月31日 3月22日 施 工 業者中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101 12月末時点進捗率89% 1月作業内容電気室、踏掛版工、剛性防護柵工  豊橋側より名古屋側を望む	⑤	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事 工 期平成24年3月28日～平成25年2月28日 施 工 業者長坂建設興業(株) TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386 12月末時点進捗率64% 1月作業内容調整池工  調整池部を望む
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

⑥		⑦ 完成しました！		⑧		⑨		⑩	
工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事	工 事 名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事	工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事	工 事 名	平成24年度 23号蒲郡BP神ノ郷・坂本トンネル舗装工事	工 事 名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
工 期	平成24年9月22日～平成25年3月15日	工 期	平成23年11月18日～平成25年3月25日	工 期	平成24年9月7日～平成25年3月15日 3月28日	工 期	平成24年11月30日～平成25年3月29日	工 期	平成24年2月25日～平成25年2月28日 3月28日
施 工 者	鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520	施 工 者	TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113	施 工 者	黒柳建設(株) TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612	施 工 者	福田道路(株) TEL0533-95-4803、FAX0533-95-4806	施 工 者	榊安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465
12月末時点進捗率	36%	12月末時点進捗率	81%	12月末時点進捗率	38%	12月末時点進捗率	0%	12月末時点進捗率	43%
1月作業内容	掘削工、盛土工、法面工	1月作業内容	路体・路床・盛土工、補強土壁工、排水構造物工	1月作業内容	掘削工、残土運搬工、排水工、カルバート工	1月作業内容	側溝工	1月作業内容	主桁組立架設工
									
豊橋側より名古屋側を望む		(仮)蒲郡西ICを望む		名古屋側より豊橋側を望む		神ノ郷トンネル豊橋側を望む：着手前		豊橋側より名古屋側を望む	

神ノ郷区間～蒲郡IC区間

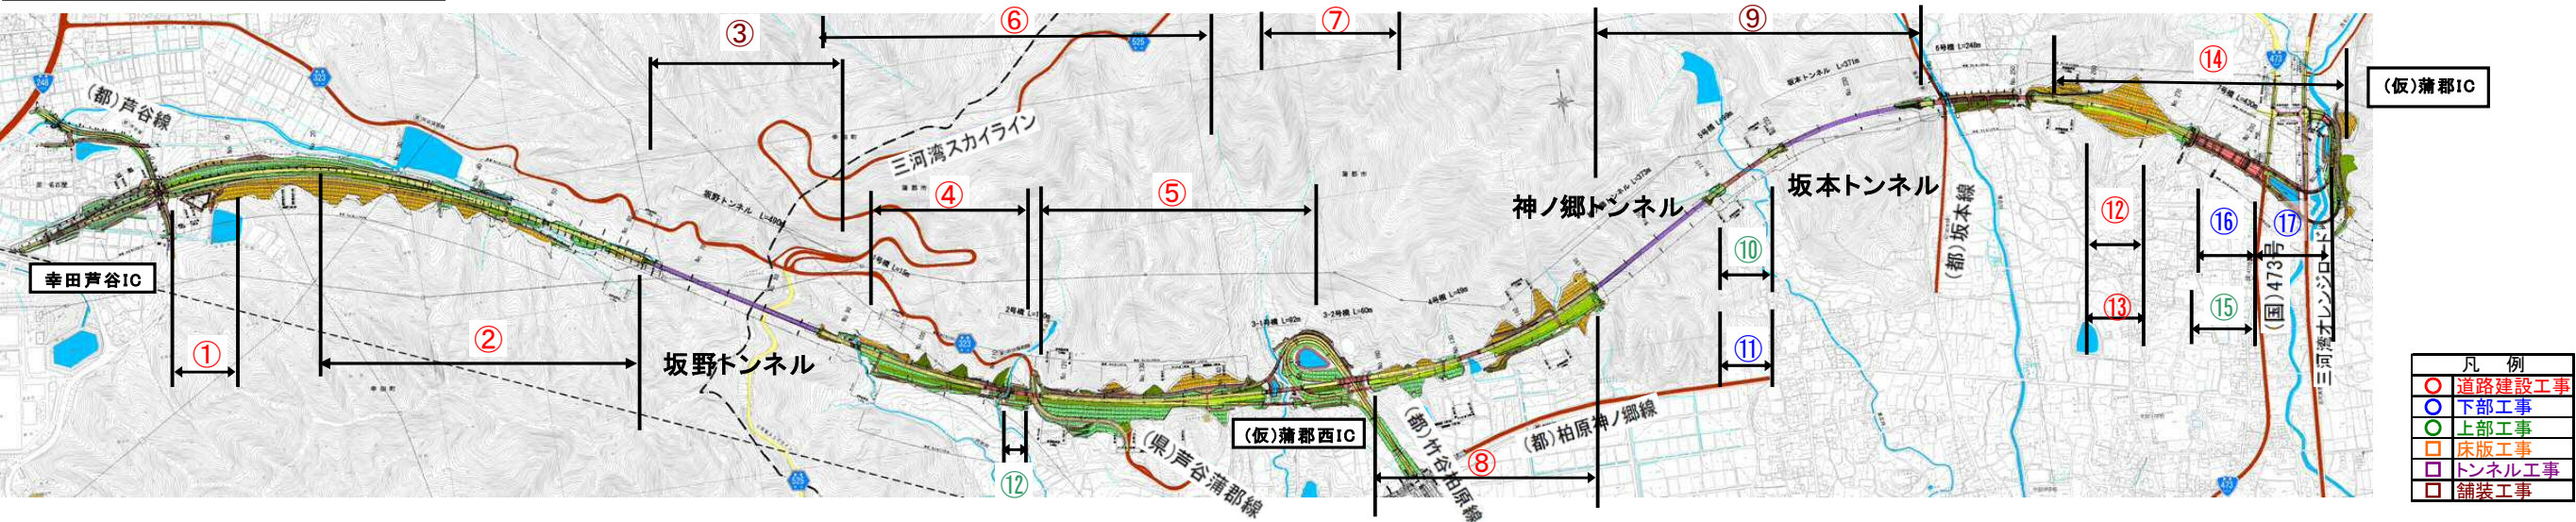

⑪	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事 工 期平成23年9月23日～平成25年2月22日 5月22日 施 工 業 者㈱ピーエス三菱 TEL 0533-66-3570、FAX 0533-66-3580 12月末時点進捗率83% 1月作業内容補強土壁工、地盤改良工、排水工  坂本トンネルより名古屋側を望む	⑫	工 事 名平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事 工 期平成24年11月9日～平成25年12月3日 施 工 業 者TSUCHIYA(株) TEL 0533-68-7776、FAX 0533-68-7776 12月末時点進捗率0% 1月作業内容掘削工、残土運搬工  名古屋側より豊橋側を望む	⑬	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事 工 期平成23年10月21日～平成24年12月20日 施 工 業 者吉川建設(株) TEL 0533-69-8060、FAX 0533-69-8052 12月末時点進捗率100% 1月作業内容  名古屋側より豊橋側を望む	⑭	工 事 名平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工 期平成24年7月27日～平成25年3月25日 施 工 業 者(株)ヒメノ TEL0533-68-5502、FAX0533-68-5508 12月末時点進捗率19% 1月作業内容掘削工、排水構造物工  (仮)蒲郡ICランプ部を望む	⑮	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事 工 期平成24年2月3日～平成25年3月26日 施 工 業 者㈱新井組 TEL 0533-95-4621、FAX 0533-95-4622 12月末時点進捗率94% 1月作業内容橋脚躯体工、排水工  豊橋側より名古屋側を望む
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

完成しました！

⑯	工 事 名平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事 工 期平成24年3月1日～平成25年3月18日 施 工 業 者㈱横河ブリッジ TEL 0533-75-6004、FAX 0533-75-6009 12月末時点進捗率75% 1月作業内容工場製作中  豊橋側より名古屋側を望む：着手前(工場製作中)	⑰	工 事 名平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ下部工事 工 期平成24年9月14日～平成25年3月22日 施 工 業 者朝日工業(株) TEL 0533-95-4305、FAX 0533-95-4306 12月末時点進捗率52% 1月作業内容橋台・橋脚躯体工  豊橋側より名古屋側を望む
---	--	---	--

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、柏原地区におきまして(仮称)蒲郡西ICを建設しております。(仮称)蒲郡西ICは、蒲郡バイパスの中心に位置し名古屋方面や豊橋方面から蒲郡市内へアクセスするのに重要な箇所となっております。いわば蒲郡市の窓口と解釈させてもらい、それに恥じないようなインターチェンジとなるよう細部にわたり配慮し、蒲郡市に来ていただくお客様に気持ちよくお迎えできるような施工を心がけております。

現在、盛土工事も大詰めを向かえ1年前に比べたら大きく様変わりした様子を地元の方々も感じていただけていることだと思います。残り2ヶ月となりましたが、最後まで気を緩めず安全最優先で完成を目指していますので、引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。



TSUCHIYA(株) スタッフ
