


# 蒲郡バイパス 工事便り

発行 第10号  
平成25年3月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長: 世紀東急工業(株) 長島 智史  
TEL 0564-64-2697、FAX 0564-64-2698

監修: 名四国道蒲郡建設監督官詰所  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

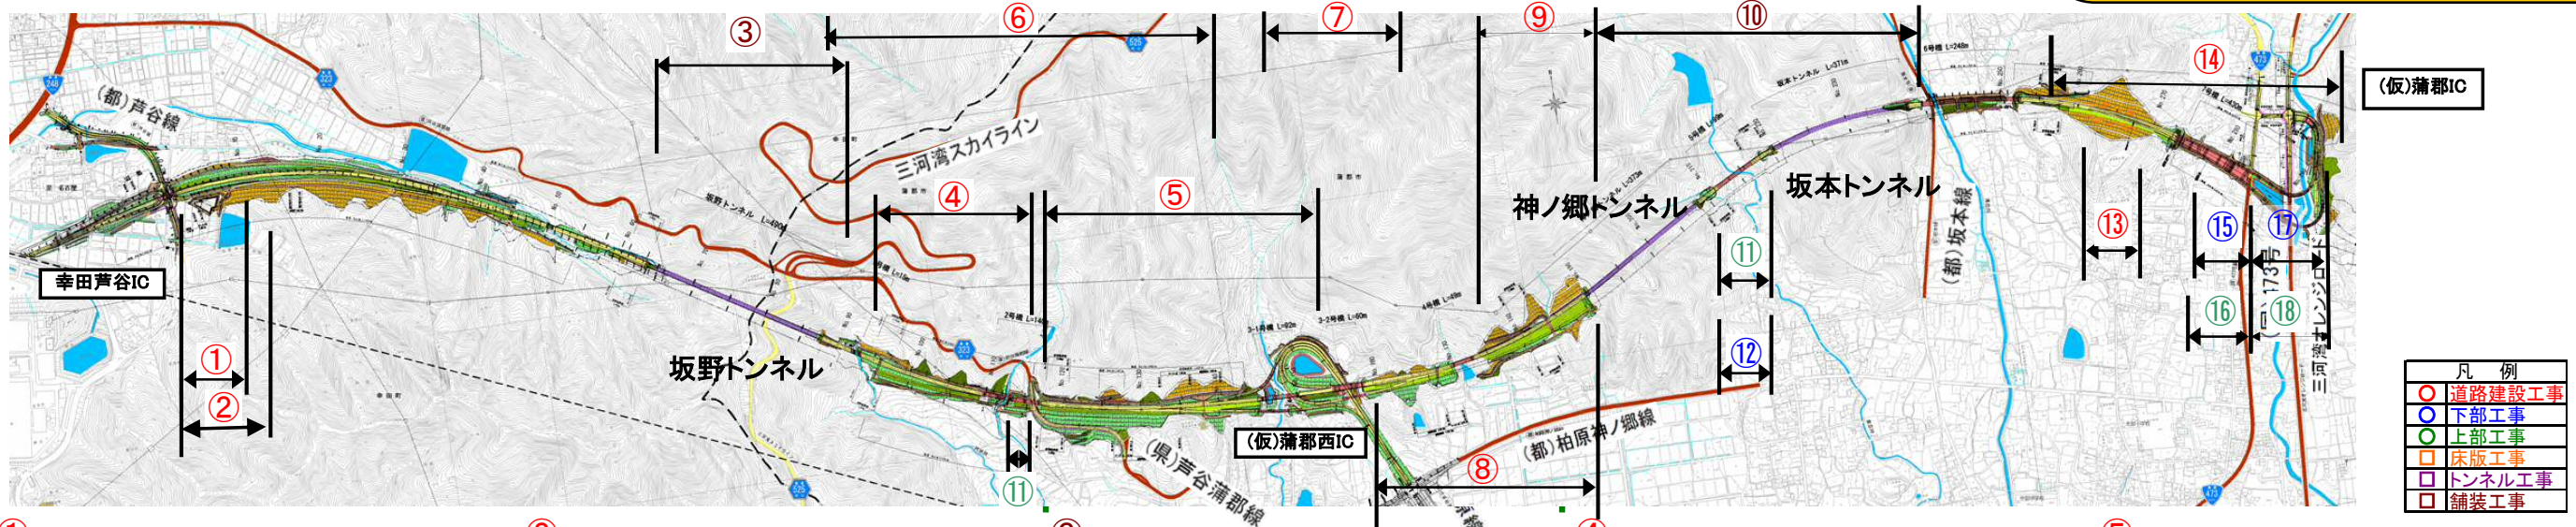

- 凡例
- 道路建設工事
  - 下部工事
  - 上部工事
  - 床版工事
  - トンネル工事
  - 舗装工事


<p>①</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月30日～平成25年1月31日 3月28日</p> <p>施工業者 榊近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463</p> <p>1月末時点進捗率 61%</p> <p>2月作業内容 掘削工、残土運搬工、排水工、大型ブロック積工</p> <p>幸田芦谷ICより豊橋側を望む</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事</p> <p>工期 平成25年2月9日～平成26年1月31日</p> <p>施工業者 若築建設(株) TEL0533-68-7488、FAX0533-68-7499</p> <p>1月末時点進捗率 0%</p> <p>2月作業内容 準備中</p> <p>幸田芦谷ICより豊橋側を望む</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP坂野トンネル舗装工事</p> <p>工期 平成24年9月25日～平成25年3月22日</p> <p>施工業者 世紀東急工業(株) TEL 0564-64-2697、FAX 0564-64-2698</p> <p>1月末時点進捗率 55%</p> <p>2月作業内容 コンクリート舗装工、鉄筋工、情報ボックス工、配水管工</p> <p>(仮)坂野トンネル豊橋側を望む</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月13日～平成25年1月31日 3月22日</p> <p>施工業者 中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101</p> <p>1月末時点進捗率 90%</p> <p>2月作業内容 電気室、切土補強土工、剛性防護柵工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑤</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事</p> <p>工期 平成24年3月28日～平成25年2月28日</p> <p>施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386</p> <p>1月末時点進捗率 84%</p> <p>2月作業内容 調整池工、法面工、残土処理工</p> <p>調整池部を望む</p>
--	--	--	---	---

新規工事です！

<p>⑥</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月22日～平成25年3月15日 3月28日</p> <p>施工業者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520</p> <p>1月末時点進捗率 47%</p> <p>2月作業内容 掘削工、盛土工、排水構造物工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑦</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事</p> <p>工期 平成23年11月18日～平成25年3月25日</p> <p>施工業者 TSUCHIYA(株) TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113</p> <p>1月末時点進捗率 88%</p> <p>2月作業内容 路体・路床・盛土工、補強土壁工、排水構造物工、情報管路工</p> <p>(仮)蒲郡西ICを望む</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事</p> <p>工期 平成24年9月7日～平成25年3月15日 3月28日</p> <p>施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612</p> <p>1月末時点進捗率 49%</p> <p>2月作業内容 掘削工、残土運搬工、函渠工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事</p> <p>工期 平成25年1月29日～平成26年1月31日</p> <p>施工業者 矢作建設工業(株) TEL 052-935-2359、FAX 052-935-2155</p> <p>1月末時点進捗率 0%</p> <p>2月作業内容 準備中</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑩</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP神ノ郷・坂本トンネル舗装工事</p> <p>工期 平成24年11月30日～平成25年3月29日</p> <p>施工業者 福田道路(株) TEL0533-95-4803、FAX0533-95-4806</p> <p>1月末時点進捗率 20.7%</p> <p>2月作業内容 排水構造物工、情報管路工</p> <p>(仮)神ノ郷トンネル豊橋側を望む</p>
---	--	---	---	--

新規工事です！

神ノ郷区間～蒲郡IC区間

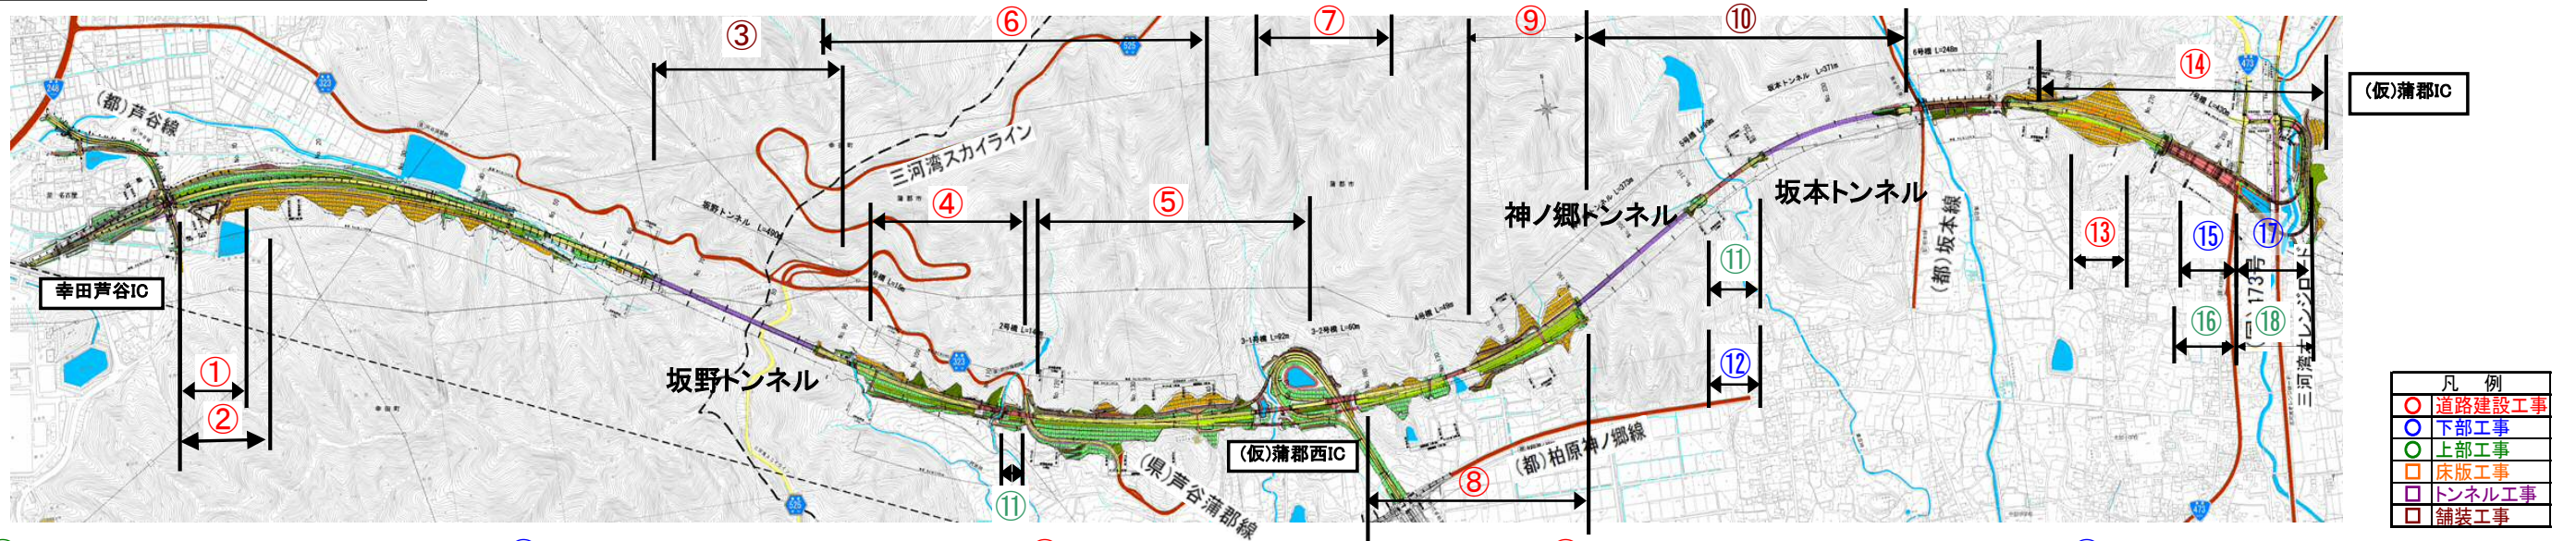

<p>⑪</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事</p> <p>工期 平成24年2月25日～平成25年2月28日 <b>3月28日</b></p> <p>施工業者 ㈱安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464, FAX 0533-69-1465</p> <p>1月末時点進捗率 <b>61%</b></p> <p>2月作業内容 主桁組立架設工、横組工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑫</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事</p> <p>工期 平成23年9月23日～平成25年2月22日 <b>5月22日</b></p> <p>施工業者 ㈱ピーエス三菱 TEL 0533-66-3570, FAX 0533-66-3580</p> <p>1月末時点進捗率 <b>89%</b></p> <p>2月作業内容 補強土壁工、地盤改良工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑬</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事</p> <p>工期 平成24年11月9日～平成25年12月3日</p> <p>施工業者 TSUCHIYA㈱ TEL 0533-68-7776, FAX 0533-68-7776</p> <p>1月末時点進捗率 <b>4%</b></p> <p>2月作業内容 掘削工、残土運搬工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑭</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事</p> <p>工期 平成24年7月27日～平成25年3月25日 <b>3月28日</b></p> <p>施工業者 (株)ヒメノ TEL0533-68-5502, FAX0533-68-5508</p> <p>1月末時点進捗率 <b>24%</b></p> <p>2月作業内容 掘削工、排水構造物工、鉄筋挿入</p> <p>(仮)蒲郡ICランプ部を望む</p>	<p>⑮</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事</p> <p>工期 平成24年2月3日～平成25年3月26日</p> <p>施工業者 ㈱新井組 TEL 0533-95-4621, FAX 0533-95-4622</p> <p>1月末時点進捗率 <b>98%</b></p> <p>2月作業内容 橋脚躯体工、排水構造物工</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>
---	---	---	---	--

<p>⑯</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事</p> <p>工期 平成24年3月1日～平成25年3月18日</p> <p>施工業者 ㈱横河ブリッジ TEL 0533-75-6004, FAX 0533-75-6009</p> <p>1月末時点進捗率 <b>76%</b></p> <p>2月作業内容 工場製作完了、現場準備工</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む：着手前</p>	<p>⑰</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ下部工事</p> <p>工期 平成24年9月14日～平成25年3月22日</p> <p>施工業者 朝日工業㈱ TEL 0533-95-4305, FAX 0533-95-4306</p> <p>1月末時点進捗率 <b>72%</b></p> <p>2月作業内容 平成25年2月9日～平成26年1月31日</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>⑱</p> <p>工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事</p> <p>工期 平成25年1月10日～平成25年11月22日</p> <p>施工業者 瀧上工業㈱ TEL 0569-89-2104, FAX 0569-89-2604</p> <p>1月末時点進捗率 <b>0%</b></p> <p>2月作業内容 準備中</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む(工場制作中)</p>
---	--	--

**新規工事です！**

### 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、幸田町芦谷～蒲郡市柏原地区におきまして、坂野トンネル(仮称)をコンクリートで舗装する工事を行っております。坂野トンネル(仮称)は、幸田町と蒲郡市の境に位置する延長L=490mのトンネルです。開通いたしますと、地域の皆様には、今まで以上に幸田・蒲郡間の往来がより安全に早く通行することが可能となります。

舗装工事は、蒲郡バイパス工事における最終の仕上げの工事となり、開通へ向けた最初の完成形の部分になります。皆様が実際に車で通行する路面を造っておりますので、安全かつ快適に通行していただけるようにスタッフ一丸となって工事を進めています。

現在、年度末の完成に向けて、工事も最盛期を迎えています。資材運搬等において、大型車両の通行も多くなり、地域の皆様方にはご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、残り1ヶ月、安全第一を最優先に無事故・無災害での完成を目指してまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

平成24年度 23号蒲郡BP坂野トンネル舗装工事  
 監理技術者 長島 智史

世紀東急工業㈱ スタッフ

コンクリートフィニッシャー(スリップフォーム)
