

# 蒲郡バイパス 工事便り

幸田芦谷IC～神ノ郷トンネル西側区間

**平成25年度になりました。引き続きよろしくお祈いします！**

沿線の皆さまには、日頃から国道23号蒲郡バイパスに対するご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。


おかげさまで「蒲郡バイパス工事便り」第11号を発刊することとなりました。引き続き開通まで月1回を目標に、沿線地域の皆さまに工事状況を「蒲郡バイパス工事便り」に載せお伝えします。

なお、名四国道蒲郡建設監督官詰所につきまして、平成25年4月1日より名四国道事務所豊川分室（豊川建設監督官詰所）となりました。引続きよろしくお祈いします。

発行 第11号  
平成25年4月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長：(株)横河ブリッジ 西野 崇史  
TEL0533-75-6004、FAX0533-75-6009

監修：名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

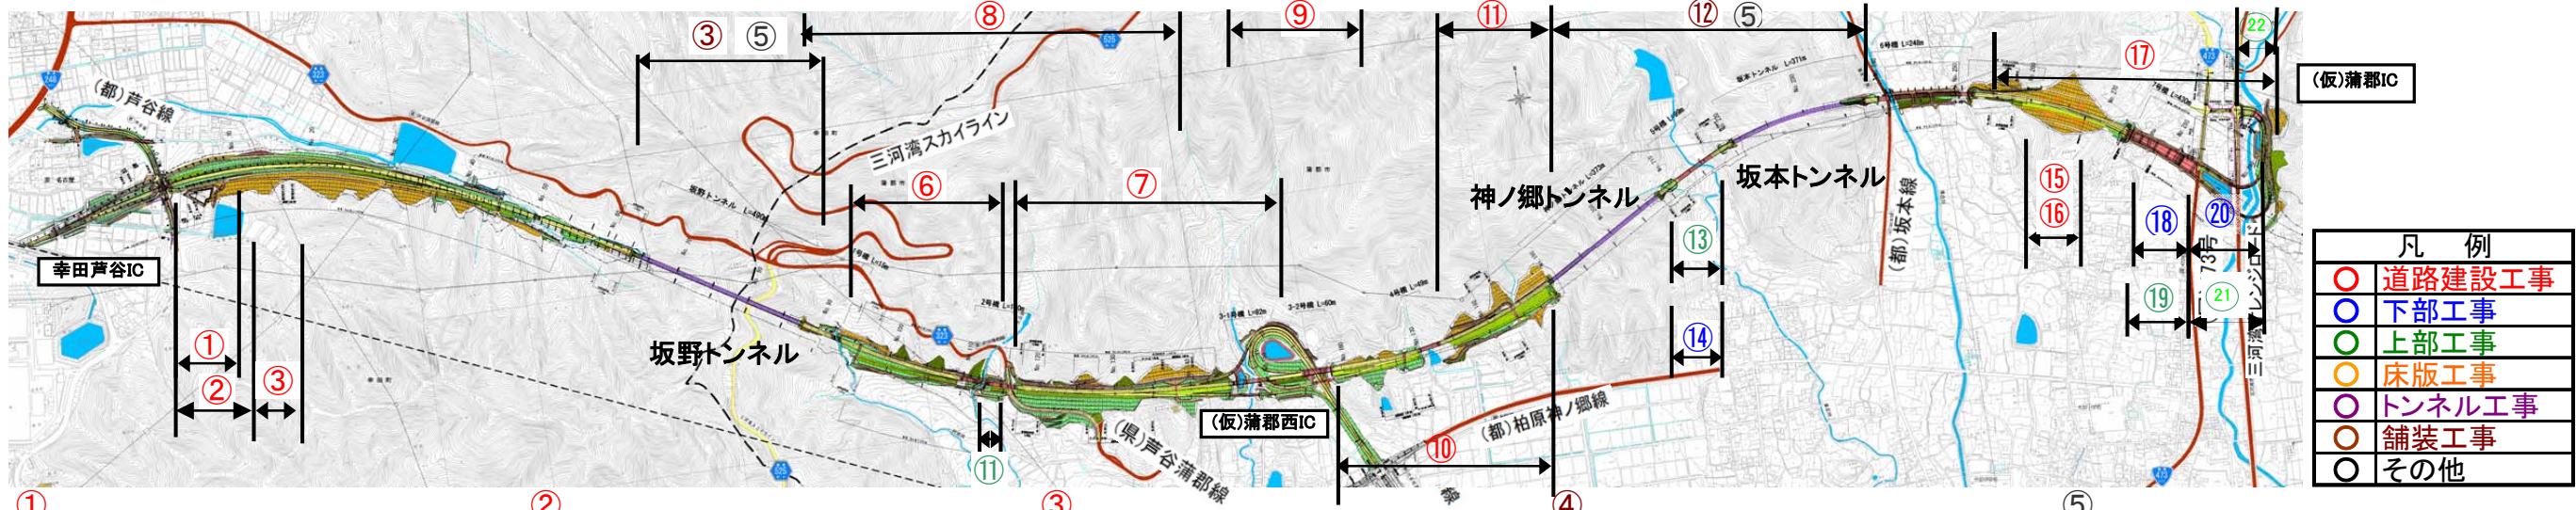

凡例	
○	道路建設工事
○	下部工事
○	上部工事
○	床版工事
○	トンネル工事
○	舗装工事
○	その他

①	②	③	④	⑤
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP坂野トンネル舗装工事	工事名 平成24年度 23号蒲郡BPトンネル受変電設備工事
工期 平成24年3月30日～平成25年3月30日 5月13日	工期 平成25年2月9日～平成26年1月31日	工期 平成25年3月19日～平成25年11月29日	工期 平成24年9月25日～平成25年3月22日	工期 平成25年3月9日～平成26年3月20日
施工業者 株近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463	施工業者 若築建設株 TEL0533-68-7488、FAX0533-68-7499	施工業者 (株)ヒメノ	施工業者 世紀東急工業(株) TEL 0564-64-2697、FAX 0564-64-2698	施工業者 (株)柿本商会
2月末時点進捗率 66%	2月末時点進捗率 0%	2月末時点進捗率 0%	2月末時点進捗率 100%	2月末時点進捗率 0%
3月作業内容 掘削工、残土運搬工、調整池工	3月作業内容 準備中	3月作業内容 準備中	3月作業内容 コンクリート舗装工	3月作業内容 準備中
幸田芦谷ICより豊橋側を望む	幸田芦谷ICより豊橋側を望む		(仮)坂野トンネル豊橋側を望む	(仮)坂野トンネル豊橋側を望む

**新規工事です！**

**完成しました！**

**新規工事です！**

⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原西道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP柏原東道路建設工事	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC道路建設工事	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事
工期 平成24年3月13日～平成25年3月22日	工期 平成24年3月28日～平成25年3月28日	工期 平成24年9月22日～平成25年3月28日 5月15日	工期 平成23年11月18日～平成25年3月25日	工期 平成24年9月7日～平成25年3月28日 5月28日
施工業者 中部土木(株) TEL 0533-95-4100、FAX 0533-95-4101	施工業者 長坂建設興業株 TEL 0533-65-9385、FAX 0533-65-9386	施工業者 鈴中工業株 TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520	施工業者 Tsuchiya株 TEL 0533-69-5113、FAX 0533-69-5113	施工業者 黒柳建設(株) TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612
2月末時点進捗率 100%	2月末時点進捗率 100%	2月末時点進捗率 72%	2月末時点進捗率 100%	2月末時点進捗率 58%
3月作業内容 切土補強土工	3月作業内容 調整池工、法面工、踏掛版工、残土処理工	3月作業内容 掘削工、盛土工、法面工、擁壁工、排水構造物工	3月作業内容 路体・路床・盛土工、植生工、排水構造物工、情報管路工	3月作業内容 掘削工、残土運搬工、函渠工
豊橋側より名古屋側を望む	調整池部を望む	名古屋側より豊橋側を望む	(仮)蒲郡西ICを望む	名古屋側より豊橋側を望む


**完成しました！**

**完成しました！**


**完成しました！**

神ノ郷トンネル西側区間～蒲郡IC区間


⑪

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事
工期	平成25年1月29日～平成26年1月31日
施工業者	矢作建設工業(株) TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568
2月末時点進捗率	0%
3月作業内容	準備中
	
豊橋側より名古屋側を望む	


⑫

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP神ノ郷・坂本トンネル舗装工事
工期	平成24年11月30日～平成25年3月29日
施工業者	福田道路(株) TEL0533-95-4803,FAX0533-95-4806
2月末時点進捗率	100%
3月作業内容	舗装工
	
(仮)神ノ郷トンネル豊橋側を望む	

⑬

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋PC上部工事
工期	平成24年2月25日～平成25年3月28日 6月7日
施工業者	(株)安部日鋼工業 TEL 0533-69-1464、FAX 0533-69-1465
2月末時点進捗率	73%
3月作業内容	横組工、床版工
	
豊橋側より名古屋側を望む	

⑭


工事名	平成23年度 23号蒲郡BP神ノ郷高架橋下部工事
工期	平成23年9月23日～平成25年5月22日
施工業者	(株)ビーエス三菱 TEL 0533-66-3570、FAX 0533-66-3580
2月末時点進捗率	94%
3月作業内容	補強土壁工、地盤改良工
	
名古屋側より豊橋側を望む	

⑮


工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事
工期	平成24年11月9日～平成25年12月3日
施工業者	TSUCHIYA(株) TEL 0533-68-7776、FAX 0533-68-7776
2月末時点進捗率	16%
3月作業内容	掘削工、残土運搬工
	
名古屋側より豊橋側を望む	

完成しました！

⑯

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事
工期	平成25年3月12日～平成25年9月30日
施工業者	(株)ヒメノ
2月末時点進捗率	0%
3月作業内容	準備中
	
名古屋側より豊橋側を望む	

⑰

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事
工期	平成24年7月27日～平成25年3月28日 7月16日
施工業者	(株)ヒメノ TEL0533-68-5502,FAX0533-68-5508
2月末時点進捗率	32%
3月作業内容	掘削工、排水構造物工、鉄筋挿入、伐採工
	
(仮)蒲郡ICランプ部を望む	

⑱

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC橋下部工事
工期	平成24年2月3日～平成25年3月26日
施工業者	(株)新井組 TEL 0533-95-4621、FAX 0533-95-4622
2月末時点進捗率	100%
3月作業内容	排水構造物工
	
豊橋側より名古屋側を望む	

⑲

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事
工期	平成24年3月1日～平成25年3月28日 8月19日
施工業者	(株)横河ブリッジ TEL 0533-75-6004、FAX 0533-75-6009
2月末時点進捗率	79%
3月作業内容	桁架設工
	
豊橋側より名古屋側を望む	

⑳


工事名	平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ下部工事
工期	平成24年9月14日～平成25年3月27日
施工業者	朝日工業(株) TEL 0533-95-4305、FAX 0533-95-4306
2月末時点進捗率	100%
3月作業内容	躯体工
	
豊橋側より名古屋側を望む	

新規工事です！


完成しました！

完成しました！

㉑

工事名	平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事
工期	平成25年1月10日～平成25年11月22日
施工業者	瀧上工業(株) TEL 0569-89-2104、FAX 0569-89-2604
2月末時点進捗率	0%
3月作業内容	工場製作中
	
豊橋側より名古屋側を望む(工場製作中)	

㉒

工事名	平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事
工期	平成25年3月12日～平成25年12月20日
施工業者	川田建設(株)
2月末時点進捗率	0%
3月作業内容	準備中
	
(仮)蒲郡ICランプ部を望む	

新規工事です！

編集長から一言



現場スタッフ



鋼桁架設状況

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

弊社担当工事は、国道473号に隣接する現場ヤード(清田町東大内地先)におきまして、蒲郡IC橋(仮称)の上部工事(橋架け)を行っております。

蒲郡IC橋(仮称)は、国道23号蒲郡バイパスの一部の橋長191mの5径間連続少数鋼桁橋です。開通しますと、主要交通路線である国道1号および国道23号の交通渋滞が緩和され、地域の皆様への交通に対する負担を軽減でき、より快適な生活が期待されます。皆様のより快適な生活を少しでも早く実現するため、現場スタッフ一同一丸となって工事を進めていきます。

現在は、鋼桁架設が始まり、桁部材の運搬等において大型車両の通行も多くなり、また、大型重機や桁の添接作業等で音が発生し、地域の皆様方にはご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、安全第一を最優先に無事故・無災害での完成を目指してまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事 (株)横河ブリッジ  
監理技術者 西野 崇史
