


沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

蒲郡バイパス 工事便り

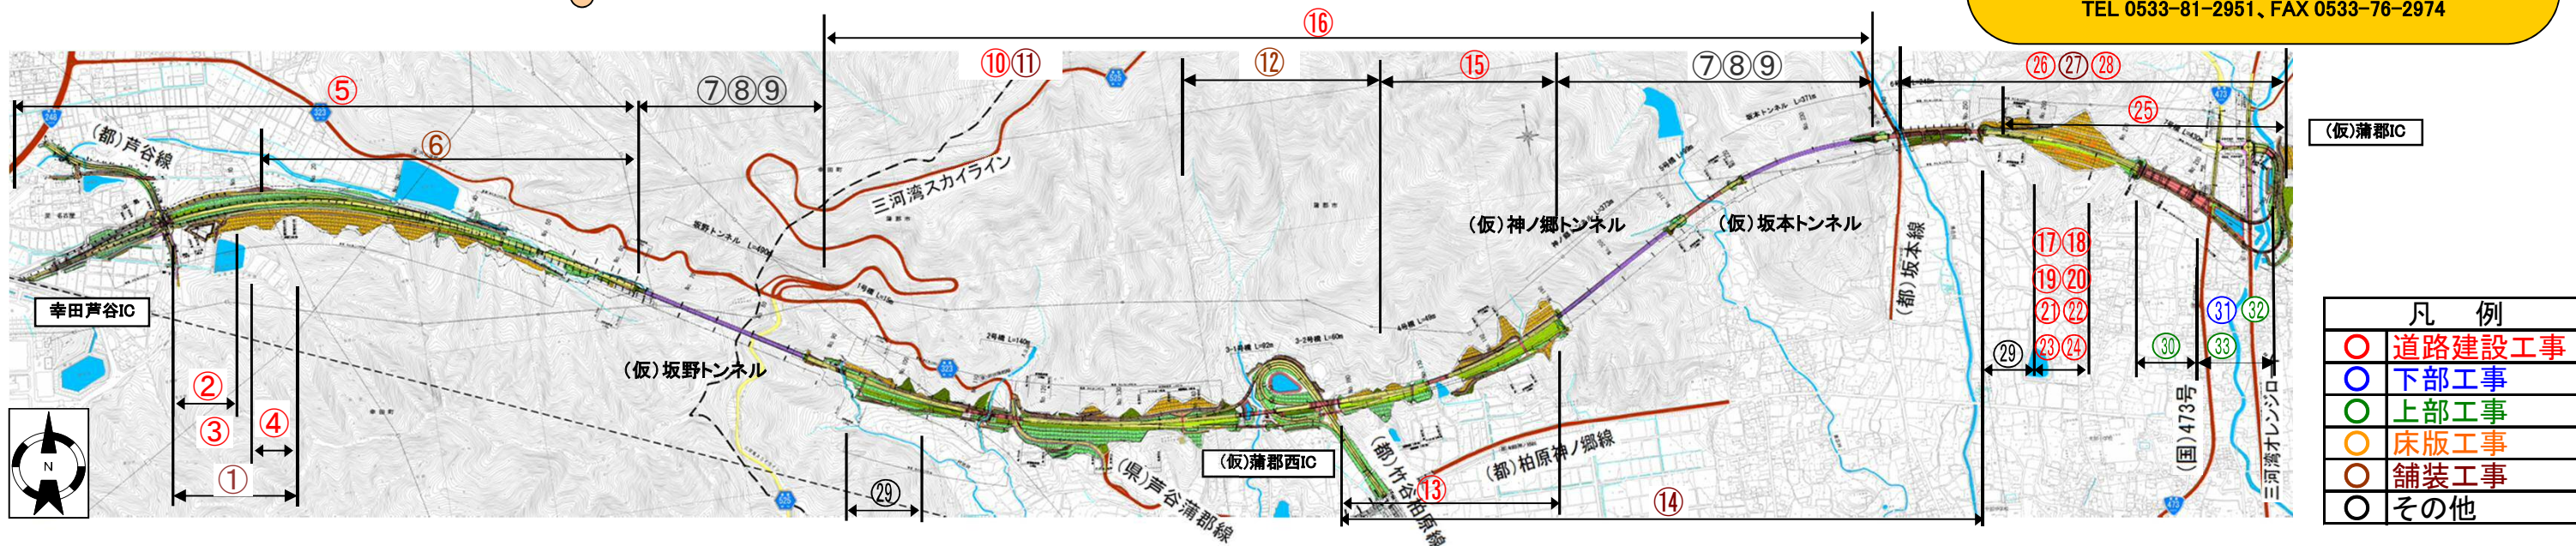


①	②	③	④	⑤	⑥
工事名: 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事 工期: 平成25年8月16日～平成26年3月27日 施工業者: 大林道路(株) TEL 052-222-5161、FAX 052-222-5167 7月末時点進捗率: 0% 8月作業内容: 準備中	工事名: 平成23年度 23号蒲郡BP幸田芦谷IC道路建設工事 工期: 平成24年3月30日～平成25年8月19日 施工業者: 橋近藤組 TEL 0564-64-2462、FAX 0564-64-2463 7月末時点進捗率: 100% 8月作業内容: 完成	工事名: 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事 工期: 平成25年2月9日～平成26年3月20日 施工業者: 若築建設(株) TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499 7月末時点進捗率: 12% 8月作業内容: 掘削・残土運搬、鉄筋挿入	工事名: 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事 工期: 平成25年3月19日～平成25年11月29日 施工業者: 橋ヒメノ TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919 7月末時点進捗率: 27% 8月作業内容: 掘削・残土運搬、重力式擁壁、補強盛土	工事名: 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事 工期: 平成25年5月24日～平成26年3月27日 施工業者: 朝日工業(株) TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527 7月末時点進捗率: 4% 8月作業内容: 補強土壁、路体盛土、排水構造物	工事名: 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事 工期: 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者: 鹿島道路(株) TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552 7月末時点進捗率: 2% 8月作業内容: 排水構造物
名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より調整池施工箇所を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

新規工事です!

完成しました!






⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
工事名: 平成24年度 23号蒲郡BPTンネル受変電設備工事 工期: 平成25年3月9日～平成26年3月20日 施工業者: 橋楠本商会 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944 7月末時点進捗率: 0% 8月作業内容: 準備中	工事名: 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル照明設備工事 工期: 平成25年5月25日～平成26年3月20日 施工業者: 白川電気土木(株) TEL 052-882-1285、FAX052-872-1074 7月末時点進捗率: 0% 8月作業内容: 準備中	工事名: 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル防災設備工事 工期: 平成25年6月6日～平成26年3月20日 施工業者: イシデンエンジニアリング(株) TEL 0573-25-6600、FAX 0573-25-6601 7月末時点進捗率: 0% 8月作業内容: 準備中	工事名: 平成24年度 23号蒲郡BP柏原道路建設工事 工期: 平成24年9月22日～平成25年7月31日 施工業者: 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520 7月末時点進捗率: 100% 8月作業内容: 完成	工事名: 平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事 工期: 平成25年4月24日～平成26年3月27日 施工業者: 日本道路(株) TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504 7月末時点進捗率: 3% 8月作業内容: 排水構造物	工事名: 平成25年度 23号蒲郡BP西IC舗装工事 工期: 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者: 株式会社T-K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741 7月末時点進捗率: 3% 8月作業内容: 緑石、下層路盤、排水構造物
(仮)坂野トンネル電気室を望む	(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む	名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

完成しました!

⑬	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取西道路建設工事 工期 平成24年9月7日～平成25年7月31日 施工業者 黒柳建設㈱ TEL 0533-68-9611、FAX 0533-68-9612 7月末時点 進捗率 100% 8月作業内容 完成  名古屋側より豊橋側を望む	⑭	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事 工期 平成25年7月3日～平成26年3月27日 施工業者 中部土木㈱ TEL 052-721-5511、FAX 052-721-3606 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  豊橋側より名古屋側を望む	⑮	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事 工期 平成25年1月29日～平成26年1月31日 施工業者 矢作建設工業㈱ TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568 7月末時点 進捗率 30% 8月作業内容 掘削・補強土壁  豊橋側より名古屋側を望む	⑯	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事 工期 平成25年6月22日～平成26年3月27日 施工業者 関興業㈱ TEL 0533-65-8837、FAX 0533-65-8847 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  名古屋側より豊橋側を望む	⑰	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田道路建設工事 工期 平成24年11月9日～平成25年8月16日 施工業者 TSUCHIYA㈱ TEL 0533-68-7776、FAX 0533-68-7776 7月末時点 進捗率 100% 8月作業内容 完成  工事箇所から北側を望む	⑱	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年3月12日～平成25年9月30日 施工業者 ㈱ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508 7月末時点 進捗率 50% 8月作業内容 掘削・残土運搬  工事箇所より北側を望む
---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--

完成しました！

完了しました！

⑲	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年6月14日～平成26年1月20日 施工業者 大和小田急建設㈱ TEL 0533-56-9023、FAX 0533-56-9025 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  工事箇所から南側を望む	⑳	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事 工期 平成25年6月15日～平成26年1月20日 施工業者 若築建設㈱ TEL 0533-67-9227、FAX 0533-67-9228 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  工事箇所から北側を望む	㉑	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 日舗建設 ㈱ TEL 052-205-7337、FAX 052-205-7338 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  工事箇所から南側を望む	㉒	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 ㈱近藤組 TEL 0566-36-1811、FAX 0566-36-1817 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  工事箇所から南側を望む	㉓	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田南地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 小原建設㈱ TEL 0564-51-2621、FAX 0564-52-7662 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  工事箇所から南側を望む	㉔	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田北地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 中日建設㈱ TEL 052-321-6501、FAX 052-321-6946 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  工事箇所から北側を望む
---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	--

新規工事です！

新規工事です！

新規工事です！

新規工事です！




㉕	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成24年7月27日～平成25年9月30日 施工業者 ㈱ヒメノ TEL 0533-68-5502、FAX 0533-68-5508 7月末時点 進捗率 96% 8月作業内容 橋台工、情報ボックス  名古屋側より豊橋側を望む	㉖	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事 工期 平成25年5月23日～平成26年3月27日 施工業者 長坂建設興業㈱ TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  豊橋側より名古屋側を望む	㉗	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 工期 平成24年8月14日～平成26年3月27日 施工業者 ㈱佐藤波辺 TEL 052-913-3266、FAX 052-913-3267 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  名古屋側より豊橋側を望む	㉘	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP遮音壁設置工事 工期 平成24年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 ㈱近藤組 TEL 0566-36-1811、FAX 0533-36-1817 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  名古屋側より豊橋側を望む	㉙	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP道路情報表示設備工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月20日 施工業者 名古屋電機工業㈱ TEL 052-433-1111、FAX 052-433-2288 7月末時点 進捗率 0% 8月作業内容 準備中  豊橋側より名古屋側を望む	㉚	工事名 平成23年度 23号蒲郡BP蒲郡IC鋼上部工事 工期 平成24年3月1日～平成25年8月19日 施工業者 ㈱横河ブリッジ TEL 0533-75-6004、FAX 0533-75-6009 7月末時点 進捗率 100% 8月作業内容 完成  名古屋側より豊橋側を望む
---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---

新規工事です！

新規工事です！

新規工事です！

完了しました！

㉛	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事 工期 平成25年6月7日～平成26年3月27日 施工業者 山旺建設㈱ TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093 7月末時点 進捗率 1% 8月作業内容 ボーリング調査  名古屋側より豊橋側を望む	㉜	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事 工期 平成25年1月10日～平成25年11月22日 施工業者 浦上工業㈱ TEL 0533-56-9613、FAX 0533-56-9623 7月末時点 進捗率 91% 8月作業内容 現場継手  豊橋側より名古屋側を望む	㉝	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事 工期 平成25年3月12日～平成25年12月20日 施工業者 川田建設㈱ TEL 052-222-3310、FAX 052-222-3315 7月末時点 進捗率 1% 8月作業内容 準備中  豊橋側より(仮)蒲郡ICランプ部を望む
---	---	---	--	---	--


編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。


私どもの工事は、神ノ郷地区にて、(仮称)蒲郡西ICの西側の上名取池から(仮称)神ノ郷トンネルまでの区間におきまして、バイパス本線を掘削と盛土にて道路を築造する工事です。

今年の3月下旬より伐採に着手し、4月から掘削を開始し、同時に擁壁等の構造物を造りながら盛土を行なっており、現在最盛期を迎えております。

新たに舗装工事、設備工事等の新規工事が増え、幸田芦谷ICから(仮称)蒲郡ICまでの区間の工事は最盛期となり、今後も工事車両の出入りも多くなりますが、安全最優先にて作業を行なってまいりますので、引き続きご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。



現場代理人



現場スケッチ

平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事 矢作建設工業㈱ 現場代理人 田口 智久
