


沿線地域の皆さまへ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。

# 蒲郡バイパス 工事便り

発行 第19号  
平成25年12月1日





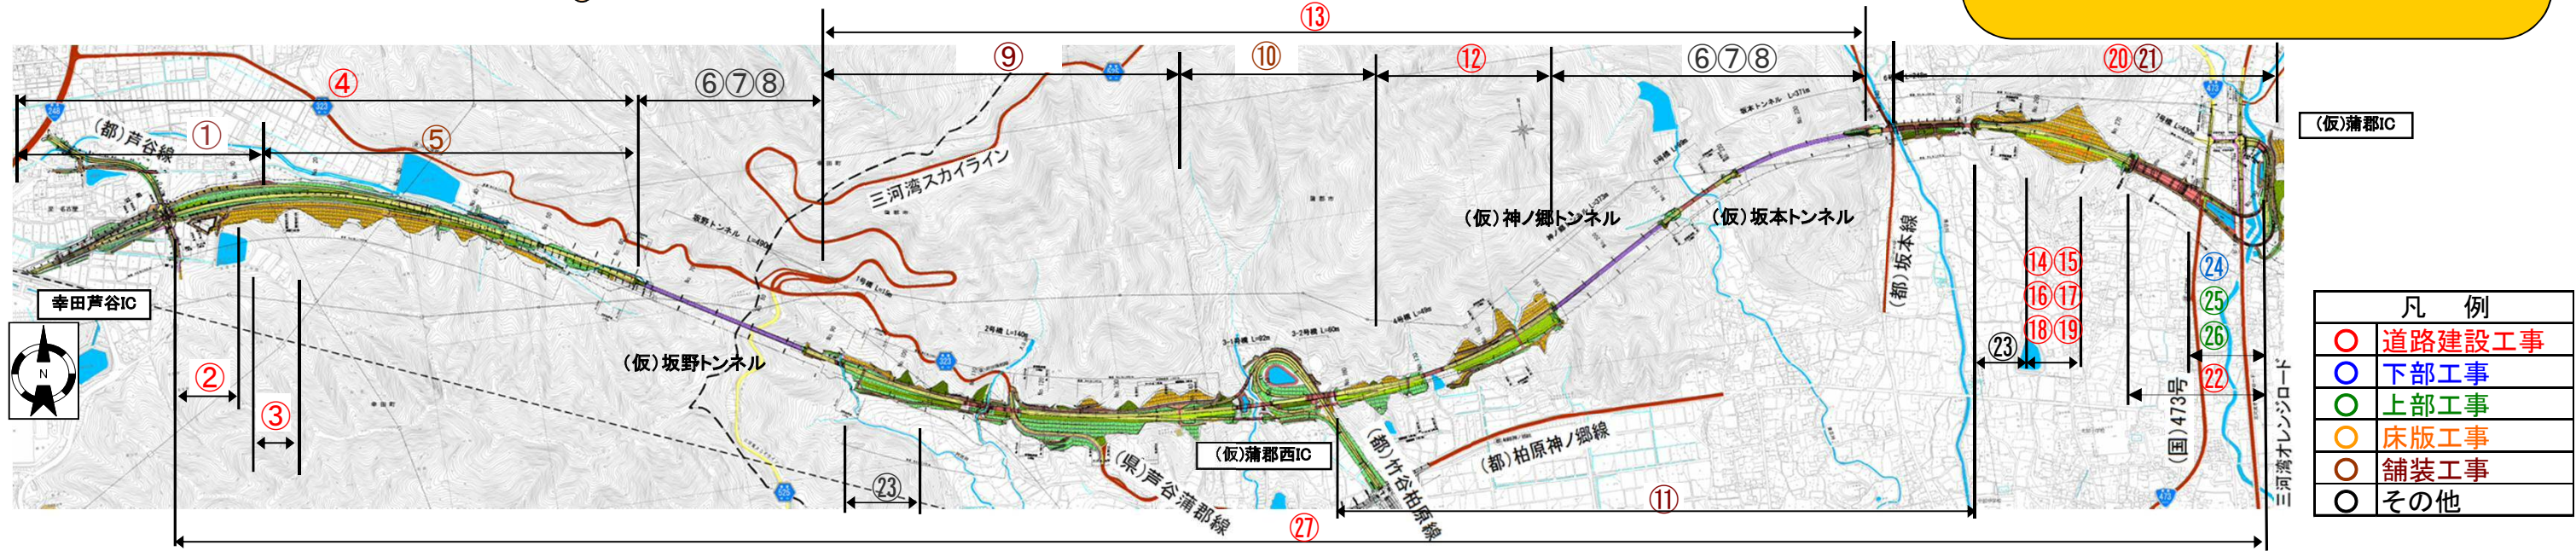

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長:川田建設(株) 石田 章嗣  
TEL 0533-56-9236、FAX 0533-56-9237

監修:名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)



<p>①</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷西舗装工事 工期 平成25年8月16日～平成26年3月27日 施工業者 大林道路 株式会社 TEL 0564-83-5920、FAX 0564-83-5935 10月末時点進捗率 0% 11月作業内容 重力式擁壁</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>②</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷道路建設工事 工期 平成25年2月9日～平成26年3月20日 施工業者 若築建設 株式会社 TEL 0533-68-7488、FAX 0533-68-7499 10月末時点進捗率 63% 11月作業内容 掘削・残土運搬、鉄筋挿入、アンカー、植生</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>③</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP芦谷西道路建設工事 工期 平成25年3月19日～平成26年2月28日 施工業者 朝日建設 株式会社 TEL 0564-62-6918、FAX 0533-62-6919 10月末時点進捗率 61% 11月作業内容 排水構造物、プレキャスト擁壁</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>	<p>④</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷地区道路建設工事 工期 平成25年5月24日～平成26年3月27日 施工業者 朝日工業 株式会社 TEL 0564-64-0526、FAX 0564-64-0527 10月末時点進捗率 60% 11月作業内容 路体盛土、鉄筋挿入・法枠、植生、擁壁</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑤</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP芦谷東舗装工事 工期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 鹿島道路 株式会社 TEL 0564-64-4551、FAX 0564-64-4552 10月末時点進捗率 16% 11月作業内容 排水構造物、上層路盤、防護柵</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑥</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BPTンネル受変電設備工事 工期 平成25年3月9日～平成26年3月20日 施工業者 桐本商会 株式会社 TEL 076-268-2111、FAX 076-268-2944 10月末時点進捗率 2% 11月作業内容 機器製作、ケーブル配管</p> <p>(仮)坂野トンネル電気室を望む</p>
--	--	--	---	---	--

<p>⑦</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル照明設備工事 工期 平成25年5月25日～平成26年3月20日 施工業者 白川電気土木 株式会社 TEL 0533-56-9696、FAX 0533-56-9696 10月末時点進捗率 8% 11月作業内容 機器製作、ケーブル配管</p> <p>(仮)坂野トンネルより豊橋側を望む</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BPTンネル防災設備工事 工期 平成25年6月6日～平成26年3月20日 施工業者 インテンエンジニアリング 株式会社 TEL 052-509-1410、FAX 052-509-1412 10月末時点進捗率 2% 11月作業内容 機器製作、ケーブル配管</p> <p>名古屋側より(仮)坂野トンネルを望む</p>	<p>⑨</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP柏原地区舗装工事 工期 平成25年4月24日～平成26年3月27日 施工業者 日本道路 株式会社 TEL 0533-65-7503、FAX 0533-65-7504 10月末時点進捗率 19% 11月作業内容 排水構造物、下層路盤、防護柵</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑩</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡西IC舗装工事 工期 平成25年5月1日～平成26年3月27日 施工業者 株ガイアート・K TEL 0533-56-9740、FAX 0533-56-9741 10月末時点進捗率 24% 11月作業内容 排水構造物、上層路盤、防護柵</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑪</p> <p>工事名 平成25年度 23号蒲郡BP上名取地区舗装工事 工期 平成25年7月3日～平成26年3月27日 施工業者 中部土木 株式会社 TEL 0533-65-8499、FAX 0533-65-8944 10月末時点進捗率 19% 11月作業内容 排水構造物、上層路盤、ケーブル配管</p> <p>名古屋側より豊橋側を望む</p>	<p>⑫</p> <p>工事名 平成24年度 23号蒲郡BP上名取東道路建設工事 工期 平成25年1月29日～平成26年1月31日 施工業者 矢作建設工業 株式会社 TEL 0533-56-9567、FAX 0533-56-9568 10月末時点進捗率 66% 11月作業内容 掘削、法面、補強土壁、排水構造物</p> <p>豊橋側より名古屋側を望む</p>
--	--	---	--	--	---

⑬	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP神ノ郷地区道路建設工事 工期 平成25年6月22日～平成26年3月27日 施工業者 関興業株式会社 TEL 0533-65-8837, FAX 0533-65-8847 10月末時点進捗率 26% 11月作業内容 A1橋台、擁壁、法枠	⑭	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西地区道路建設工事 工期 平成25年6月14日～平成26年1月20日 施工業者 大和小田急建設株式会社 TEL 0533-56-9023, FAX 0533-56-9025 10月末時点進捗率 35% 11月作業内容 掘削、残土運搬	⑮	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東地区道路建設工事 工期 平成25年6月15日～平成26年1月20日 施工業者 若菜建設株式会社 TEL 0533-67-9227, FAX 0533-67-9228 10月末時点進捗率 35% 11月作業内容 掘削、残土運搬	⑯	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田東道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 日鋪建設株式会社 TEL 052-205-7337, FAX 052-205-7338 10月末時点進捗率 0% 11月作業内容 準備中	⑰	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田西道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 備近藤組株式会社 TEL 0533-56-9602, FAX 0533-56-9603 10月末時点進捗率 0% 11月作業内容 準備中	⑱	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田南地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 小原建設株式会社 TEL 0564-64-1607, FAX 0564-64-1608 10月末時点進捗率 20% 11月作業内容 仮置土運搬
											

⑲	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田北地区道路建設工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 中日建設株式会社 TEL 052-321-6501, FAX 052-321-6946 10月末時点進捗率 15% 11月作業内容 仮置土運搬	⑳	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC道路建設工事 工期 平成25年5月23日～平成26年3月27日 施工業者 長坂建設興業株式会社 TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591 10月末時点進捗率 41% 11月作業内容 床版、擁壁、地盤改良	㉑	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC舗装工事 工期 平成25年8月14日～平成26年3月27日 施工業者 備佐藤渡辺株式会社 TEL 0564-58-1388, FAX 0564-58-1391 10月末時点進捗率 1% 11月作業内容 緑石	㉒	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP遮音壁設置工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月27日 施工業者 備近藤組株式会社 TEL 0533-56-9602, FAX 0533-56-9603 10月末時点進捗率 0% 11月作業内容 準備中	㉓	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP道路情報表示設備工事 工期 平成25年8月20日～平成26年3月20日 施工業者 名古屋電機工業株式会社 TEL 052-443-0327, FAX 052-443-1218 10月末時点進捗率 6% 11月作業内容 情報板基礎、ケーブル配管	㉔	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC下部工事 工期 平成25年6月7日～平成26年3月27日 施工業者 山旺建設株式会社 TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093 10月末時点進捗率 36% 11月作業内容 橋脚掘削、場所打杭
											

㉕	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋鋼上部工事 工期 平成25年1月10日～平成25年11月22日 施工業者 瀧上工業株式会社 TEL 0533-56-9613, FAX 0533-56-9623 10月末時点進捗率 99% 11月作業内容 現場塗装、情報ボックス	㉖	工事名 平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事 工期 平成25年3月12日～平成26年1月20日 施工業者 川田建設株式会社 TEL 0533-56-9236, FAX 0533-56-9237 10月末時点進捗率 46% 11月作業内容 床版	㉗	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC整備工事 工期 平成25年10月9日～平成26年3月27日 施工業者 木村建設株式会社 TEL 0533-65-9582, FAX 0533-65-9583 10月末時点進捗率 0% 11月作業内容 準備中
					

## 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、蒲郡バイパスの(仮)蒲郡ICからオレンジロードに向けてのランプ区間において、西田川をカーブしながらまたぐ、橋梁の工事を行っております。

今年の9月上旬工事に着手し、10月末に橋梁本体のコンクリート打設(約400m<sup>3</sup>)を行い、現在、工事完成へ向けて、残工事を進めています。オレンジロードに面する箇所での施工になり、工事用道路の出入りの際には、特に注意して作業を行っており、年内に当社施工部分の作業は完了する見込みとなっておりますが、引き続き安全作業に努めてまいります。

今後、工事も最盛期となり工事車両の出入りが多い状態が続きますが、安全最優先にて作業を行なってまいりますので、皆様のご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

平成24年度 23号蒲郡BP蒲郡ICランプ橋PC上部工事 川田建設(株) 現場代理人 石田 章嗣



現場スタッフ



現場代理人
