


沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。




# 蒲郡バイパス 工事便り

発行 第28号  
平成26年9月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会  
編集長: 極東興和(株) 岡澤 将倫  
TEL 0533-66-6282, FAX 0533-66-6283

監修: 名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974

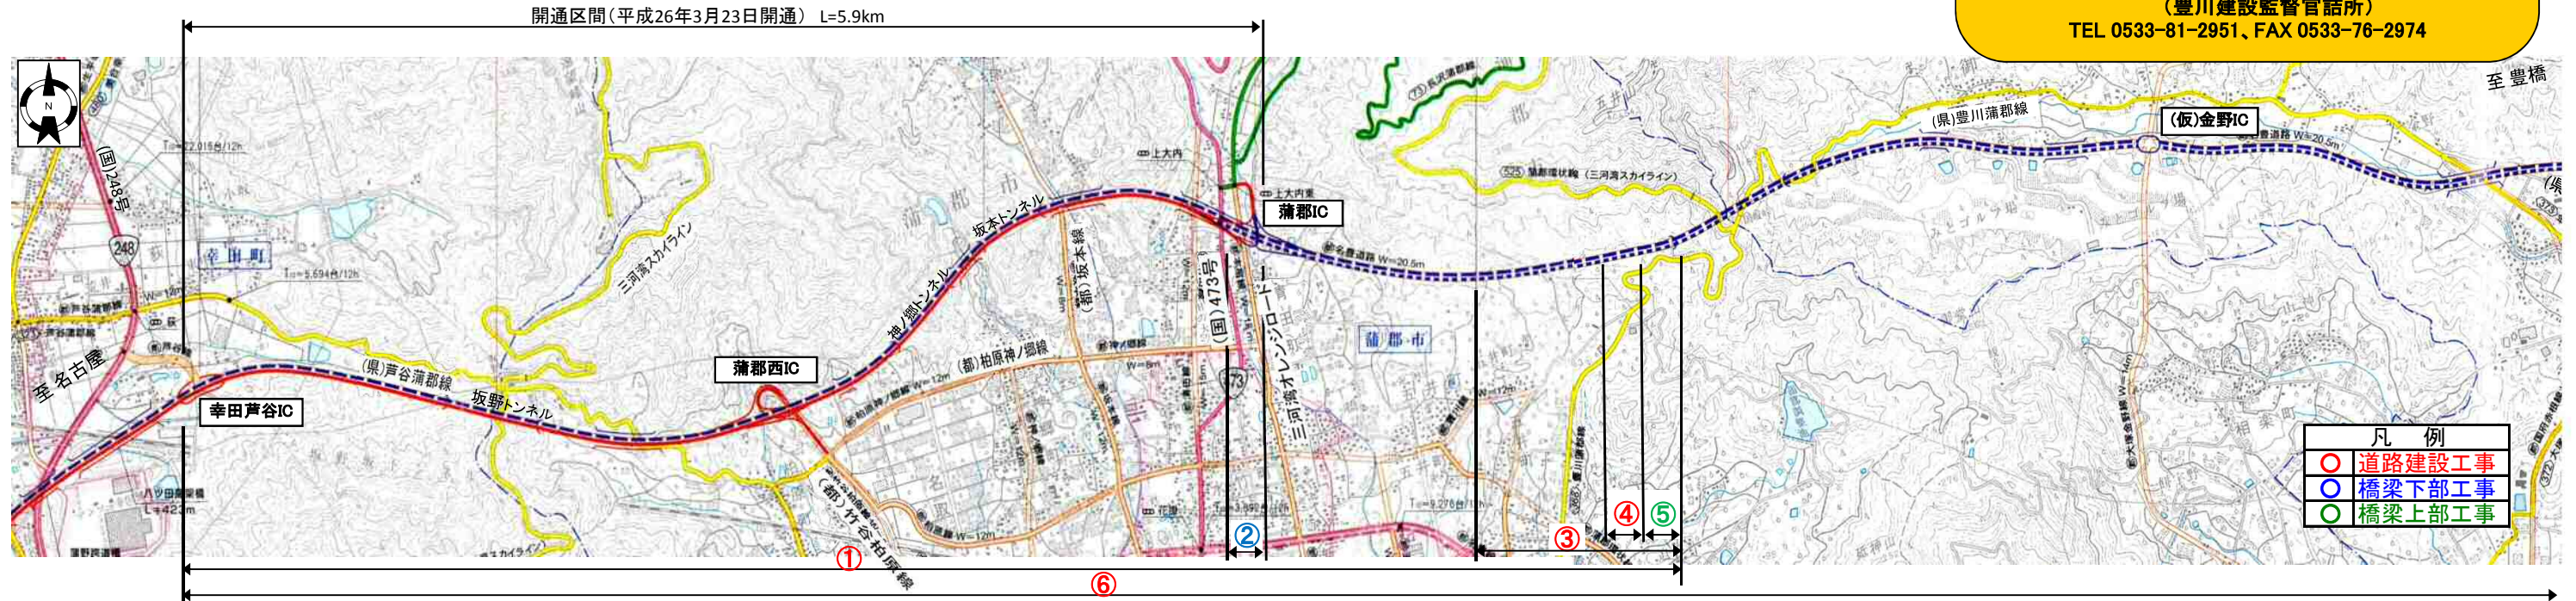

①	②	③	④	⑤	⑥
<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 <b>工期</b> 平成26年3月18日～平成27年1月30日 <b>施工業者</b> 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591 <b>8月末時点進捗率</b> 35% <b>9月作業内容</b> 調整池 <b>工事概要</b> 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります  名古屋より豊橋側を望む(7号橋)	<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 <b>工期</b> 平成26年3月25日～平成27年3月16日 <b>施工業者</b> 山旺建設(株) TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093 <b>8月末時点進捗率</b> 45% <b>9月作業内容</b> 掘削・山留設置・杭頭処理 <b>工事概要</b> 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります  名古屋より豊橋側を望む	<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 <b>工期</b> 平成26年3月21日～平成27年1月30日 <b>施工業者</b> 綱ヒメノ TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107 <b>8月末時点進捗率</b> 24% <b>9月作業内容</b> 掘削・土砂運搬、工事用道路農水管、排水構造物 <b>工事概要</b> 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります  名古屋より豊橋側を望む	<b>工事名</b> 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 <b>工期</b> 平成26年5月2日～平成27年2月27日 <b>施工業者</b> 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520 <b>8月末時点進捗率</b> 20% <b>9月作業内容</b> 伐採・掘削・土砂運搬 <b>工事概要</b> 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します  豊橋側より名古屋側を望む	<b>工事名</b> 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 <b>工期</b> 平成26年3月18日～平成27年1月30日 <b>施工業者</b> 極東興和(株) TEL 0533-66-6282, FAX 0533-66-6283 <b>8月末時点進捗率</b> 63% <b>9月作業内容</b> 足場組立、横組 <b>工事概要</b> 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設します  豊橋側より名古屋側を望む	<b>工事名</b> 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事 <b>工期</b> 平成26年6月19日～平成27年2月27日 <b>施工業者</b> サンエイ(株) TEL 0566-21-4301, FAX 0566-21-4399 <b>8月末時点進捗率</b> 2% <b>9月作業内容</b> 清田地区除草 <b>工事概要</b> 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します  名古屋側より豊橋側を望む

## 現場スタッフ



現場代理人 監理技術者 現場担当者

## 編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しましては、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は、蒲郡市五井町にてバイパス本線部のコンクリート製の橋をつくる工事で7月中旬より現地での工事に着手し、8月に工場で製作したコンクリートの橋桁全ての架設を終え、これから床版（舗装を載せるコンクリートの床版）と壁高欄（橋の両側のコンクリートの壁）の施工を行って参ります。

今後、材料の搬入により県道豊川蒲郡線への工事関係車両の出入りが多くなります。工事中は何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 極東興和(株) 現場代理人 岡澤 将倫

