

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。



蒲郡バイパス 工事便り




発行 第27号
平成26年8月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長: 鈴木工業(株) 鈴木 忠臣
TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km

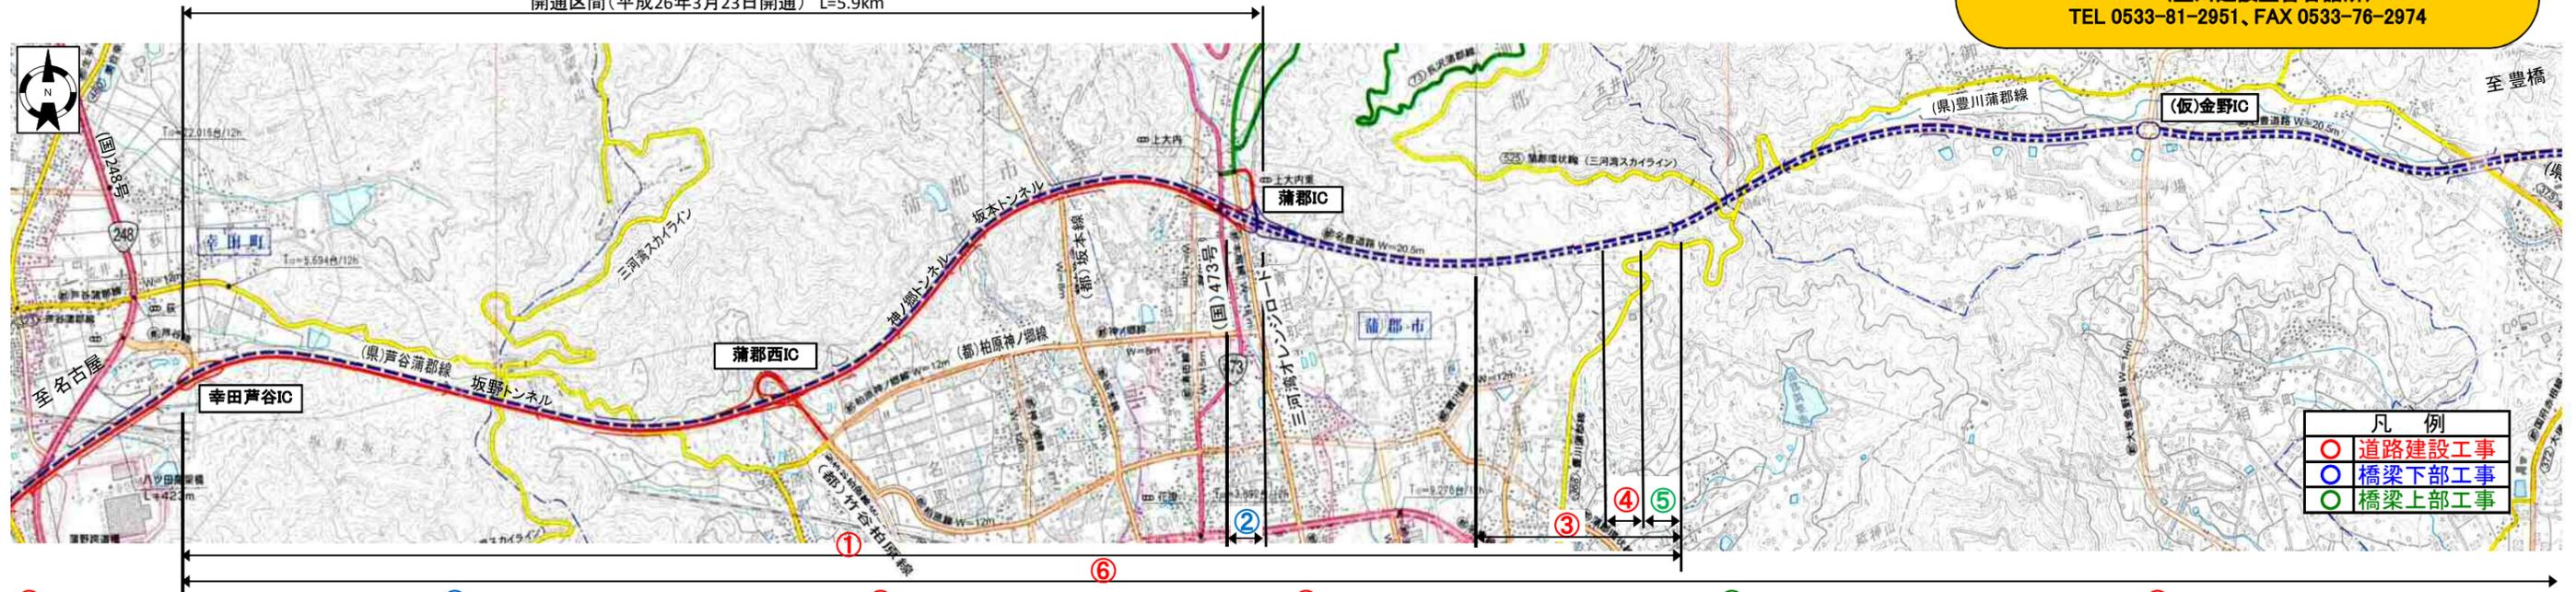

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 | 工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 | 工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 | 工事名 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 | 工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 | 工事名 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事 |
| 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 | 工期 平成26年3月25日～平成27年3月16日 | 工期 平成26年3月21日～平成27年1月30日 | 工期 平成26年5月2日～平成27年2月27日 | 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 | 工期 平成26年6月19日～平成27年2月27日 |
| 施工業者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591 | 施工業者 山旺建設(株) TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093 | 施工業者 綱ヒメノ TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107 | 施工業者 鈴木工業(株) TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520 | 施工業者 極東興和(株) TEL 0533-66-6282, FAX 0533-66-6283 | 施工業者 サンエイ(株) TEL 0566-21-4301, FAX 0566-21-4399 |
| 7月末時点進捗率 18% | 7月末時点進捗率 32% | 7月末時点進捗率 14% | 7月末時点進捗率 9% | 7月末時点進捗率 42% | 7月末時点進捗率 0% |
| 8月作業内容 清田地区工用道路撤去 | 8月作業内容 矢板圧入、橋脚躯体鉄筋・型枠・コンクリート | 8月作業内容 掘削・土砂運搬、工用道路農水管理、排水構造物 | 8月作業内容 伐採、掘削・土砂運搬 | 8月作業内容 桁架設 | 8月作業内容 工事準備 |
| 工事概要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります | 工事概要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります | 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工用道路をつくります | 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します | 工事概要 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設します | 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します |
|  |  |  |  |  |  |
| 名古屋より豊橋側を望む(7号橋) | 名古屋より豊橋側を望む | 豊橋側より名古屋側を望む(工用道路) | 豊橋側より名古屋側を望む | 豊橋側より名古屋側を望む | 名古屋側より豊橋側を望む |

工期を延期しました

現場スタッフ



現場担当者 現場担当者 現場代理人 監理技術者

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しましては、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
私どもの工事は、蒲郡市五井町にて、バイパス本線部の山の掘削、盛土及び排水路をつくる工事で、6月中旬より立木の伐採を始め、7月下旬から山の掘削を行っており、約50,000m³の土砂の搬出を平成27年2月まで行って参ります。
今後、県道豊川蒲郡線への工事関係車両の出入りが多くなります。工事中は何かとご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、安全には注意を払いながら工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 鈴木工業(株) 現場代理人 鈴木 忠臣
