

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。



蒲郡バイパス 工事便り




発行 第29号
平成26年10月1日





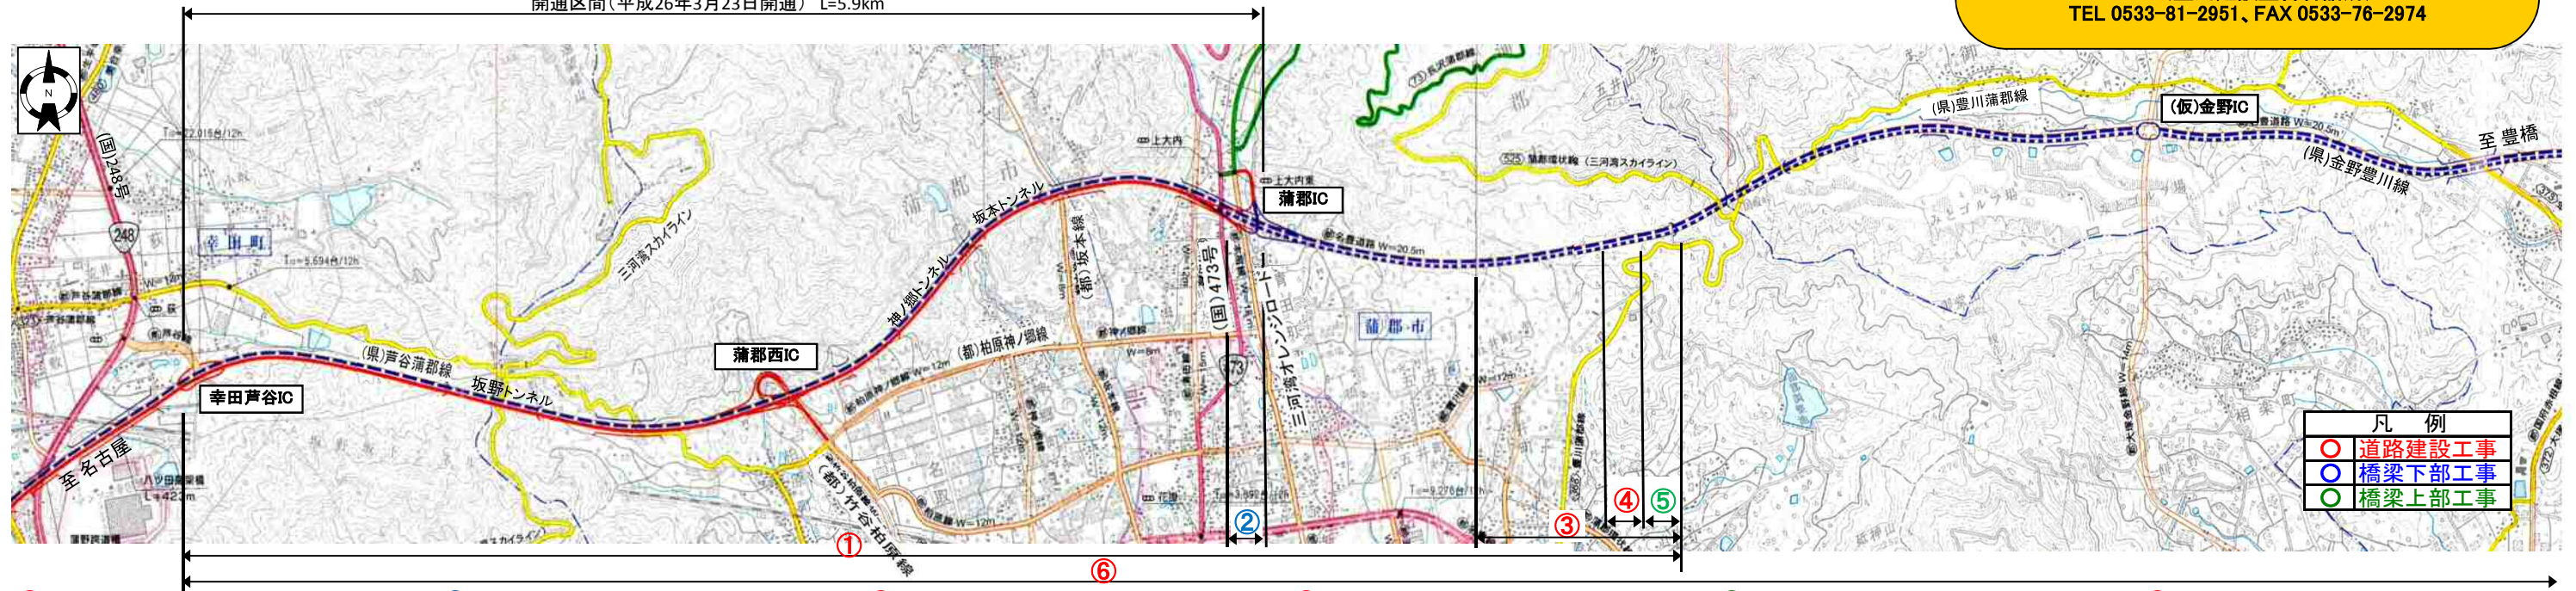

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長:サンエイ(株) 伊藤 公也
TEL 0533-67-3340, FAX 0533-67-3341

監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



○	道路建設工事
○	橋梁下部工事
○	橋梁上部工事

①	②	③	④	⑤	⑥
工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 長坂建設興業 株式会社 TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591 9月末時点進捗率 40% 10月作業内容 清田地区排水構造物 工事概要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります  名古屋より豊橋側を望む(7号橋)	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 工期 平成26年3月25日～平成27年3月16日 施工業者 山旺建設 株式会社 TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093 9月末時点進捗率 57% 10月作業内容 橋脚躯体(鉄筋・型枠・足場・コンクリート) 工事概要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります  名古屋より豊橋側を望む	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月21日～平成27年1月30日 施工業者 綱ヒメノ 株式会社 TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107 9月末時点進捗率 44% 10月作業内容 掘削・土砂運搬、函渠、工事用道路舗装 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります  名古屋より豊橋側を望む	工事名 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 工期 平成26年5月2日～平成27年2月27日 施工業者 鈴中工業 株式会社 TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520 9月末時点進捗率 29% 10月作業内容 掘削・土砂運搬、排水構造物 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します  豊橋側より名古屋側を望む	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 極東興和 株式会社 TEL 0533-66-6282, FAX 0533-66-6283 9月末時点進捗率 68% 10月作業内容 床版(鉄筋・型枠・コンクリート) 工事概要 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設します  豊橋側より名古屋側を望む	工事名 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事 工期 平成26年6月19日～平成27年2月27日 施工業者 サンエイ(株) TEL 0533-67-3340, FAX 0533-67-3341 9月末時点進捗率 3% 10月作業内容 測量、農水管試掘、伐採 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します  名古屋側より豊橋側を望む

現場スタッフ



現場代理人 監理技術者 現場担当者

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しましては、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
 私どもの工事は、五井町山田にてバイパス本線の掘削と側道をつくる工事を行います。10月下旬より伐採を開始し、側道をつくりながらバイパス本線の掘削作業を行ってまいります。
 今後、大型ダンプトラックなどの工事車両の出入りが多くなります。地元の皆様をはじめ、通行する皆様には大変ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 工事に関しまして、ご不明な点などございましたらお気軽にお声をお掛けください。
