

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。




蒲郡バイパス 工事便り







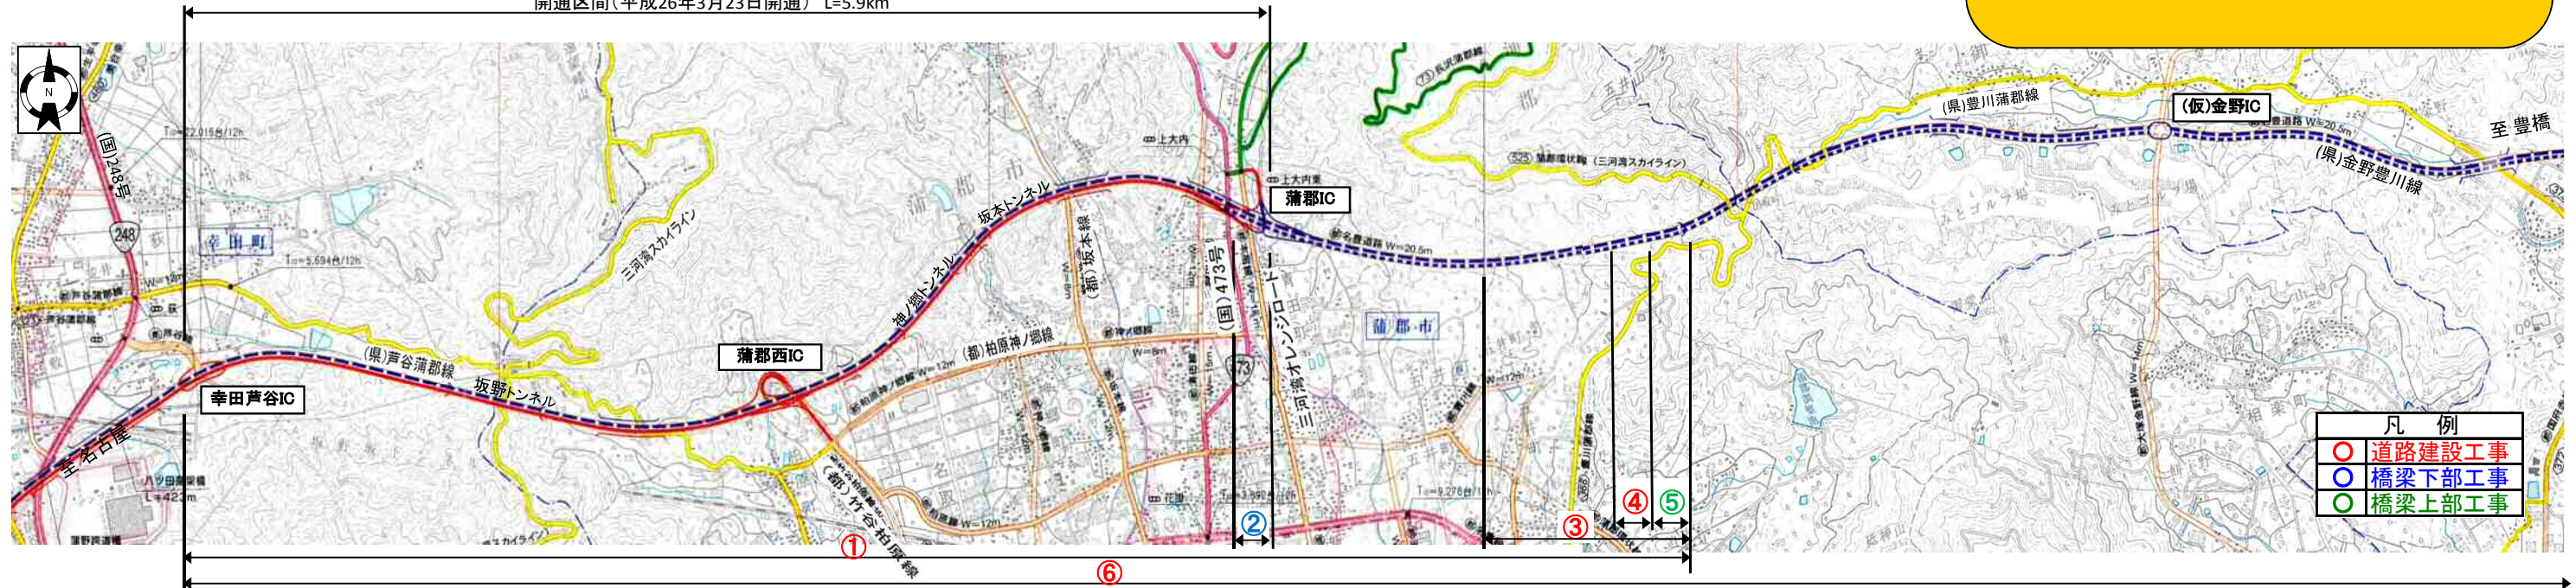

発行 第31号
平成26年12月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長:山旺建設(株) 石川 公孝
TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093
監修:名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



①	②	③	④	⑤	⑥
工事名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 長坂建設興業 株式会社 TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591 11月末時点進捗率 65% 12月作業内容 清田地区排水構造物 工事概要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります  名古屋より豊橋側を望む(7号橋)	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 工期 平成26年3月25日～平成27年3月16日 施工業者 山旺建設 株式会社 TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093 11月末時点進捗率 58% 12月作業内容 橋脚埋戻し、矢板引抜き 工事概要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります  名古屋より豊橋側を望む	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 工期 平成26年3月21日～平成27年1月30日 施工業者 株式会社ヒメノ TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107 11月末時点進捗率 83% 12月作業内容 排水構造物、函渠、法面吹付 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります  名古屋より豊橋側を望む	工事名 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事 工期 平成26年5月2日～平成27年2月27日 施工業者 鈴木工業 株式会社 TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520 11月末時点進捗率 56% 12月作業内容 函渠、法面吹付 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します  豊橋側より名古屋側を望む	工事名 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 工期 平成26年3月18日～平成27年1月30日 施工業者 極東興和 株式会社 TEL 0533-66-6282, FAX 0533-66-6283 11月末時点進捗率 91% 12月作業内容 壁高欄、橋梁付属物 工事概要 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設します  豊橋側より名古屋側を望む	工事名 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事 工期 平成26年6月19日～平成27年2月27日 施工業者 サンエイ 株式会社 TEL 0533-67-3340, FAX 0533-67-3341 11月末時点進捗率 8% 12月作業内容 伐採、掘削、排水構造物 工事概要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します  名古屋側より豊橋側を望む



現場担当者 現場代理人 監理技術者 現場担当者

編集長からひと言

蒲郡みかんの出荷も始まり、秋も深まりゆくこの頃です。
 平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
 私どもの工事は蒲郡市清田町にて蒲郡インターチェンジの橋脚をつくる工事で、今年4月から工事に着手し、9月までにオレンジロード側の2基が完成し、現在国道473号線側の2基を建設中です。地域住民の皆様のご協力をいただき、工事の方も順調に進んでおります。
 工事完成まで残り4か月ほどになりましたが、安全第一で工事を進めて参ります。引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事 山旺建設(株) 現場代理人 石川 公孝
