

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。




# 蒲郡バイパス 工事便り



発行 第32号  
平成27年1月1日

蒲郡バイパス支部工事等安全協議会  
編集長:(株)ヒメノ 森野 隆二  
TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107  
監修:名四国道事務所豊川分室  
(豊川建設監督官詰所)  
TEL 0533-81-2951, FAX 0533-76-2974

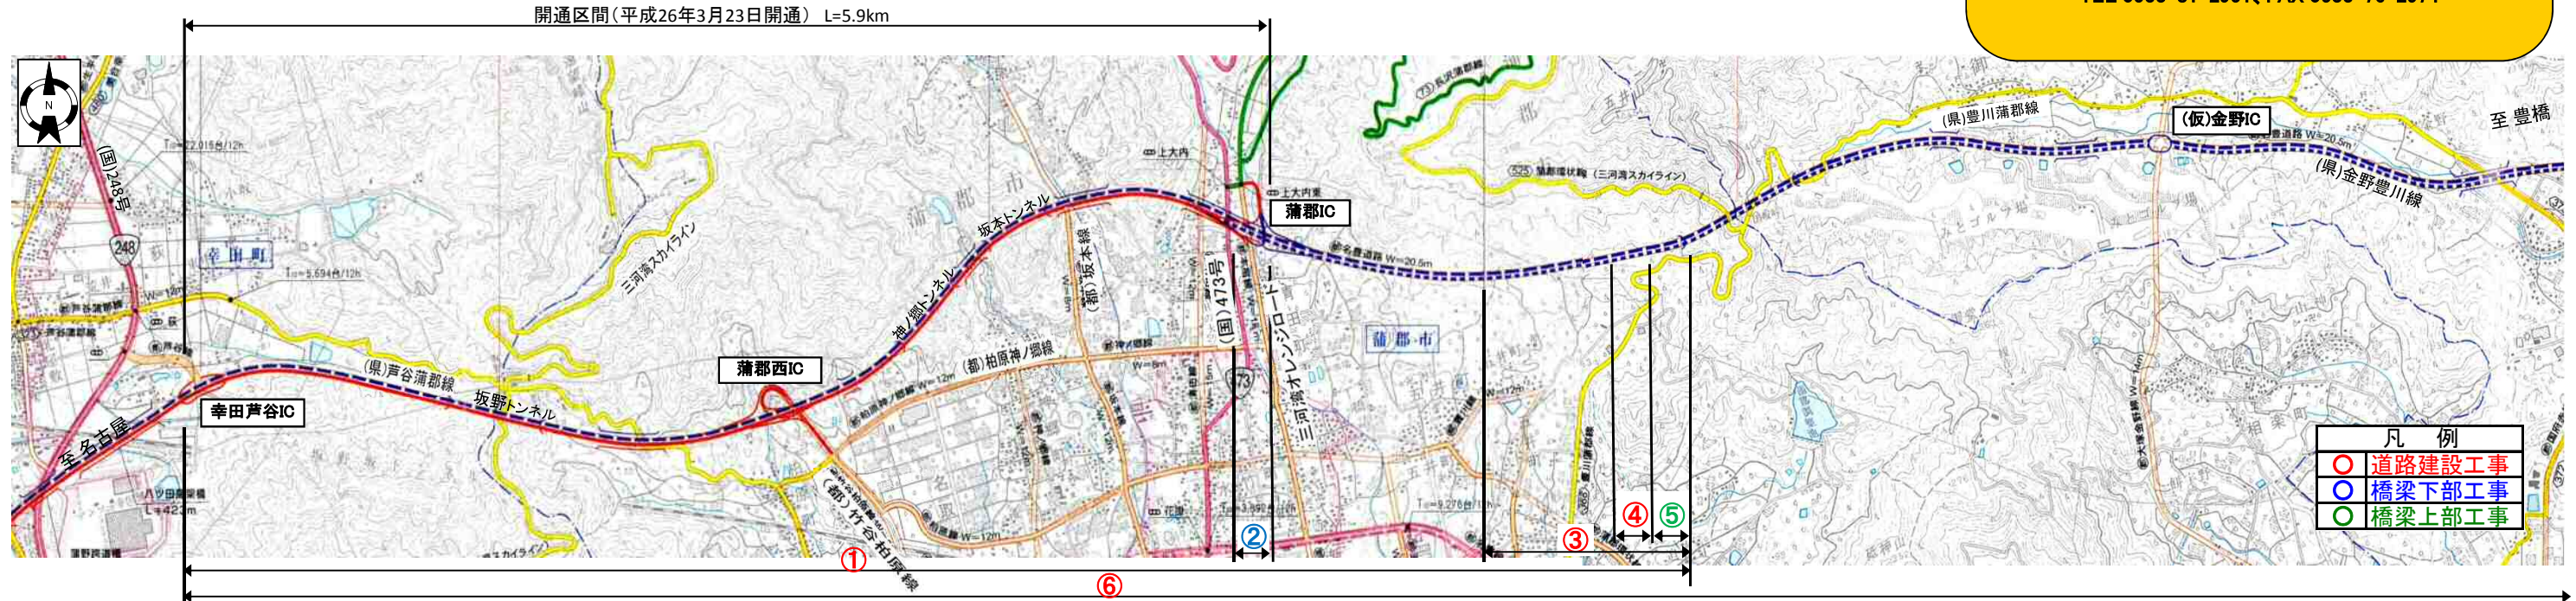

①	②	③	④	⑤	⑥
工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事
工 期 平成26年3月18日～平成27年3月27日	工 期 平成26年3月25日～平成27年3月25日	工 期 平成26年3月21日～平成27年1月30日	工 期 平成26年5月2日～平成27年3月25日	工 期 平成26年3月18日～平成27年1月30日	工 期 平成26年6月19日～平成27年3月27日
施 工 業 者 長坂建設興業 株式会社 TEL 0533-65-8590, FAX 0533-65-8591	施 工 業 者 山旺建設 株式会社 TEL 0533-56-9092, FAX 0533-56-9093	施 工 業 者 株式会社ヒメノ TEL 0533-69-6106, FAX 0533-69-6107	施 工 業 者 鈴中工業 株式会社 TEL 0533-69-3663, FAX 0533-65-9520	施 工 業 者 極東興和 株式会社 TEL 0533-66-6282, FAX 0533-66-6283	施 工 業 者 サンエイ 株式会社 TEL 0533-67-3340, FAX 0533-67-3341
12月末時点 進捗率 70%	12月末時点 進捗率 68%	12月末時点 進捗率 92%	12月末時点 進捗率 69%	12月末時点 進捗率 95%	12月末時点 進捗率 23%
1月作業内容 清田地区排水構造物、縁石、舗装	1月作業内容 橋脚コンクリート、埋戻し、鋼矢板引抜	1月作業内容 函渠、法面吹付	1月作業内容 函渠、法面吹付	1月作業内容 橋梁付属物	1月作業内容 掘削、排水構造物、農水管付替
工 事 概 要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります	工 事 概 要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります	工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります	工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します	工 事 概 要 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設します	工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します
豊橋側より名古屋側を望む(7号橋)	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

工期を延期しました。

工期を延期しました。

工期を延期しました。

工期を延期しました。

## 編集長からひと言



現場担当者 現場代理人 監理技術者 現場担当者

新年あけまして、おめでとうございます

昨年中は、国道23号蒲郡バイパス工事に対しまして、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。

私どもの工事は蒲郡市五井町にて、工事用道路となる市道の整備及び、バイパス本線部の掘削・土砂運搬、横断函渠などの工事を行っております。昨年5月頃から施工しておりました工事用道路の整備はほぼ完了し、本線部の法面保護や横断函渠などを残すのみとなりました。

工事完成まで残りわずかですが、最後まで気を引き締め、安全第一で工事を進めて参りますので、本年も昨年に引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事 (株)ヒメノ 現場代理人 森野 隆二
