

沿線地域の皆さま方へ 国道23号蒲郡バイパスの工事状況をお知らせします。



蒲郡バイパス 工事便り

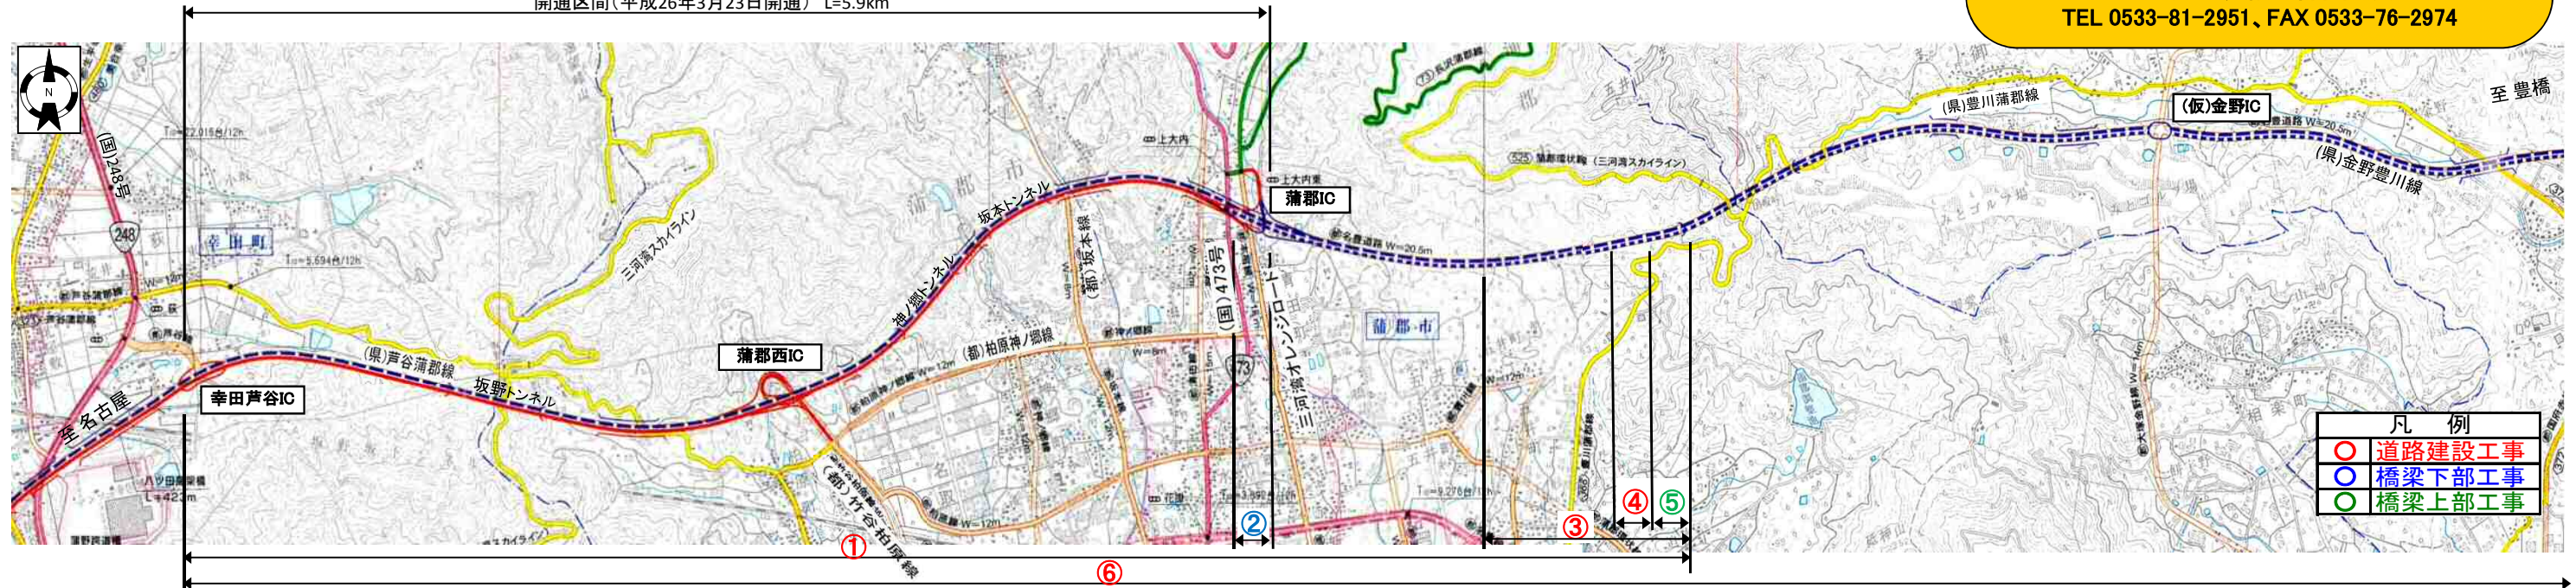








発行 第33号
平成27年2月1日

蒲郡バイパス支部工事安全協議会
編集長: 極東興和(株) 岡澤 将倫

監修: 名四国道事務所豊川分室
(豊川建設監督官詰所)
TEL 0533-81-2951、FAX 0533-76-2974

開通区間(平成26年3月23日開通) L=5.9km



①	②	③	④	⑤	⑥
工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP清田五井地区道路建設工事	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP蒲郡IC地区下部工事	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP五井地区道路建設工事	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP五井地区西道路建設工事	工 事 名 平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事	工 事 名 平成26年度 23号蒲郡BP整備工事
工 期 平成26年3月18日～平成27年3月27日	工 期 平成26年3月25日～平成27年3月25日	工 期 平成26年3月21日～平成27年2月27日	工 期 平成26年5月2日～平成27年3月25日	工 期 平成26年3月18日～平成27年1月30日	工 期 平成26年6月19日～平成27年3月27日
施 工 業 者 長坂建設興業(株) TEL 0533-65-8590、FAX 0533-65-8591	施 工 業 者 山旺建設(株) TEL 0533-56-9092、FAX 0533-56-9093	施 工 業 者 ㈱ヒメノ TEL 0533-69-6106、FAX 0533-69-6107	施 工 業 者 鈴中工業(株) TEL 0533-69-3663、FAX 0533-65-9520	施 工 業 者 極東興和(株)	施 工 業 者 サンエイ(株) TEL 0533-67-3340、FAX 0533-67-3341
1月末時点 進捗率 80%	1月末時点 進捗率 78%	1月末時点 進捗率 98%	1月末時点 進捗率 76%	1月末時点 進捗率 100%	1月末時点 進捗率 35%
2月作業内容 清田地区排水構造物、舗装、防護柵	2月作業内容 橋脚コンクリート	2月作業内容 法面吹付	2月作業内容 掘削、排水構造物、函渠	2月作業内容 -	2月作業内容 掘削、排水構造物、舗装
工 事 概 要 蒲郡市清田町(蒲郡IC付近)と坂本町で側道をつくります	工 事 概 要 蒲郡市清田町の蒲郡ICで、橋脚3基をつくります	工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるための山の掘削と工事用道路をつくります	工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します	工 事 概 要 蒲郡市五井町でコンクリートの橋桁を架設しました	工 事 概 要 蒲郡市五井町でバイパス本線をつくるために山を掘削します
					
豊橋側より名古屋側を望む(7号橋)	名古屋側より豊橋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	豊橋側より名古屋側を望む	名古屋側より豊橋側を望む

工期を延期しました。

完成しました！

編集長からひと言

平素は、国道23号蒲郡バイパス工事に関しましては、地域の皆様のご理解ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
私どもの工事は、蒲郡市五井町にてバイパス本線部のコンクリート製の橋をつくる工事で、7月中旬より現地での工事に着手し、コンクリートの橋桁の架設、床版（舗装を載せるコンクリートの板）、壁高欄（橋の両側のコンクリートの壁）の順に安全第一で施工を進め、このほど無事に工事が完了しました。これもひとえに皆様のご協力のお陰と心より感謝いたしております。
また、工事期間中は皆様にご不便とご迷惑をおかけしましたことを改めましてお詫び申し上げます。
今後も、蒲郡バイパスの工事が続きますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



名古屋側より豊橋側を望む

平成25年度 23号蒲郡BP五井高架橋PC上部工事 極東興和(株) 現場代理人 岡澤 将倫
